

# 【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

## 策定の趣旨

◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、県民生活に身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠です。

また、本格復興の着実な推進を、目に見える形で広く情報発信する必要があります。

このため、県では、県民生活に身近な社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通しについて情報提供を行うものです。

なお、記載している工程等は、様々な要因により変更となる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新していきます。

## ロードマップの構成

### ◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

### ◆ 総括と市町村別の2種類で構成

- 1 総括表
  - ① 復旧・復興事業の動き
  - ② 分野別の着工・完成箇所割合
  - ③ 事業計画掲載箇所一覧
  - ④ 復旧・復興ロードマップの見方
- 2 市町村別工程表
  - ① 各事業箇所の位置図
  - ② 年度別の整備スケジュール

## ロードマップの更新

### ◆ 更新頻度

平成28年度からは9月30日と3月31日を基準日に定め、最新のデータに更新しています。

### ◆ 工程上の主要課題

- ① 施工条件の変化への対応
- ② 工事区間の一部における用地取得または補償物件への対応
- ③ 工事区間内における他事業又は関係者との調整

公表している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

### ◆ 情報発信

社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに公表したものと併せ、県のホームページに掲載しています。

(<http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html>)

### ◆ 前回からの変更点


- ・P.2の「（参考）市町村別工程表の見方」に「完成の考え方」を記載しました。
- ・市町村別工程表の「年度別整備スケジュール」に「H31」と「H32」の欄を設けました。

## 復旧・復興事業の動き

◆ 前回の公表時点（基準日：平成29年3月31日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を**工事の『着工』と『完成』**に着目し整理しています。


全箇所数：775箇所

### ◆ 着工箇所数

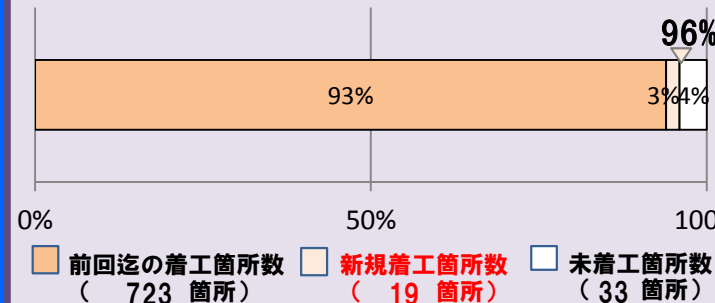

※ 着工：3%増加し、全箇所の96%


### ◆ 完成箇所数

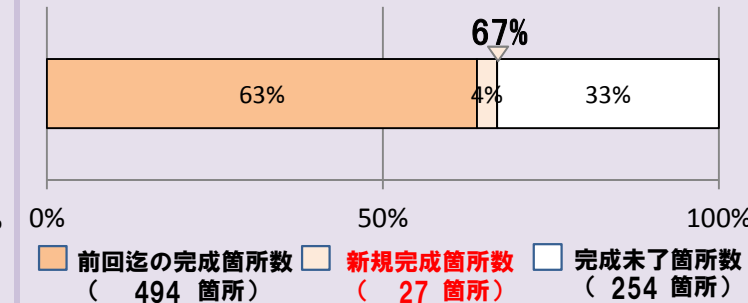

※ 完成：4%増加し、全箇所の67%

## 分野別の着工・完成箇所割合

◆ 社会資本の主要8分野における**分野別の『工事中箇所』と『完成箇所』及び『未着工箇所』の割合**を整理しています。

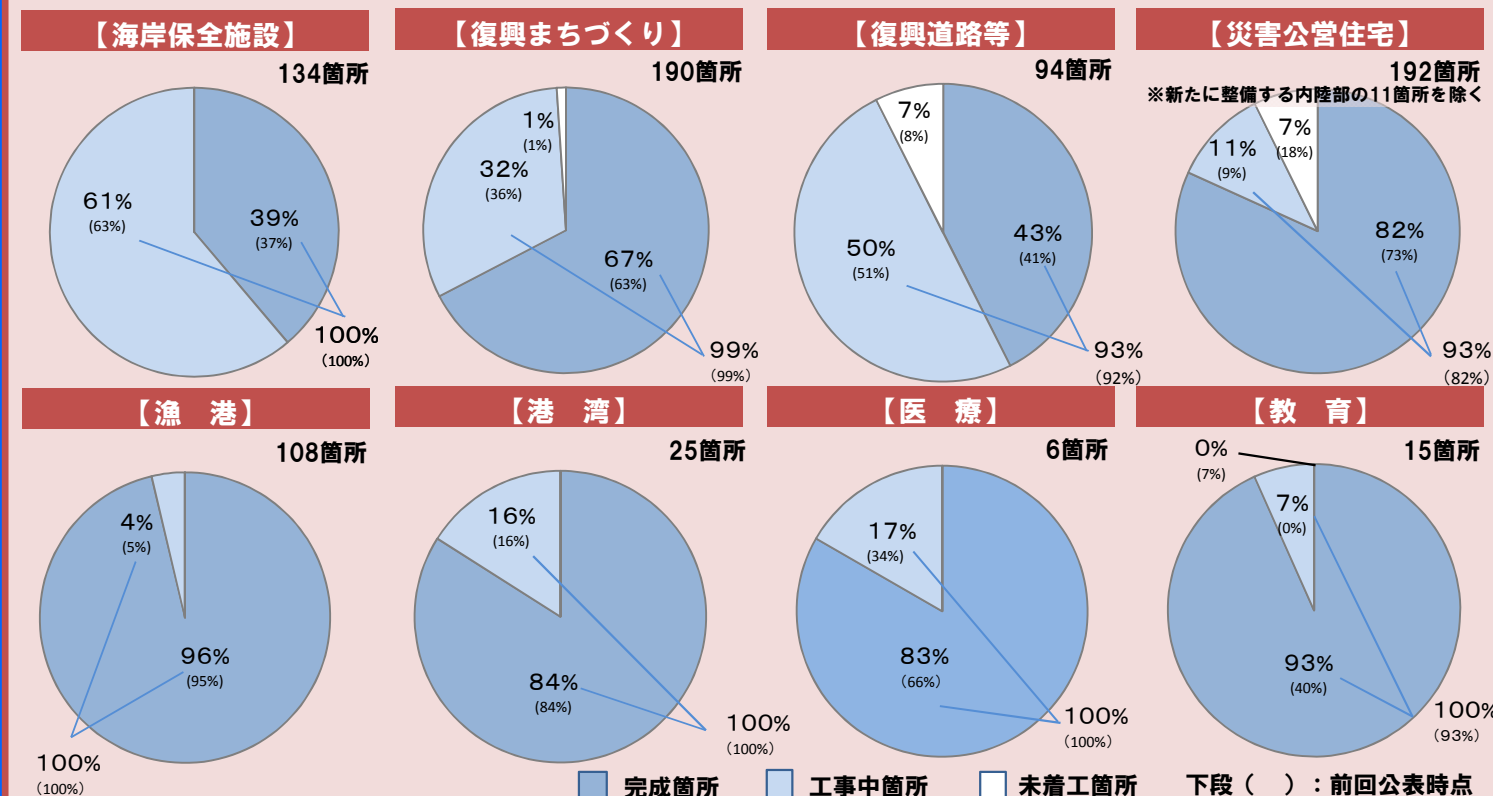

【お問い合わせ先】岩手県復興局まちづくり再生課（019-629-6935）

【東日本大震災津波】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

社会資本の復旧・復興ロードマップ

住宅再建のトピックス

宅地供給計画区画数7,476区画（7,809区画から333区画の減少）

災害公営住宅計画戸数5,872戸（5,964戸から92戸の減少）

市町村別事業計画掲載箇所一覧（全775箇所）

赤字は前回からの変更箇所

| 市町村名       | 事業<br>主体 | 海岸保全施設       |              |      |        | 復興まちづくり |       |        |       |        |     |            |      |       |               | 復興道路等                            |        |        |        |        |        | 災害公営住宅 |       | 漁 港 | 港 湾  | 医 療 | 教 育 |
|------------|----------|--------------|--------------|------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-----|------------|------|-------|---------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|
|            |          | 一般海岸<br>港湾海岸 | 農地海岸<br>林野海岸 | 漁港海岸 | 計      | 土地区画整理  |       | 防災集団移転 |       | 漁業集落防災 |     | 津波復興<br>拠点 | 面整備計 |       | まちづくり<br>連携道路 | 復興道路                             |        | 復興支援道路 |        | 復興関連道路 |        |        |       |     |      |     |     |
|            |          | 河川・海岸数       | 海岸数          | 海岸数  | 河川・海岸数 | 地区数     | 区画数   | 団地数    | 区画数   | 地区数    | 区画数 | 地区数        | 地区数  | 区画数   | 箇所数           | 路線数                              | 区間・箇所数 | 路線数    | 区間・箇所数 | 路線数    | 区間・箇所数 | 箇所数    | 戸数    | 漁港数 | 地区数  | 箇所数 | 箇所数 |
| 洋野町        | 県        | 6            | -            | 1    | 7      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 1             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | -      | -      | 2      | 2      | -      | -     | 1   | 2    | -   | -   |
|            | 町        | -            | -            | -    | -      | -       | -     | -      | -     | 1      | 14  | -          | 1    | 14    | -             |                                  | (国)1   | -      | -      | -      | -      | 1      | 4     | 8   | -    | -   | -   |
|            | 計        | 6            | -            | 1    | 7      | -       | -     | -      | -     | 1      | 14  | -          | 1    | 14    | 1             |                                  | 1      | -      | -      | 2      | 2      | 1      | 4     | 9   | 2    | -   | -   |
| 久慈市        | 県        | 5            | -            | 1    | 6      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | -             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | 1      | 1      | 2      | 2      | -      | -     | 1   | 4    | -   | -   |
|            | 市        | -            | -            | 2    | 2      | -       | -     | -      | -     | 4      | 15  | -          | 4    | 15    | -             |                                  | (国)2   | -      | -      | -      | -      | 3      | 11    | 9   | (国)1 | -   | -   |
|            | 計        | 5            | -            | 3    | 8      | -       | -     | -      | -     | 4      | 15  | -          | 4    | 15    | -             |                                  | 2      | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 11    | 10  | 5    | -   | -   |
| 野田村        | 県        | 6            | 2            | -    | 8      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 2             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | -      | -      | 1      | 2      | 2      | 26    | 1   | -    | -   | -   |
|            | 村        | -            | -            | -    | -      | 1       | 124   | 2      | 38    | 2      | 15  | -          | 5    | 177   | -             |                                  | (国)1   | -      | -      | -      | -      | 4      | 74    | 2   | -    | -   | -   |
|            | 計        | 6            | 2            | -    | 8      | 1       | 124   | 2      | 38    | 2      | 15  | -          | 5    | 177   | 2             |                                  | 1      | -      | -      | 1      | 2      | 6      | 100   | 3   | -    | -   | -   |
| 普代村        | 県        | 4            | -            | -    | 4      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | -             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | -      | -      | 1      | 1      | -      | -     | 2   | -    | -   | -   |
|            | 村        | -            | -            | -    | -      | -       | -     | -      | -     | 1      | -   | -          | 1    | -     | -             |                                  | (国)3   | -      | -      | -      | -      | -      | 3     | -   | -    | -   | -   |
|            | 計        | 4            | -            | -    | 4      | -       | -     | -      | -     | 1      | -   | -          | 1    | -     | -             |                                  | 3      | -      | -      | 1      | 1      | -      | -     | 5   | -    | -   | -   |
| 田野畑村       | 県        | 2            | -            | 1    | 3      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 3             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | -      | -      | 1      | 3      | -      | -     | 1   | -    | -   | -   |
|            | 村        | -            | -            | 1    | 1      | -       | -     | -      | -     | 2      | 61  | -          | 2    | 61    | -             |                                  | (国)3   | -      | -      | -      | -      | 5      | 63    | 3   | -    | -   | -   |
|            | 計        | 2            | -            | 2    | 4      | -       | -     | -      | -     | 2      | 61  | -          | 2    | 61    | 3             |                                  | 3      | -      | -      | 1      | 3      | 5      | 63    | 4   | -    | -   | -   |
| 岩泉町        | 県        | 2            | -            | 1    | 3      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | -             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | 2      | 3      | -      | -      | -      | -     | 1   | 1    | -   | -   |
|            | 町        | -            | -            | 1    | 1      | -       | -     | -      | -     | 1      | 59  | -          | 1    | 59    | -             |                                  | (国)1   | -      | -      | -      | -      | 2      | 51    | 1   | -    | 1   | 2   |
|            | 計        | 2            | -            | 2    | 4      | -       | -     | -      | -     | 1      | 59  | -          | 1    | 59    | -             |                                  | 1      | 2      | 3      | -      | -      | 2      | 51    | 2   | 1    | 1   | 2   |
| 宮古市        | 県        | 13           | 2            | 1    | 16     | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 7             | 三陸沿岸道<br>路、宮古盛<br>岡横断道路          | 1      | 1      | 3      | 3      | 3      | 12     | 349   | 3   | 7    | -   | -   |
|            | 市        | -            | -            | 3    | 3      | 2       | 410   | 5      | 263   | 9      | 32  | 2          | 18   | 705   | -             |                                  | (国)7   | -      | -      | -      | -      | 16     | 417   | 15  | (国)1 | 1   | -   |
|            | 計        | 13           | 2            | 4    | 19     | 2       | 410   | 5      | 263   | 9      | 32  | 2          | 18   | 705   | 7             |                                  | 8      | 1      | 3      | 3      | 3      | 28     | 766   | 18  | 8    | 1   | -   |
| 山田町        | 県        | 4            | 3            | 4    | 11     | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 1             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | 1      | 1      | -      | -      | 8      | 297   | 4   | -    | 1   | -   |
|            | 町        | -            | -            | 1    | 1      | 5       | 659   | 4      | 389   | 2      | 144 | 1          | 12   | 1,192 | -             |                                  | (国)2   | -      | -      | -      | -      | 10     | 353   | 2   | -    | -   | 1   |
|            | 計        | 4            | 3            | 5    | 12     | 5       | 659   | 4      | 389   | 2      | 144 | 1          | 12   | 1,192 | 1             |                                  | 2      | 1      | 1      | -      | -      | 18     | 650   | 6   | -    | 1   | 1   |
| 大槌町        | 県        | 2            | 1            | 2    | 5      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 1             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | -      | -      | 1      | 1      | 8      | 414   | 2   | -    | 1   | -   |
|            | 町        | -            | -            | -    | -      | 4       | 967   | 17     | 422   | 4      | 12  | 2          | 27   | 1,401 | -             |                                  | (国)1   | -      | -      | -      | -      | 36     | 471   | -   | -    | -   | 2   |
|            | 計        | 2            | 1            | 2    | 5      | 4       | 967   | 17     | 422   | 4      | 12  | 2          | 27   | 1,401 | 1             |                                  | 1      | -      | -      | 1      | 1      | 44     | 885   | 2   | -    | 1   | 2   |
| 釜石市        | 県        | 6            | 3            | 5    | 14     | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 5             | 三陸沿岸道<br>路、東北横<br>断自動車道<br>釜石秋田線 | -      | 1      | 1      | 3      | 3      | 8      | 373   | 6   | 1    | -   | -   |
|            | 市        | -            | -            | 7    | 7      | 4       | 1,057 | 11     | 135   | 14     | 83  | 2          | 31   | 1,275 | -             |                                  | (国)3   | -      | -      | -      | -      | 38     | 943   | 9   | (国)1 | -   | 4   |
|            | 計        | 6            | 3            | 12   | 21     | 4       | 1,057 | 11     | 135   | 14     | 83  | 2          | 31   | 1,275 | 5             |                                  | 3      | 1      | 1      | 3      | 3      | 46     | 1,316 | 15  | 2    | -   | 4   |
| 大船渡市       | 県        | 7            | 3            | 5    | 15     | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 5             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | -      | -      | 2      | 2      | 10     | 511   | 6   | 6    | -   | -   |
|            | 市        | -            | -            | 8    | 8      | 1       | 231   | 23     | 366   | 1      | 30  | 1          | 26   | 627   | -             |                                  | (国)2   | -      | -      | -      | -      | 17     | 290   | 16  | (国)1 | -   | 3   |
|            | 計        | 7            | 3            | 13   | 23     | 1       | 231   | 23     | 366   | 1      | 30  | 1          | 26   | 627   | 5             |                                  | 2      | -      | -      | 2      | 2      | 27     | 801   | 22  | 7    | -   | 3   |
| 陸前高田市      | 県        | 8            | 2            | 3    | 13     | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 7             | 三陸沿岸<br>道路                       | -      | -      | -      | 2      | 2      | 5      | 626   | 3   | -    | 1   | 1   |
|            | 市        | -            | -            | 6    | 6      | 2       | 1,460 | 26     | 490   | -      | -   | 2          | 30   | 1,950 | -             |                                  | (国)2   | -      | -      | -      | -      | 6      | 269   | 9   | -    | 1   | 2   |
|            | 計        | 8            | 2            | 9    | 19     | 2       | 1,460 | 26     | 490   | -      | -   | 2          | 30   | 1,950 | 7             |                                  | 2      | -      | -      | 2      | 2      | 11     | 895   | 12  | -    | 2   | 3   |
| その他<br>市町村 | 県        | -            | -            | -    | -      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | -             | 東北横断自<br>動車道、宮<br>古盛岡横断<br>道路    | 1      | 11     | 29     | -      | -      | 8      | 251   | -   | -    | -   | -   |
|            | 市        | -            | -            | -    | -      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | -             |                                  | (国)5   | -      | -      | -      | -      | 4      | 79    | -   | -    | -   | -   |
|            | 計        | -            | -            | -    | -      | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | -             |                                  | 6      | 11     | 29     | -      | -      | 12     | 330   | -   | -    | -   | -   |
| 全体         | 県        | 65           | 16           | 24   | 105    | -       | -     | -      | -     | -      | -   | -          | -    | -     | 32            | 3路線                              | 2      | 17     | 38     | 18     | 21     | 61     | 2,847 | 31  | 21   | 3   | 1   |
|            | 市町村      | -            | -            | 29   | 29     | 19      | 4,908 | 88     | 2,103 | 41     | 465 | 10         | 158  | 7,476 | -             |                                  | (国)33  | -      | -      | -      | -      | 142    | 3,025 | 77  | (国)4 | 3   | 14  |
|            | 計        | 65           | 16           | 53   | 134    | 19      | 4,908 | 88     | 2,103 | 41     | 465 | 10         | 158  | 7,476 | 32            |                                  | 35     | 17     | 38     | 18     | 21     | 203    | 5,872 | 108 | 25   | 6   | 15  |


【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

分野別 整備スケジュール ※ 全ての箇所を網羅して記載



（参考）市町村別工程表の見方

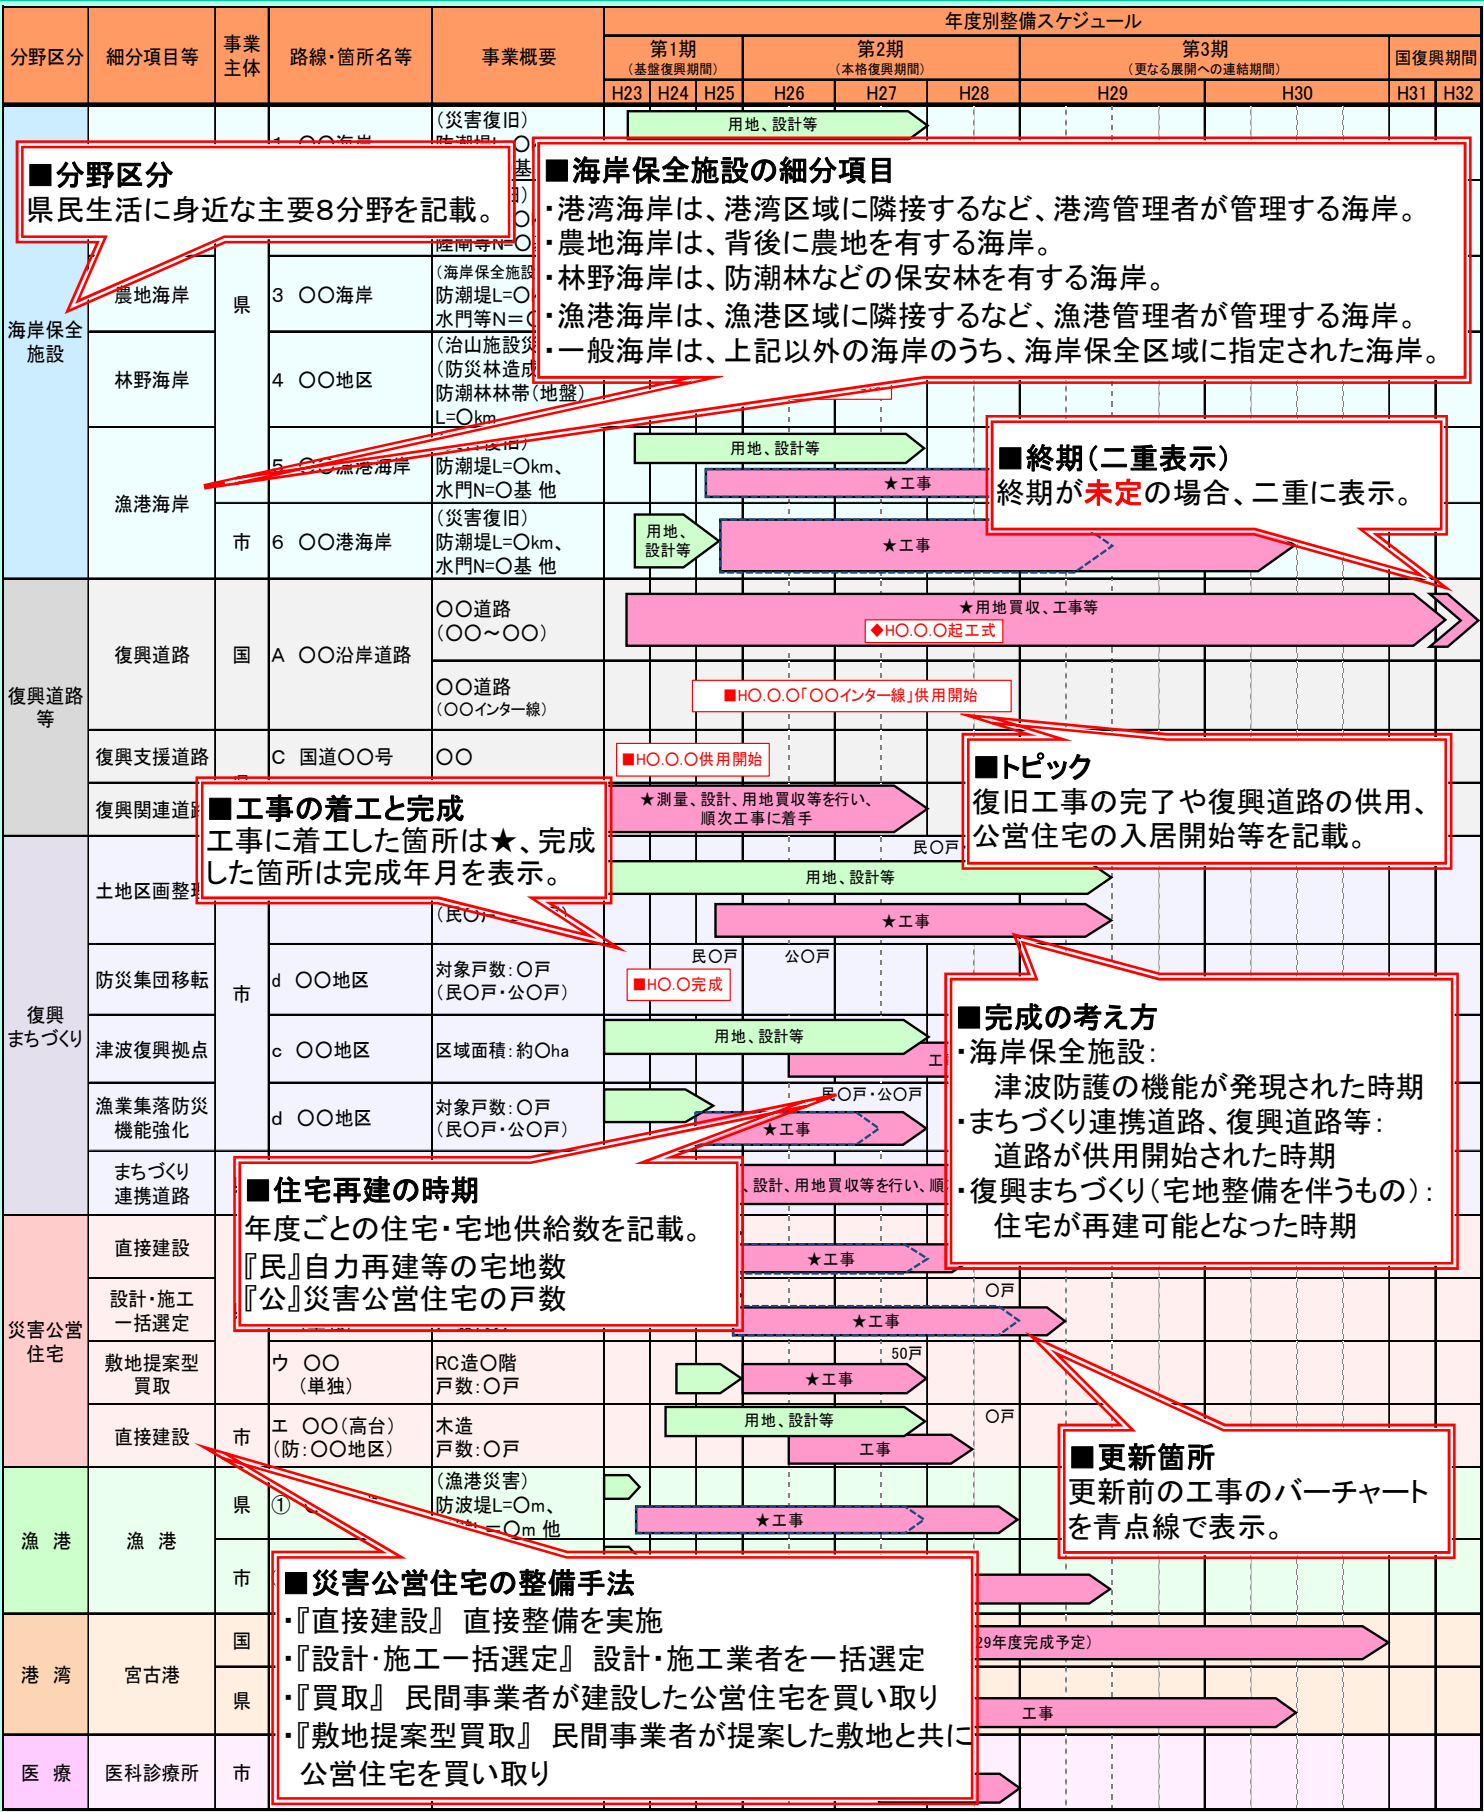




社会資本の復旧・復興ロードマップ【洋野町】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

海と高原の絆、未来へ 確かな復興

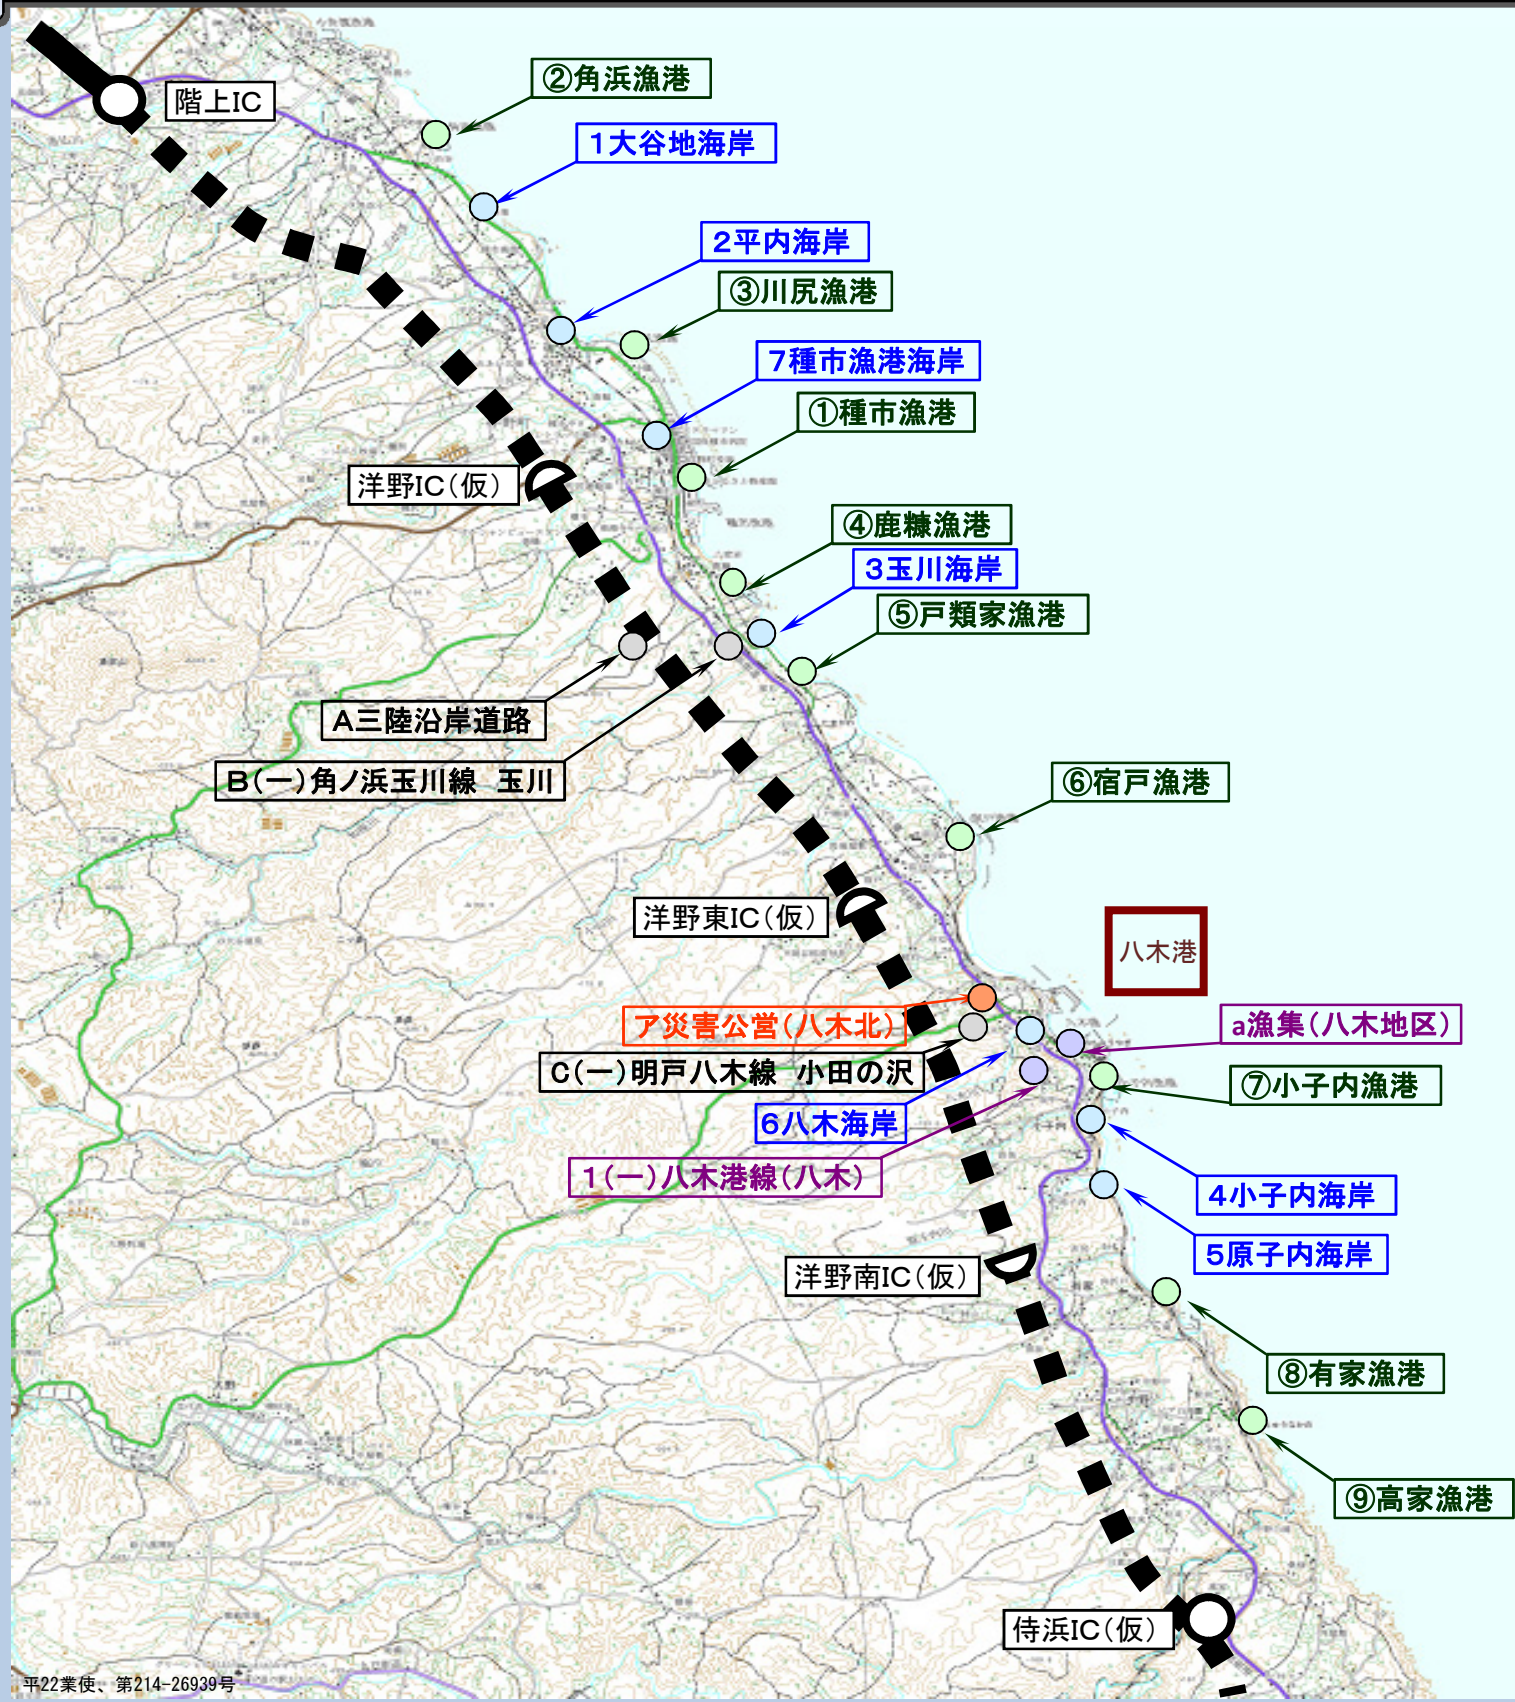


| 分野区分    | 細分項目等      | 事業主体 | 路線・箇所名等         | 事業概要                                    | 年度別整備スケジュール     |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  | 国復興期間     |     |  |
|---------|------------|------|-----------------|---|-----------------|-----|-----|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|-----|-----|--|-----------|-----|--|
|         |            |      |                 |   | 第1期<br>(基礎復興期間) |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |               |                        | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      |                 |   | H23             | H24 | H25 | H26             | H27           | H28                    | H29                  |     | H30 |  | H31       | H32 |  |
| 海岸保全施設  | 一般海岸       | 県    | 1 大谷地海岸         | (災害復旧)<br>根固工V=92m <sup>3</sup> 他       | ■H24.12完成       |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | 2 平内海岸          | (災害復旧)<br>消波工L=220m                     | ■H25.10完成       |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | 3 玉川海岸          | (災害復旧)<br>護岸L=87m 他                     | ■H24.11完成       |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | 4 小子内海岸         | (災害復旧)<br>監視カメラ1台 他                     | ■H24.8完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | 5 原子内海岸         | (災害復旧)<br>根固工V=92m <sup>3</sup> 他       | ■H24.5完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | 6 八木海岸          | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門等N=3基        | 用地設計等           |     | ★工事 |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         | 漁港海岸       |      | 7 種子漁港海岸        | (災害復旧)<br>陸間N=1基、<br>水門N=1基 他           | ■H24.3完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
| 復興道路等   | 復興道路       | 国    | A 三陸沿岸道路        | 洋野階上道路<br>(侍浜～階上)                       | ◆H25.9.12起工式    |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  | ★用地買収、工事等 |     |  |
|         | 復興関連道路     | 県    | B (一)<br>角ノ浜玉川線 | 玉川                                      |                 |     |     |                 | ■H28.3.29供用開始 |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | C (一)<br>明戸八木線  | 小田の沢                                    |                 |     |     |                 |               | 測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 |                      |     |     |  |           |     |  |
| 復興まちづくり | 漁業集落防災機能強化 | 町    | a 八木            | 対象戸数：14戸<br>(民14戸)                      | 用地、設計等          |     |     |                 | 民8戸           |                        |                      | 民6戸 |     |  |           |     |  |
|         | まちづくり連携道路  | 県    | 1 (一)八木港線       | 八木                                      |                 |     |     |                 | ■H29.3.31供用開始 |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
| 災害公営住宅  | 直接建設       | 町    | A 八木北<br>(単独)   | 木造平屋<br>戸数：4戸                           |                 |     | 4戸  | ■H25.8完成        |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
| 漁港      | 漁港         | 町    | ① 種子漁港          | (漁港災害)<br>防波堤L=106m 他                   | ■H24.9完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ② 角浜漁港          | (漁港災害)<br>防波堤L=10m                      | ■H24.3完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ③ 川尻漁港          | (漁港災害)<br>護岸N=1式 他                      | ■H24.3完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ④ 鹿糠漁港          | (漁港災害)<br>船揚場L=22m 他                    | ■H24.3完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ⑤ 戸類家漁港         | (漁港災害)<br>船揚場N=1式                       | ■H24.3完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ⑥ 宿戸漁港          | (漁港災害)<br>防波堤L=69m、<br>船揚場L=8m 他        | ■H24.12完成       |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ⑦ 小子内漁港         | (漁港災害)<br>防波堤L=101m、<br>岸壁L=14m 他       | ■H25.1完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ⑧ 有家漁港          | (漁港災害)<br>防波堤L=85m 他                    | ■H25.1完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | ⑨ 高家漁港          | (漁港災害)<br>防波堤L=45m 他                    | ■H24.11完成       |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
| 港湾      | 八木港        | 県    | 北港地区            | (災害復旧)<br>防波堤L=162m、<br>-4.5m岸壁L=159m 他 | ■H26.3完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |
|         |            |      | 南港地区            | (災害復旧)<br>第2防波堤L=13m、<br>1号護岸L=57.8m 他  | ■H26.3完成        |     |     |                 |               |                        |                      |     |     |  |           |     |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市1/2】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり

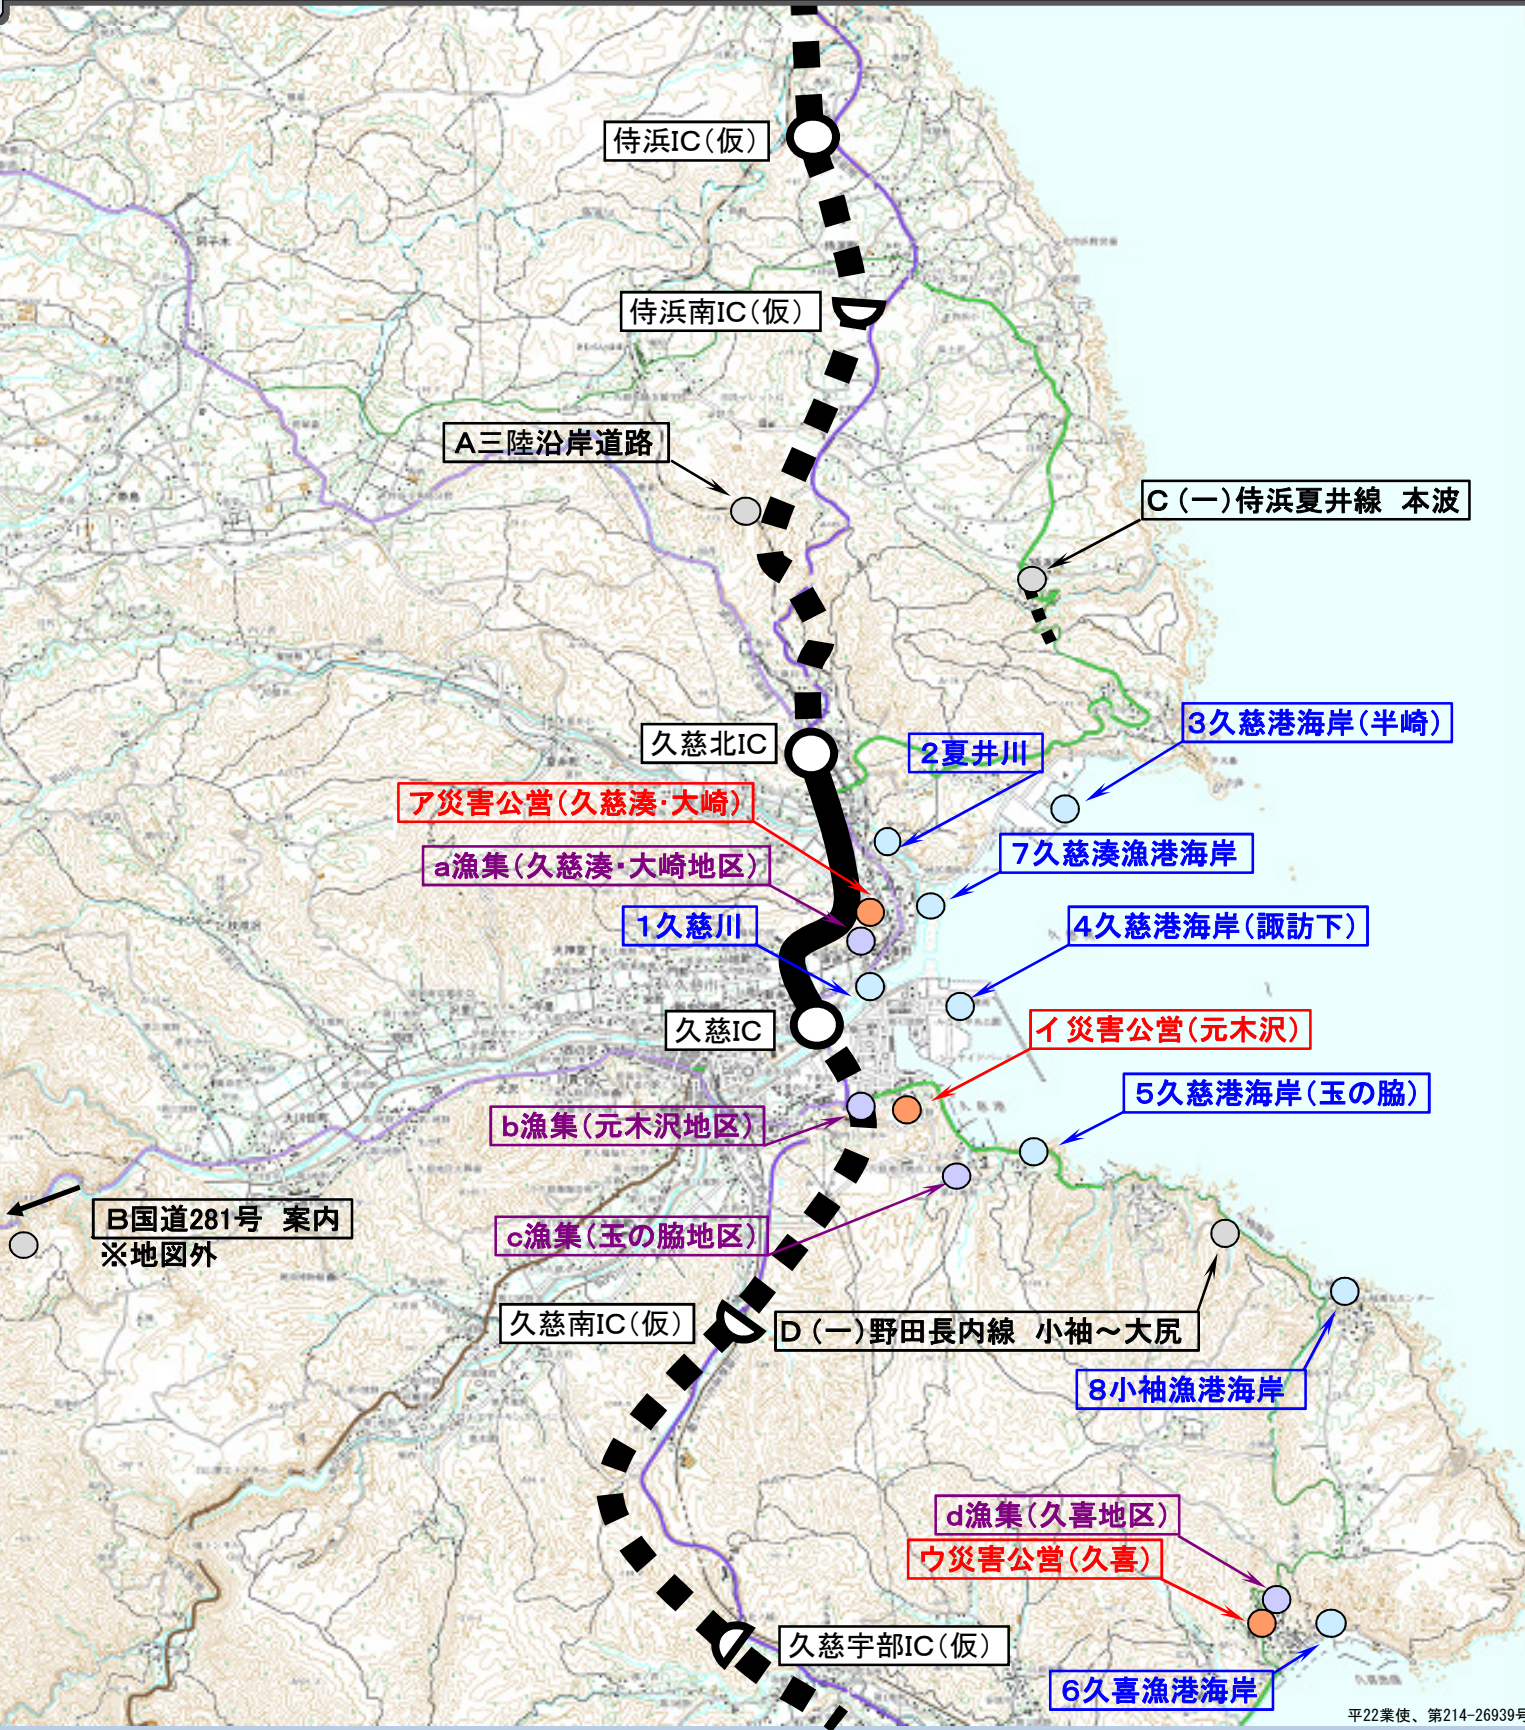

平22業使、第214-26939号


| 分野区分    | 細分項目等      | 事業主体 | 路線・箇所名等                  | 事業概要                              | 年度別整備スケジュール     |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  | 国復興期間 |  |
|---------|------------|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------------|-------|--|
|         |            |      |                          |                                   | 第1期<br>(基盤復興期間) |               |          | 第2期<br>(本格復興期間) |     |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |                  |       |  |
|         |            |      |                          |                                   | H23             | H24           | H25      | H26             | H27 | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32              |       |  |
| 海岸保全施設  | 一般海岸       | 県    | 1 久慈川                    | (三陸高潮)<br>防潮堤L=2.0km              | 用地、設計等          | ★工事           |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | 2 夏井川                    | (三陸高潮)<br>防潮堤L=0.8km              | 用地、設計等          | ★工事           |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         | 港湾海岸       |      | 3 久慈港海岸<br>(半崎)          | (災害復旧)<br>離岸堤L=0.2km              | ■H24.10完成       |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | 4 久慈港海岸<br>(諏訪下)         | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.6km、<br>陸閘N=12基  |                 |               | ■H28.3完成 |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | 5 久慈港海岸<br>(玉の脇)         | (災害復旧)<br>離岸堤L=0.4km              | ■H24.10完成       |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         | 漁港海岸       |      | 6 久喜漁港海岸                 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=2基 他 |                 |               |          | ■H29.3完成        |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | 7 久慈湊<br>漁港海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.3km、<br>水門N=4基   |                 |               |          | ■H29.3完成        |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | 8 小袖漁港海岸                 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他 |                 |               | ■H28.3完成 |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
| 復興道路等   | 復興道路       | 国    | A 三陸沿岸道路                 | 久慈北道路<br>(侍浜～久慈北)                 | ◆H24.8.30起工式    | ★用地買収、工事等     |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      |                          | 野田久慈道路<br>(普代～久慈)                 | ◆H25.6.27起工式    | ★用地買収、工事等     |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         | 復興支援道路     | 県    | B 国道281号                 | 案内                                | ◆H25.12着工       | ★工事           |          |                 |     |     |                      |     |     | ■H29.11.19供用開始予定 |       |  |
|         |            |      | 復興関連道路                   | C (一)<br>侍浜夏井線                    | 本波              | ■H24.9.30供用開始 |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | D (一)<br>野田長内線           | 小袖～大尻                             | ★工事             |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
| 復興まちづくり | 漁業集落防災機能強化 | 市    | a 久慈湊・大崎                 | 対象戸数:14戸<br>(民9戸・公5戸)             | ■H26.3完成        |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | b 元木沢                    | 対象戸数:5戸<br>(民2戸・公3戸)              | ■H25.11完成       |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | c 玉の脇                    | 対象戸数:3戸<br>(民3戸)                  | ■H25.11完成       |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | d 久喜                     | 対象戸数:4戸<br>(民1戸・公3戸)              | ■H25.8完成        |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
| 災害公営住宅  | 直接建設       | 市    | ア 久慈湊・大崎<br>(漁:久慈湊・大崎地区) | 木造<br>戸数:5戸                       | ■H26.3完成        |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | イ 元木沢<br>(漁:元木沢地区)       | 木造<br>戸数:3戸                       | ■H26.3完成        |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |
|         |            |      | ウ 久喜<br>(漁:久喜地区)         | 木造<br>戸数:3戸                       | ■H25.12完成       |               |          |                 |     |     |                      |     |     |                  |       |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市2/2】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり

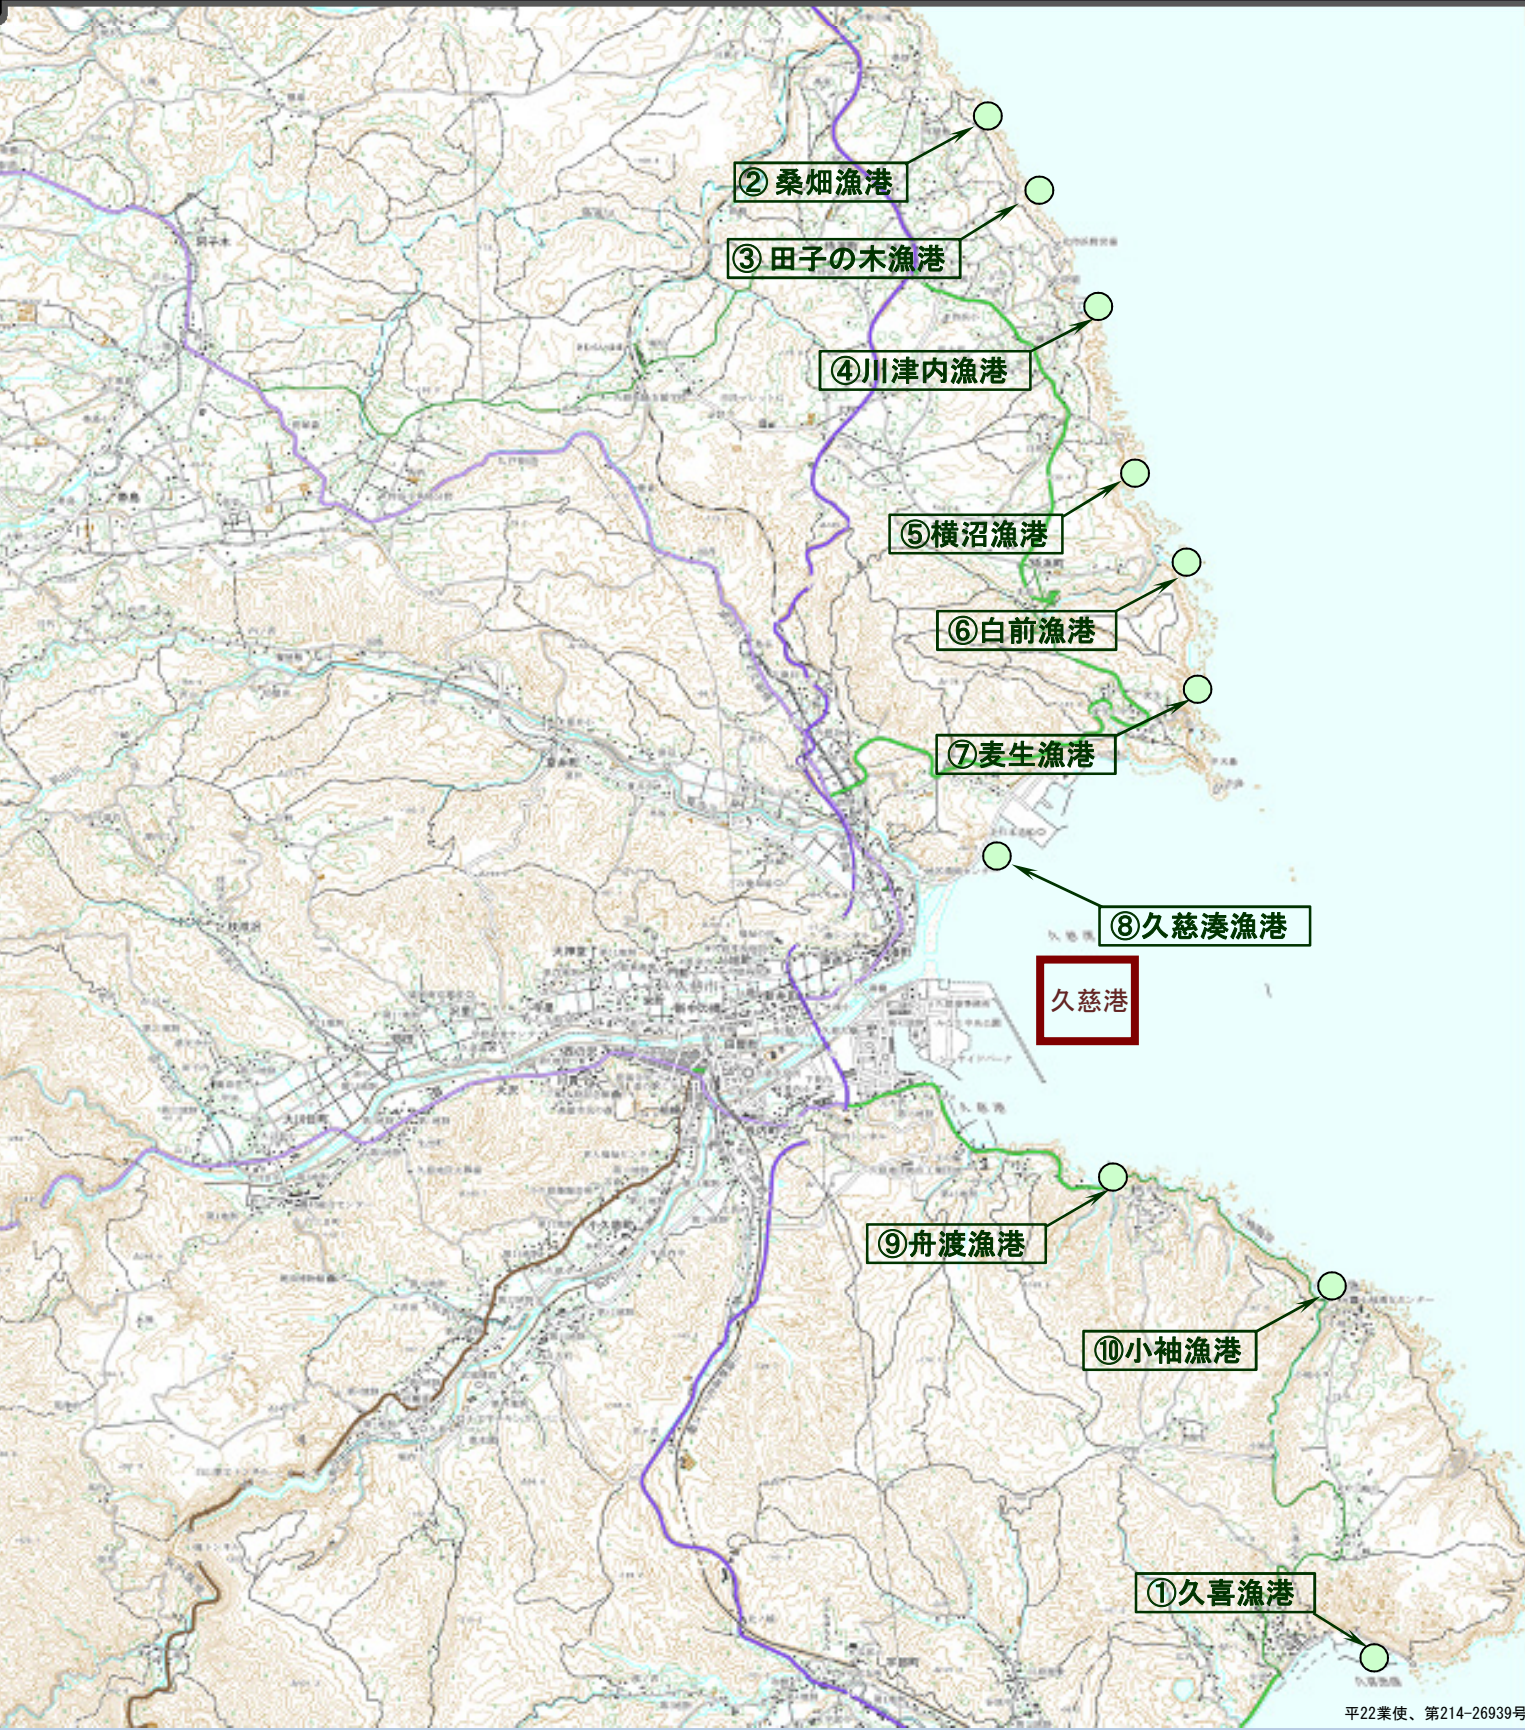


| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体  | 路線・箇所名等  | 事業概要  | 年度別整備スケジュール  |     |            |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|------|-------|-------|----------|---|--|-----|------------|-----------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------|--|--|--|
|      |       |       |          |   | 第1期<br>（基盤復興期間）  |     |            | 第2期<br>（本格復興期間） |     |     | 第3期<br>（更なる展開への連結期間） |     |     | 国復興期間 |  |  |  |
|      |       |       |          |   | H23  | H24 | H25        | H26             | H27 | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32   |  |  |  |
| 漁港   | 漁港    | 県     | ① 久喜漁港   | （漁港災害）<br>防波堤L=162m、<br>岸壁L=93m 他   |  |     | ■ H25.7完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ② 桑畑漁港   | （漁港災害）<br>用地N=1式 他  |  |     | ■ H24.1完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ③ 田子の木漁港 | （漁港災害）<br>護岸N=1式 他  |  |     | ■ H23.8完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ④ 川津内漁港  | （漁港災害）<br>防波堤L=11m 他  |  |     | ■ H24.3完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ⑤ 横沼漁港   | （漁港災害）<br>-3m岸壁N=1式 他   |  |     | ■ H24.3完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       | 市     | ⑥ 白前漁港   | （漁港災害）<br>防波堤L=29m 他  |  |     | ■ H24.3完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ⑦ 麦生漁港   | （漁港災害）<br>物揚場N=1式 他   |  |     | ■ H24.3完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ⑧ 久慈湊漁港  | （漁港災害）<br>航路N=1式  |  |     | ■ H23.9完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ⑨ 舟渡漁港   | （漁港災害）<br>護岸L=64m 他   |  |     | ■ H24.5完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | ⑩ 小袖漁港   | （漁港災害）<br>防波堤L=150m 他   |  |     | ■ H24.7完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
| 港湾   | 久慈港   | 国     | 湾口防波堤    | （防波堤整備・直轄災害復旧）<br>防波堤L=3,800m   | ★工事 H40完成目標  |     |            |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       |       | 県        | 堀込地区  | （災害復旧）<br>-4.5m岸壁L=180m、<br>-6.0m岸壁L=497m、<br>-2.0m物揚場L=105m |     |            | ■ H26.3完成       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       | 諏訪下地区 |          | （災害復旧）<br>諏訪下防波堤L=5.0m、<br>外防波堤L=293m、<br>-7.5m岸壁L=281.6m、<br>-10.0m岸壁L=23.7m |  |     | ■ H26.3完成  |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       | 玉の脇地区 |          | （災害復旧）<br>外防波堤L=297m、<br>北防波堤L=152m、<br>内防波堤L=95m、<br>物揚場L=51m                |  |     | ■ H25.10完成 |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|      |       | 半崎地区  |          | （災害復旧）<br>半崎防波堤L=23m、<br>波除堤L=40m、<br>-4.0m物揚場L=69m<br>船揚場L=48m               |  |     | ■ H25.11完成 |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

安全・安心で活力あるむらづくり

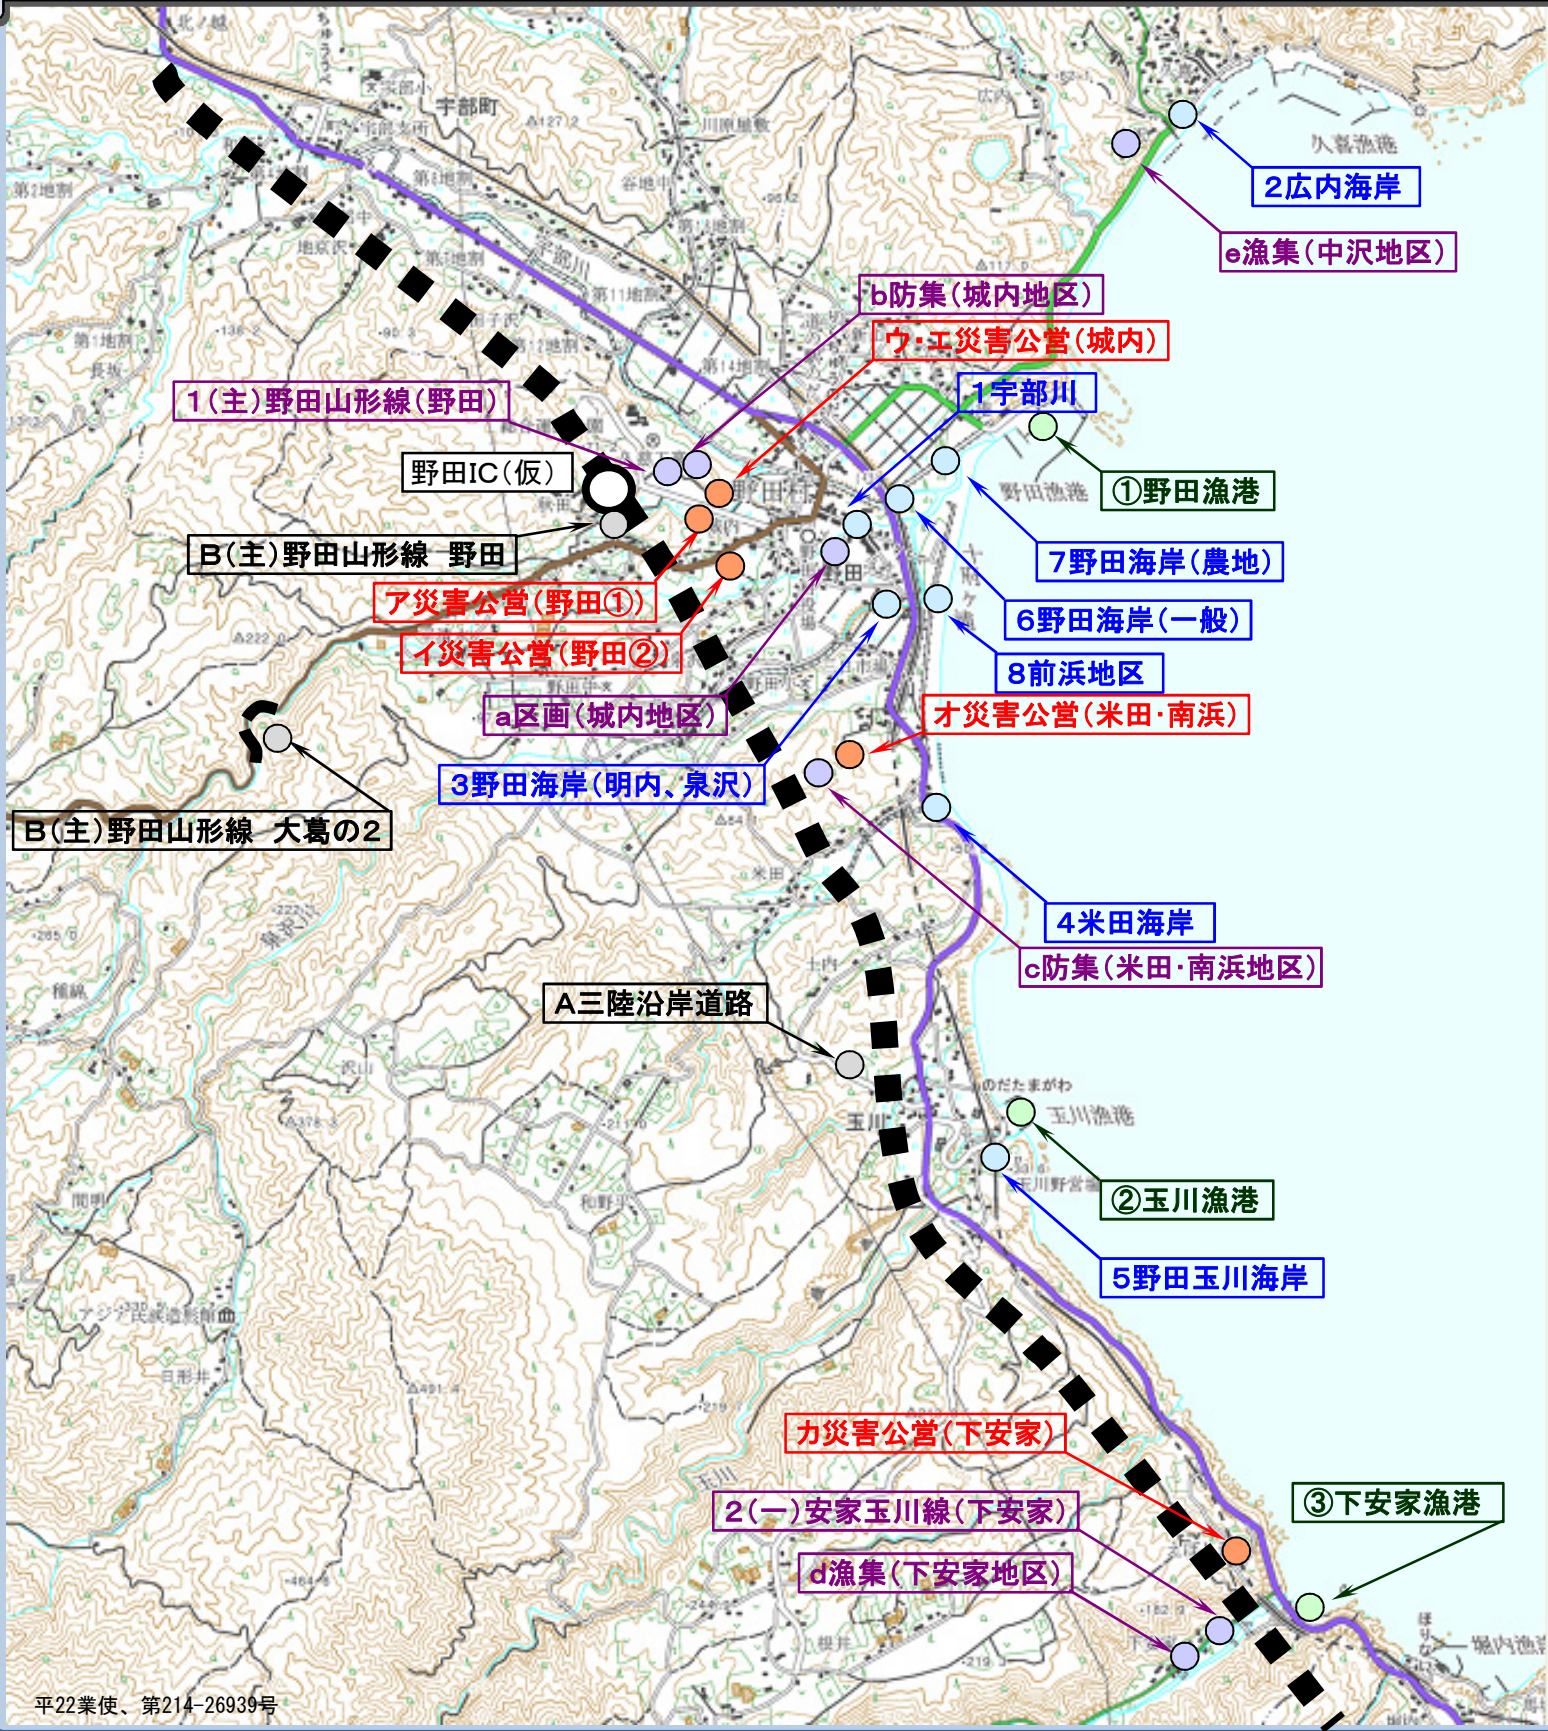


| 分野区分          | 細分項目等         | 事業主体   | 路線・箇所名等  | 事業概要  | 年度別整備スケジュール            |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     | 国復興期間 |  |
|---------------|---------------|--------|--|---|------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|--|
|               |               |        |  |   | 第1期<br>(基金復興期間)        |                |            | 第2期<br>(本格復興期間) |                 |                | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |     |       |  |
|               |               |        |  |   | H23                    | H24            | H25        | H26             | H27             | H28            | H29                  | H30 | H31 | H32 |       |  |
| 海岸保全施設        | 一般海岸          | 県      | 1 宇部川  | (災害復旧)<br>水門設備1式他   | ■H26.3完成               |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | 2 広内海岸   | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門等N=4基他                         | 用地、設計等                 | ★工事            |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | 3 野田海岸<br>(明内、泉沢)                              | (災害復旧)<br>水門設備等1式他  | ■H25.3完成               |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | 4 米田海岸   | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門等N=2基他<br>(海岸高潮)<br>防潮堤L=0.4km |                        | ★工事            |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | 5 野田玉川海岸                                       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.05km他                                    | ■H25.5完成               |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | 6 野田海岸   | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門等N=1基                          |                        | ★工事            |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               | 農地海岸          | 7 野田海岸 | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤裏法面<br>A=2,320㎡、<br>水門操作室N=1棟 | ■H24.8完成  |                        |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               | 林野海岸          | 8 前浜地区 | (治山施設災害)<br>防潮堤L=1.3km                         |   | ★工事                    |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
| 復興道路等         | 復興道路          | 国      | A 三陸沿岸道路                                       | 野田久慈道路<br>(菅代～久慈)   | ◆H25.6.27起工式 ★用地買収、工事等 |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               | 復興関連道路        | 県      | B (主)<br>野田山形線                                 | 大葛の2  | ■H25.7.2供用開始           |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
| 復興まちづくり       | 土地区画整理        | 村      | a 城内地区   | 区域面積: 12.9ha<br>対象戸数: 137戸<br>(民124戸・公13戸)                |                        |                | 民18戸       | 民17戸<br>公13戸    | 民63戸            | 民26戸           | ■H28.10完成            |     |     |     |       |  |
|               |               |        | b 城内地区   | 対象戸数: 74戸<br>(民20戸・公54戸)                                  |                        |                |            | 民20戸            | 公54戸            | ■H27.1完成       |                      |     |     |     |       |  |
|               | c 米田・南浜地区     |        | 対象戸数24戸<br>(民18戸・公6戸)                          |   |                        | 民18戸           | 公6戸        | ■H25.11完成       |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               | d 下安家地区       |        | 対象戸数: 14戸<br>(民13戸・公1戸)                        |   |                        | 民9戸            | 民4戸<br>公1戸 | ■H26.12完成       |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               | e 中沢地区        |        | 対象戸数: 2戸<br>(民2戸)                              |   |                        |                | 民2戸        | ■H27.3完成        |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               | まちづくり<br>連携道路 | 県      | 1 (主)野田山形線                                     | 野田  | ◆H25.1着工 ★工事           |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | 2 (一)安家玉川線                                     | 下安家   |                        |                |            |                 |                 | ■H29.3.31供用開始  |                      |     |     |     |       |  |
|               | 災害公営住宅        | 直接建設   | 県  | ア 野田①<br>(単独)   | 木造2階<br>戸数: 8戸         | 8戸<br>■H25.3完成 |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
| イ 野田②<br>(単独) |               |        |  | 木造<br>戸数: 18戸   | 18戸<br>■H26.1完成        |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
| 村             |               |        | ウ 城内<br>(区: 城内地区)                              | 木造<br>戸数: 13戸   |                        |                |            |                 | 13戸<br>■H27.3完成 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | エ 城内<br>(防: 城内地区)                              | 木造<br>戸数: 54戸   |                        |                |            |                 |                 |                | 54戸<br>■H28.3完成      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | オ 米田・南浜<br>(防: 米田・南浜地区)                        | 木造<br>戸数: 6戸  |                        |                |            |                 |                 | 6戸<br>■H26.7完成 |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        | カ 下安家<br>(漁: 下安家地区)                            | 木造<br>戸数: 1戸  |                        |                |            |                 |                 | 1戸<br>■H26.7完成 |                      |     |     |     |       |  |
|               |               |        |  |   |                        |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
| 漁港            | 漁港            | 県      | ① 野田漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=125m、<br>岸壁L=307m 他                        | ■H26.3完成               |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               | 村      | ② 玉川漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=132m、<br>岸壁L=50m 他                         | ■H24.9完成               |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |
|               |               | 村      | ③ 下安家漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=28m 他                                      | ■H24.9完成               |                |            |                 |                 |                |                      |     |     |     |       |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【普代村】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ

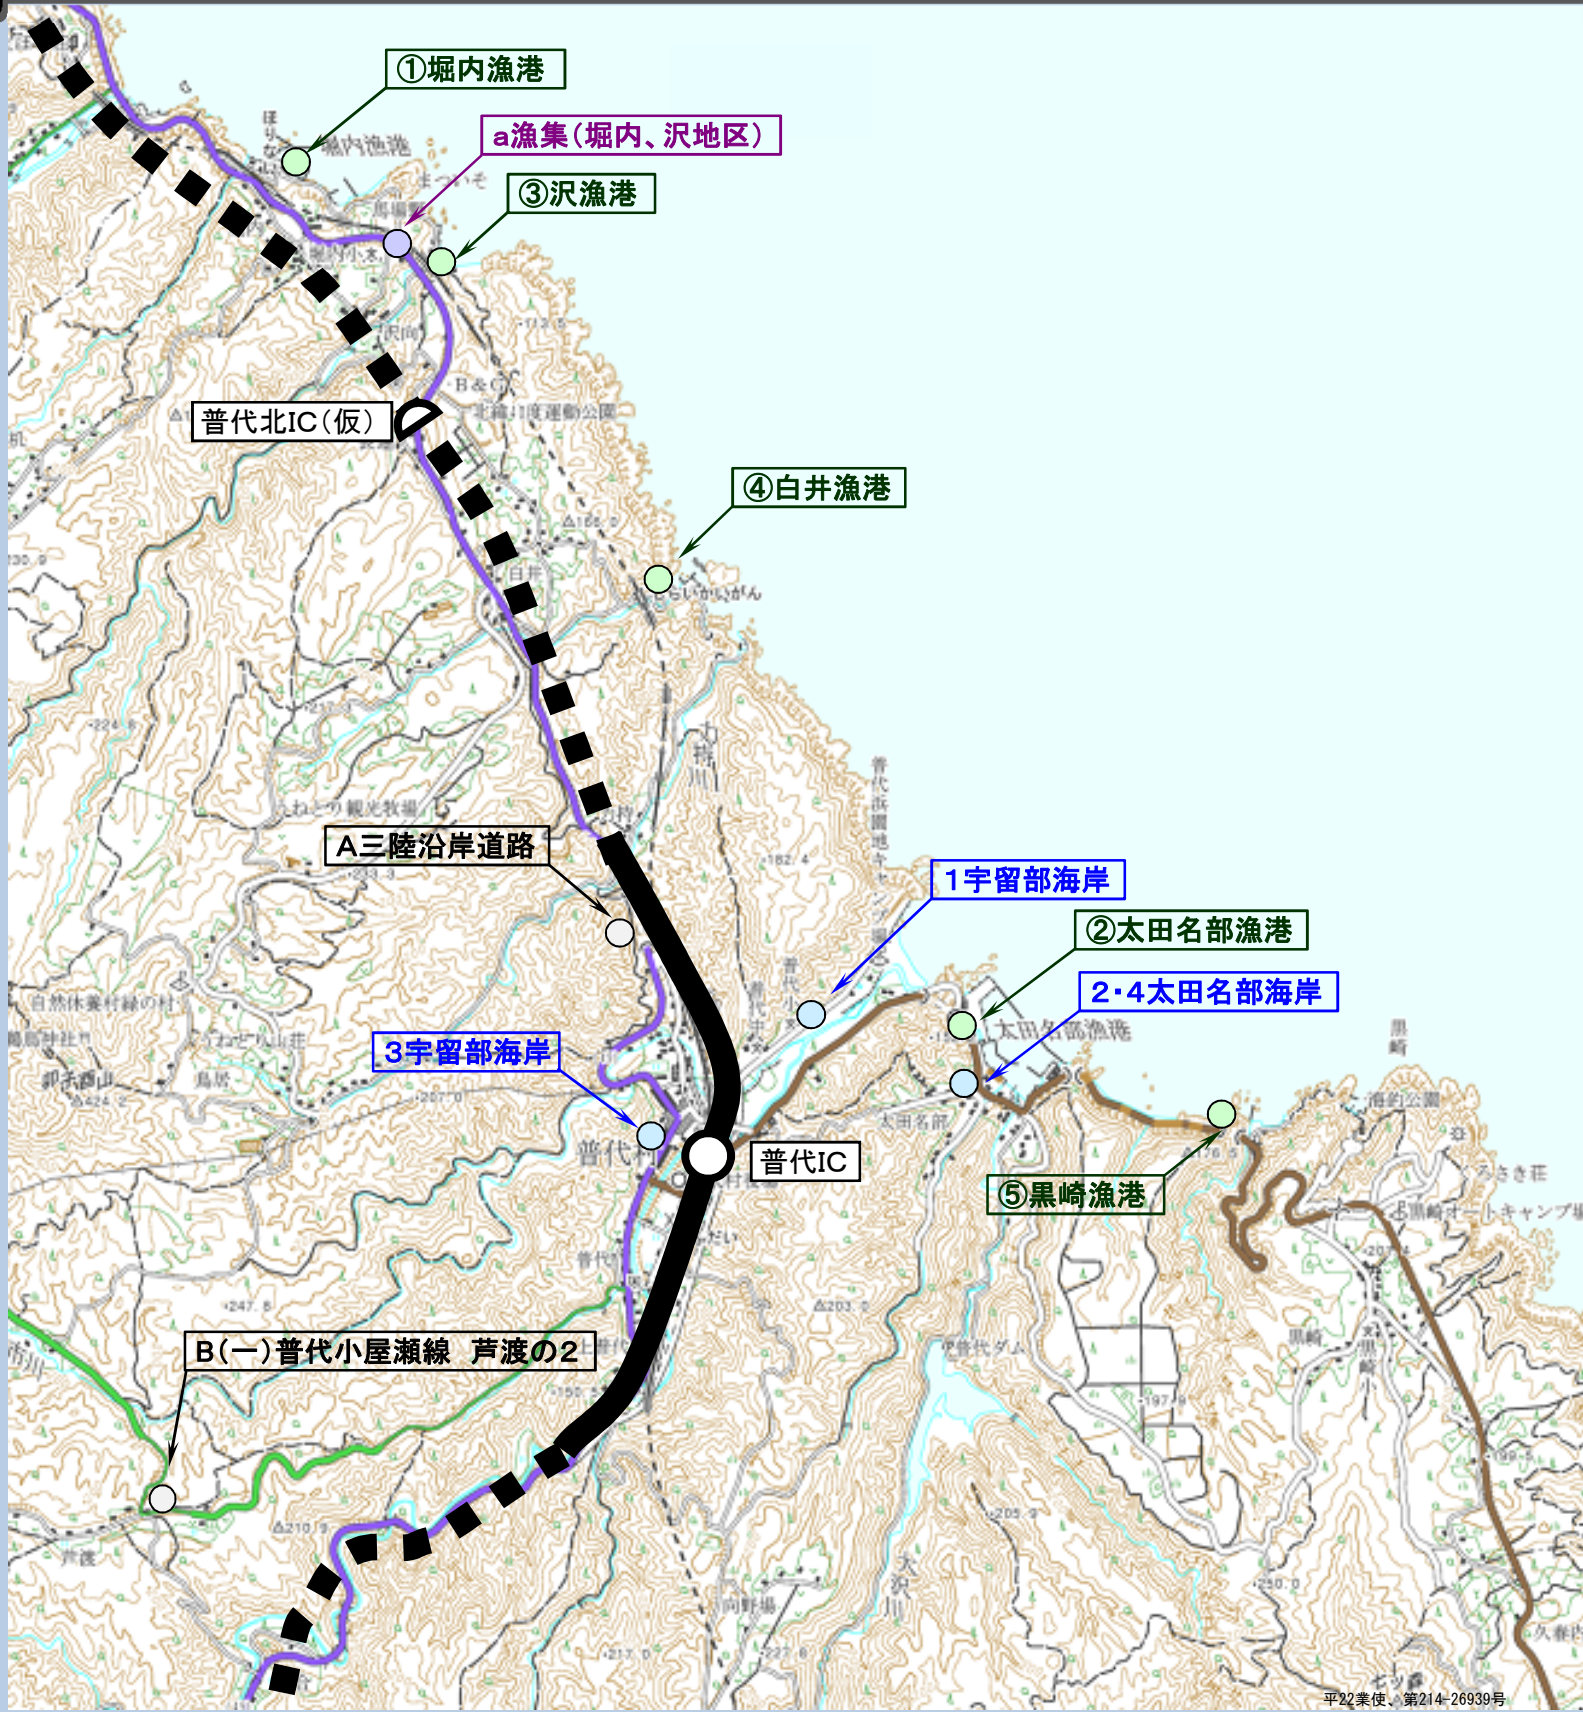


| 分野区分    | 細分項目等      | 事業主体 | 路線・箇所名等             | 事業概要                              | 年度別整備スケジュール            |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|---------|------------|------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-----|----------|-----------------|-----|---------------|----------------------|--|-----|-------|-----|-----|--|
|         |            |      |                     |                                   | 第1期<br>（基盤復興期間）        |     |          | 第2期<br>（本格復興期間） |     |               | 第3期<br>（更なる展開への連結期間） |  |     | 国復興期間 |     |     |  |
|         |            |      |                     |                                   | H23                    | H24 | H25      | H26             | H27 | H28           | H29                  |  | H30 |       | H31 | H32 |  |
| 海岸保全施設  | 一般海岸       | 県    | 1 宇留部海岸             | （災害復旧）<br>水門設備1式 他                | ■H25.10完成              |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | 2 太田名部海岸            | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.1km 他            | ■H24.10完成              |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | 3 宇留部海岸             | （県単治水事業）<br>陸間N=1基                | ■H25.10完成              |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | 4 太田名部海岸            | （海岸危機）<br>陸間等遠隔操作化<br>N=2基        |                        |     |          | ■H28.3完成        |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
| 復興道路等   | 復興道路       | 国    | A 三陸沿岸道路            | 野田久慈道路<br>（普代～久慈）                 | ◆H25.6.27起工式 ★用地買収、工事等 |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | 普代道路<br>（普代バイパス）    | ■H25.10.13供用開始                    |                        |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | 尾肝要普代道路<br>（尾肝要～普代） | ◆H25.11.18起工式 ★用地買収、工事等           |                        |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         | 復興関連道路     | 県    | B（一）<br>普代小屋瀬線      | 芦渡の2                              |                        |     |          |                 |     | ■H29.1.24供用開始 |                      |  |     |       |     |     |  |
| 復興まちづくり | 漁業集落防災機能強化 | 村    | a 堀内、沢地区            | 避難路                               |                        |     | ■H27.3完成 |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
| 漁港      | 漁港         | 県    | ① 堀内漁港              | （漁港災害）<br>防波堤N=1式 他               | ■H25.10完成              |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | ② 太田名部漁港            | （漁港災害）<br>防波堤L=285m、<br>岸壁L=36m 他 | ■H25.10完成              |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            | 村    | ③ 沢漁港               | （漁港災害）<br>防波堤L=77m 他              | ■H25.7完成               |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | ④ 白井漁港              | （漁港災害）<br>防波堤L=89m、<br>岸壁L=7m 他   | ■H24.6完成               |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |
|         |            |      | ⑤ 黒崎漁港              | （漁港災害）<br>泊地N=1式                  | ■H23.9完成               |     |          |                 |     |               |                      |  |     |       |     |     |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

心をひとつに 未来に向けた復興

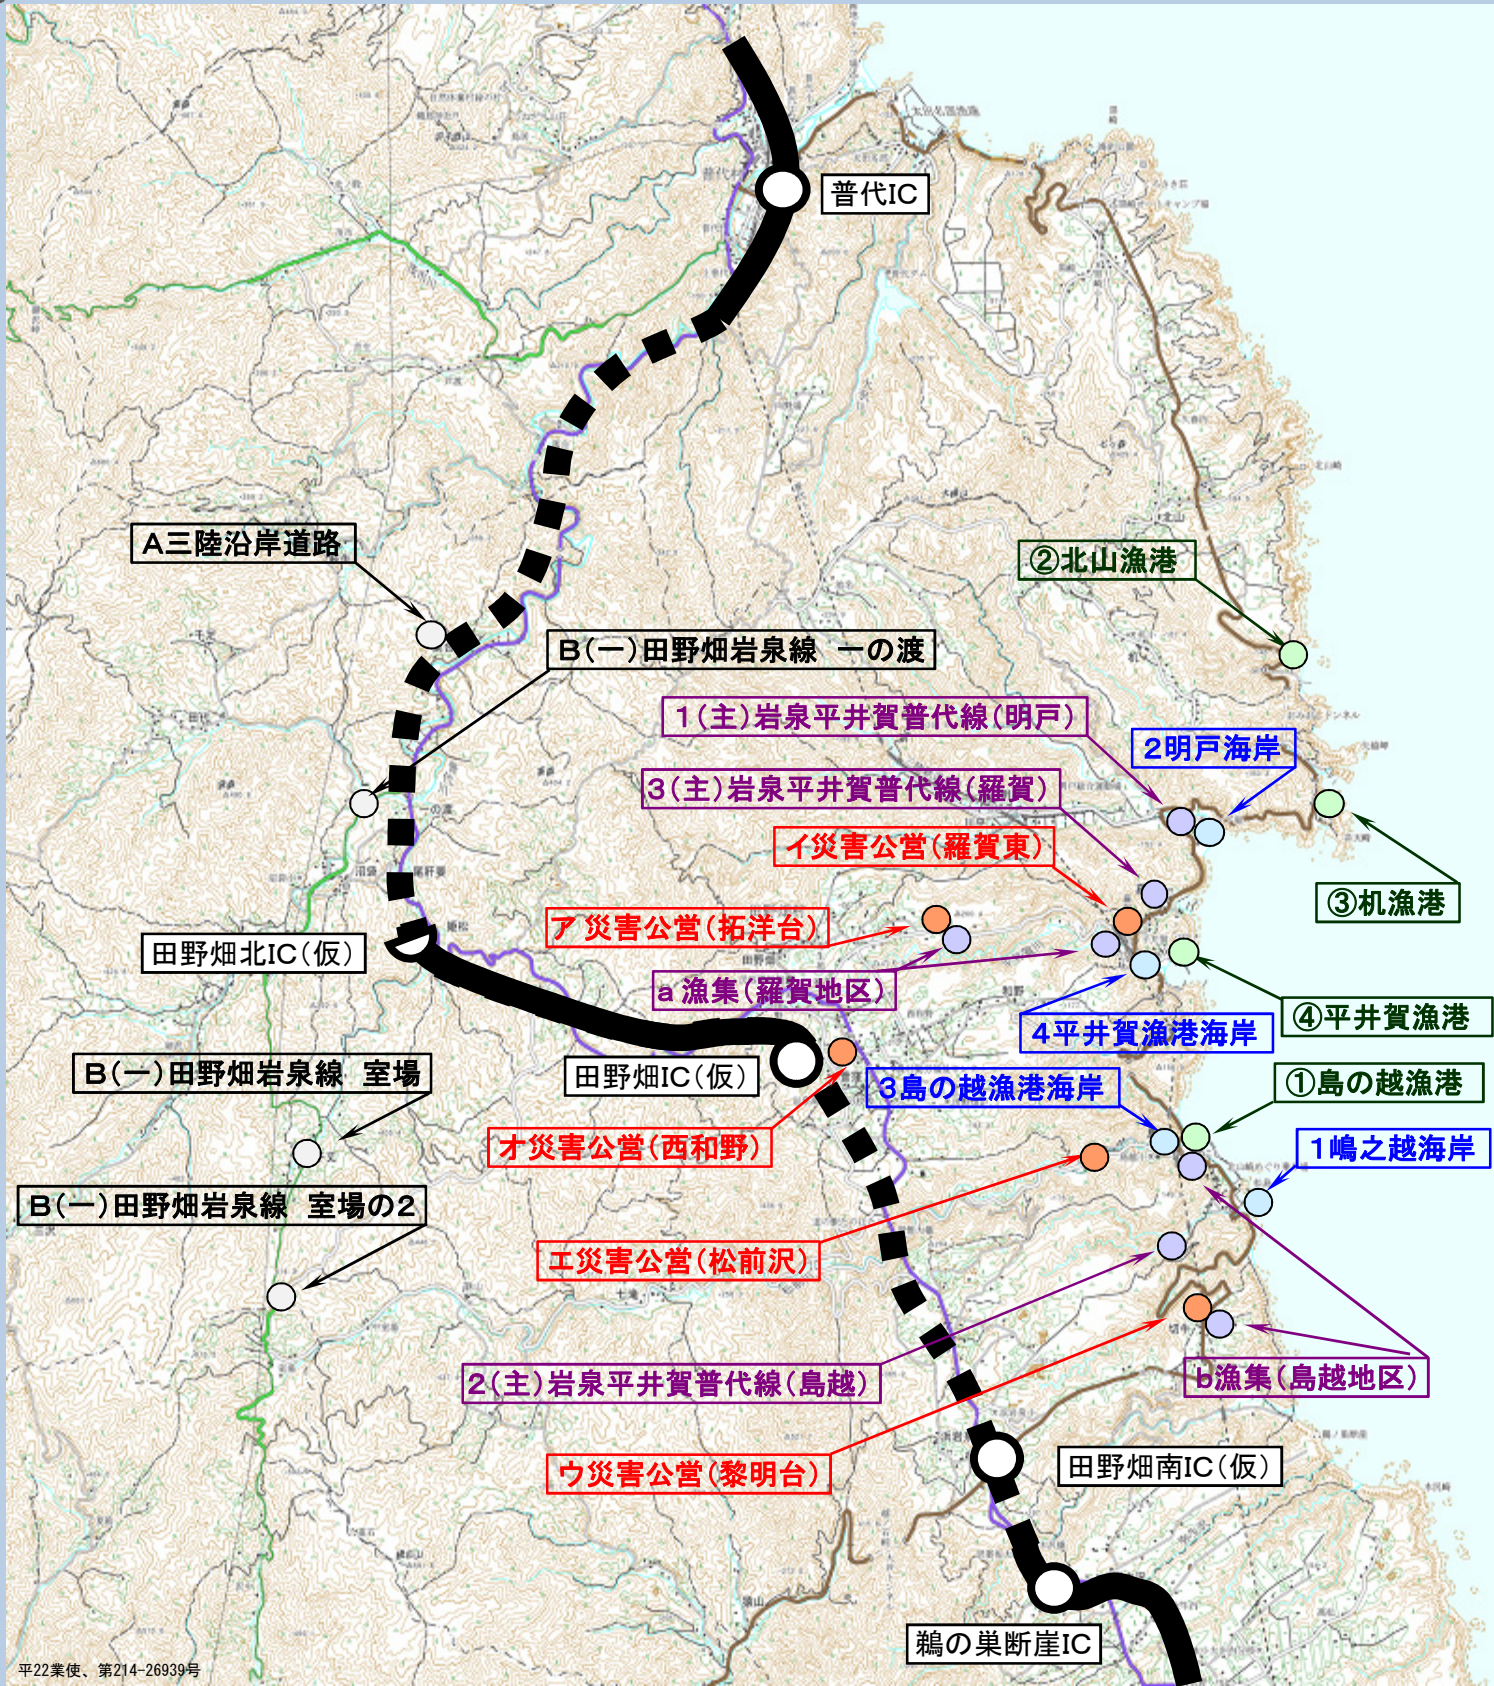

| 分野区分    | 細分項目等      | 事業主体 | 路線・箇所名等          | 事業概要                          | 年度別整備スケジュール     |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     | 国復興期間 |
|---------|------------|------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--|-----|-----|-------|
|         |            |      |                  |                               | 第1期<br>(基礎復興期間) |     | 第2期<br>(本格復興期間) |               |          | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |               |  | H30 | H31 | H32   |
|         |            |      |                  |                               | H23             | H24 | H25             | H26           | H27      | H28                  | H29           |  |     |     |       |
| 海岸保全施設  | 一般海岸       | 県    | 1 嶋之越海岸          | (海岸危機) 防潮堤L=0.04km、水門等N=2基    |                 |     |                 | ■H27.3完成      |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | 2 明戸海岸           | (災害復旧) 防潮堤L=0.4km             |                 |     |                 |               | ■H28.3完成 |                      |               |  |     |     |       |
|         | 漁港海岸       | 県    | 3-1 島の越漁港海岸      | (災害復旧) 防潮堤L=0.4km             |                 |     |                 | 用地、設計等        |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | 3-2 島の越(松前川地区)   | (海岸高潮) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基      |                 |     |                 | 用地、設計等        |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            | 村    | 4 平井賀漁港海岸        | (災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基      |                 |     |                 | 用地、設計等        |          |                      |               |  |     |     |       |
| 復興道路等   | 復興道路       | 国    | A 三陸沿岸道路         | 尾肝要普代道路(尾肝要～普代)               |                 |     |                 | ◆H25.11.18起工式 |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      |                  | 尾肝要道路                         |                 |     |                 | ■H26.3.2供用開始  |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      |                  | 田野畑道路(田野畑南～尾肝要)               |                 |     |                 | ◆H25.11.7起工式  |          |                      |               |  |     |     |       |
|         | 復興関連道路     | 県    | B (一) 田野畑岩泉線     | 室場                            |                 |     |                 | ■H24.3.27供用開始 |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      |                  | 室場の2                          |                 |     |                 | ◆H25.3 着工     |          |                      |               |  |     |     |       |
| 復興まちづくり | 漁業集落防災機能強化 | 村    | a 羅賀地区           | 対象戸数: 50戸 (民23戸・公27戸)         |                 |     |                 | 民6戸 公7戸       |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | b 島越地区           | 対象戸数: 72戸 (民38戸・公34戸)         |                 |     |                 | 民38戸 公10戸     |          |                      |               |  |     |     |       |
|         | まちづくり連携道路  | 県    | 1 (主)岩泉平井賀普代線    | 明戸                            |                 |     |                 |               |          |                      | ■H29.3.15供用開始 |  |     |     |       |
|         |            |      | 2 (主)岩泉平井賀普代線    | 島越                            |                 |     |                 |               |          |                      | ◆H26.10着工     |  |     |     |       |
|         |            |      | 3 (主)岩泉平井賀普代線    | 羅賀                            |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
| 災害公営住宅  | 買取         | 村    | ア 拓洋台地区(漁: 羅賀地区) | 木造 戸数: 20戸                    |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | イ 羅賀東地区(漁: 羅賀地区) | 木造 戸数: 7戸                     |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | ウ 黎明台地区(漁: 島越地区) | 木造 戸数: 24戸                    |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | エ 松前沢地区(漁: 島越地区) | 木造 戸数: 10戸                    |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
|         | 直接建設       | 村    | オ 西和野地区(単独)      | 木造 戸数: 2戸                     |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
| 漁港      | 漁港         | 県    | ① 島の越漁港          | (漁港災害) 防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他 |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | ② 北山漁港           | (漁港災害) 臨港道路L=155m             |                 |     |                 | ■H25.3完成      |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | ③ 机漁港            | (漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=101m 他   |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |
|         |            |      | ④ 平井賀漁港          | (漁港災害) 防波堤L=666m、岸壁L=193m 他   |                 |     |                 |               |          |                      |               |  |     |     |       |



**基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）**

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉



## 安家地区


| 分野区分                       | 細分項目等      | 事業主体 | 路線・箇所名等        | 事業概要  | 年度別整備スケジュール                        |     |     |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|----------------------------|------------|------|----------------|---|------------------------------------|-----|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------------|-----|-----|-------|-----|--|--|--|--|
|                            |            |      |                |   | 第1期<br>(基盤復興期間)                    |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |              |                | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     | 国復興期間 |     |  |  |  |  |
|                            |            |      |                |   | H23                                | H24 | H25 | H26             | H27          | H28            | H29                  | H30 | H31 |       | H32 |  |  |  |  |
| 海岸保全施設                     | 一般海岸       | 県    | 1 小本川          | (三陸高潮)<br>防潮堤L=0.2km                              |                                    |     |     |                 | ■H28.3完成     |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            |            |      | 2 小本海岸         | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km                              | ■H25.3完成                           |     |     |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            | 漁港海岸       | 町    | 3 茂師漁港海岸       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.1km、<br>水門N=1基 他                 |                                    |     |     |                 |              | ■H29.3完成       |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            |            |      | 4 小本漁港海岸       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基 他                 | ■H25.3完成                           |     |     |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 復興道路等                      | 復興道路       | 国    | A 三陸沿岸道路       | 田老岩泉道路<br>(田老北～岩泉)                                | ◆H25.3.27起工式 ★用地買収、工事等             |     |     |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            | 復興支援道路     | 県    | B (主)<br>久慈岩泉線 | 龍泉洞   | ■H24.8.28供用開始                      |     |     |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            |            |      |                | 大月峠   |                                    |     |     |                 |              | ■H28.11.22供用開始 |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            |            |      | C (国)340号      | 押角峠   |                                    |     |     |                 | ◆H27.8着工 ★工事 |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| ※宮古市の復興支援道路・国道340号押角峠と同一箇所 |            |      |                |   |                                    |     |     |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 復興まちづくり                    | 漁業集落防災機能強化 | 町    | a 小本地区         | 対象戸数:59戸<br>(民59戸)                                |                                    |     |     |                 | ■H27.3完成     |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 災害公営住宅                     | 直接建設       | 町    | ア 森の越<br>(単独)  | 木造<br>戸数:15戸                                      |                                    |     | 15戸 |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            |            |      | イ 小本<br>(単独)   | 木造<br>戸数:20戸<br>RC造<br>戸数:16戸                     | ■H25.5完成                           |     |     |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            |            |      |                |   |                                    |     | 36戸 |                 |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 漁港                         | 漁港         | 県    | ① 茂師漁港         | (漁港災害)<br>防波堤L=493m、<br>岸壁L=280m 他                |                                    |     |     | ■H27.3完成        |              |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            |            |      | 町              | ② 小本漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=103m、<br>岸壁L=844m 他 |     |     |                 | ■H27.3完成     |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 港湾                         | 小本港        | 県    | 小本浜地区          | (港湾災害復旧)<br>防波堤L=871m、<br>岸壁L=119m、<br>物揚場L=105m他 |                                    |     |     |                 | ■H27.9完成     |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 医療                         | 医科診療所      | 町    | 小本診療所          | 診療所施設整備   |                                    |     |     |                 | ■H27.12完成    |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 教育                         | 小学校        | 町    | 1 小本小学校        | (災害復旧)<br>移転                                      |                                    |     |     |                 | ■H28.3完成     |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |
|                            | 中学校        |      | 2 小本中学校        | (災害復旧)<br>移転                                      |                                    |     |     |                 | ■H28.3完成     |                |                      |     |     |       |     |  |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市1/4】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

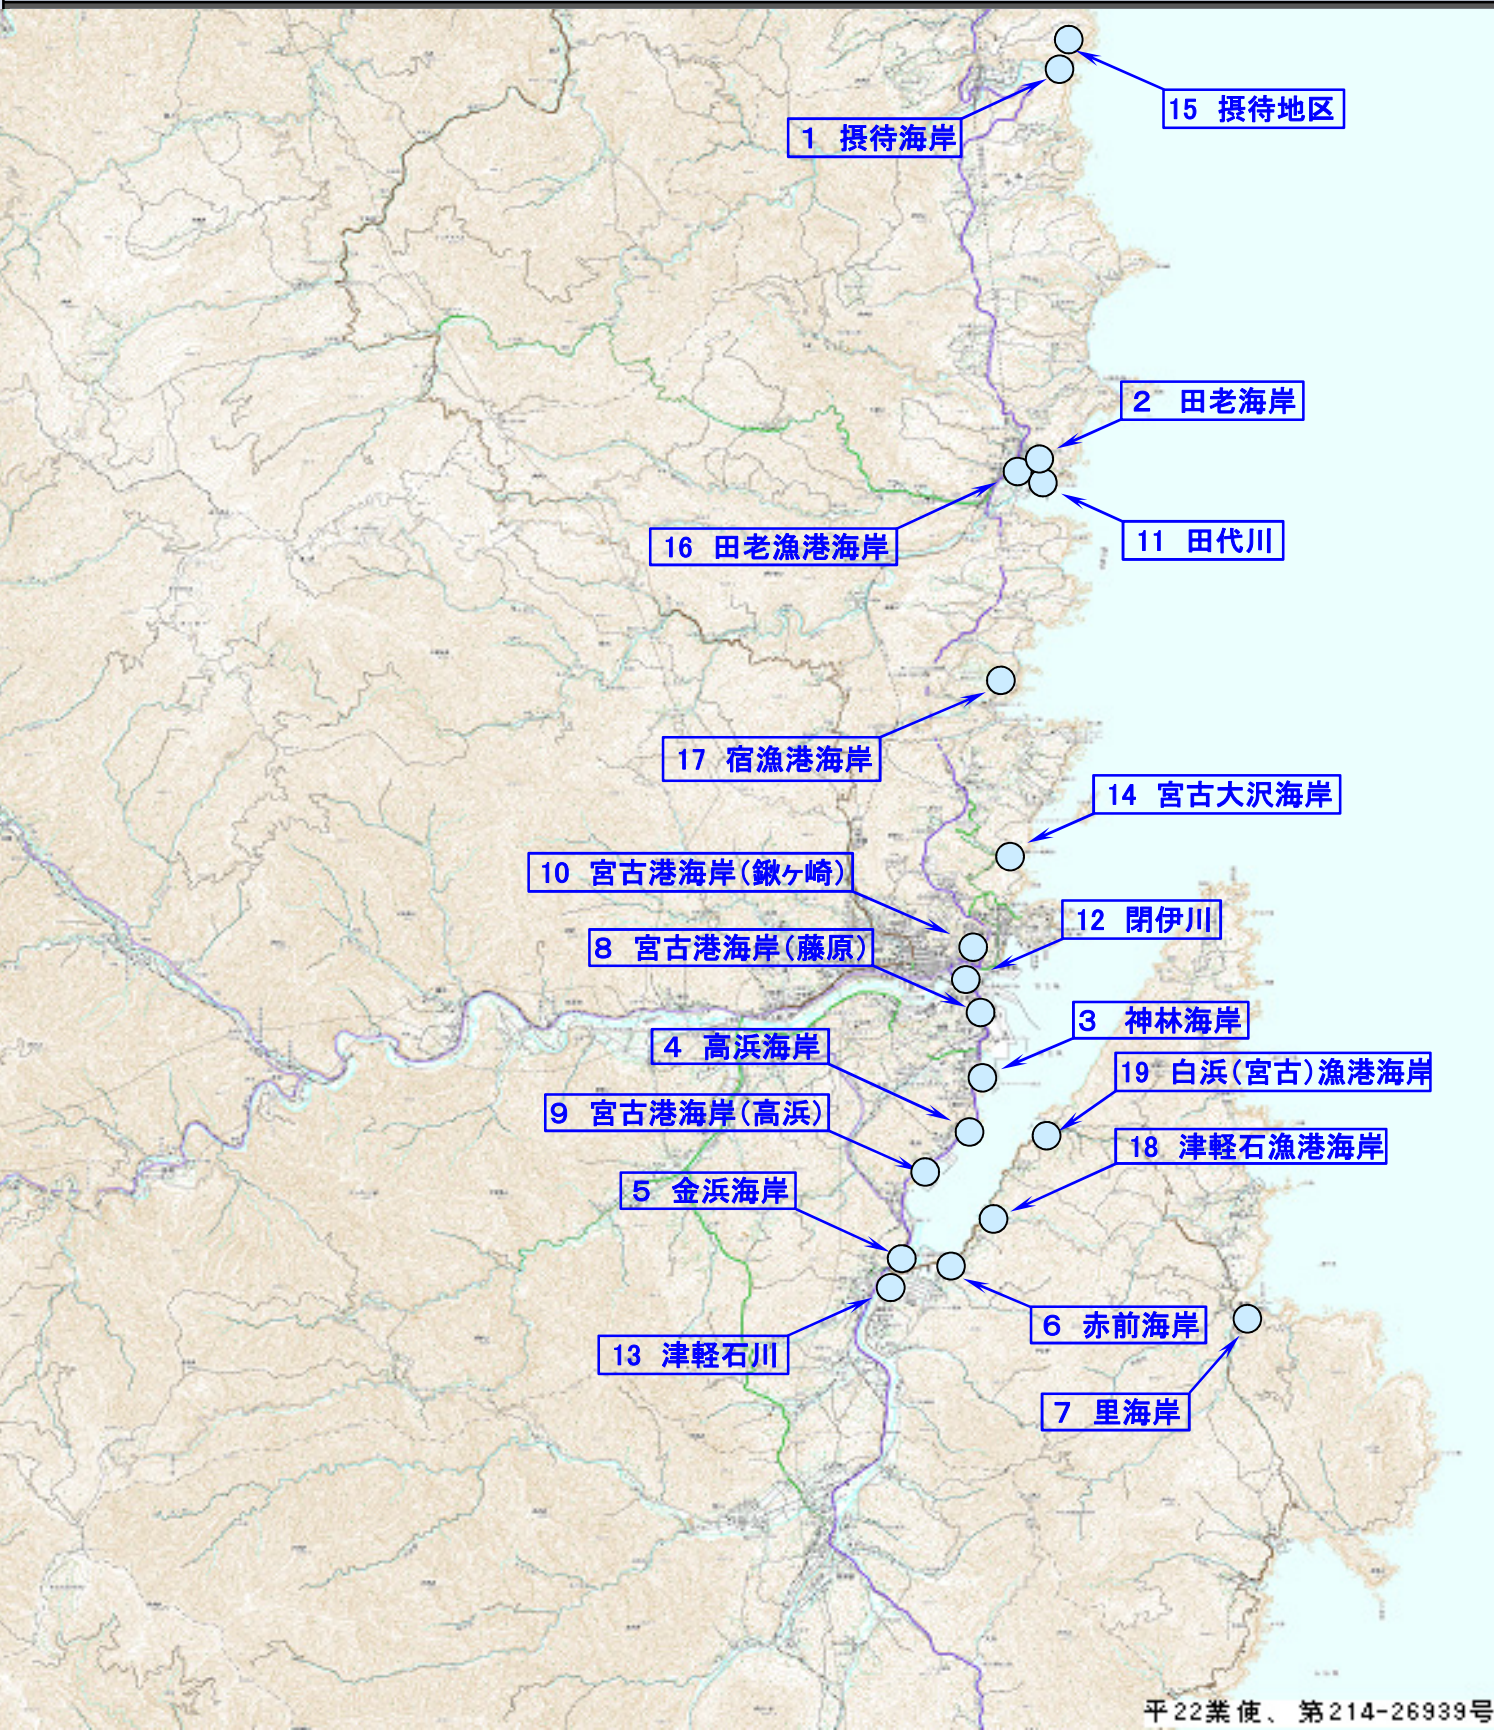

| 分野区分   | 細分項目等        | 事業主体 | 路線・箇所名等           | 事業概要   | 年度別整備スケジュール     |     |                 |     |                      |          |     |     |       |     |
|--------|--------------|------|-------------------|--|-----------------|-----|-----------------|-----|----------------------|----------|-----|-----|-------|-----|
|        |              |      |                   |  | 第1期<br>(基盤復興期間) |     | 第2期<br>(本格復興期間) |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |          |     |     | 国復興期間 |     |
|        |              |      |                   |  | H23             | H24 | H25             | H26 | H27                  | H28      | H29 | H30 | H31   | H32 |
| 海岸保全施設 | 一般海岸<br>港湾海岸 | 県    | 1 摂待海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.1km、<br>水門N=1基  | 用地、設計等          |     |                 |     |                      |          | ★工事 |     |       |     |
|        |              |      | 2 田老海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.0km、<br>水門等N=4基<br>(海岸危機)<br>水門等遠隔操作化<br>N=1基                         |                 |     |                 |     |                      | ■H29.3完成 |     |     |       |     |
|        |              |      | 3 神林海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門等N=7基<br>(海岸危機)<br>陸間等遠隔操作化<br>N=1基                         |                 |     |                 |     |                      | ■H29.3完成 |     |     |       |     |
|        |              |      | 4 高浜海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.0km、<br>陸間等N=4基<br>(港湾高潮)<br>防潮堤L=0.9km<br>(海岸危機)<br>陸間等遠隔操作化<br>N=4基 | 用地、設計等          |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 5 金浜海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.2km、<br>陸間等N=5基   |                 |     |                 |     |                      | ■H29.3完成 |     |     |       |     |
|        |              |      | 6 赤前海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.8km、<br>樋門N=1基  |                 |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 7 里海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>樋門N=1基  |                 |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 8 宮古港海岸<br>(藤原)   | (港湾高潮・災害)<br>防潮堤L=2.2km、<br>陸間N=4基   | 用地、設計等          |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 9 宮古港海岸<br>(高浜)   | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>陸間N=1基  |                 |     |                 |     |                      | ■H28.9完成 |     |     |       |     |
|        |              |      | 10 宮古港海岸<br>(鯨ヶ崎) | (港湾高潮)<br>防潮堤L=1.6km   | 用地、設計等          |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 11 田代川            | (災害復旧)<br>水門N=1基   | 用地、設計等          |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 12 閉伊川            | (災害復旧)<br>水門N=1基   | 用地、設計等          |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 13 津軽石川           | (三陸高潮)<br>防潮堤L=0.9km   |                 |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        | 農地海岸         |      | 14 宮古大沢海岸         | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.1km<br>水門等N=3基  |                 |     |                 |     |                      | ■H29.3完成 |     |     |       |     |
|        | 林野海岸         |      | 15 摂待地区           | (治山施設災害)<br>(防災林造成)<br>防潮林林帯(地盤)<br>L=0.3km  |                 |     | ■H26.7完成        |     |                      |          |     |     |       |     |
|        | 漁港海岸         | 市    | 16 田老<br>漁港海岸     | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.2km、<br>水門N=4基  | 用地、設計等          |     |                 |     |                      |          | ★工事 |     |       |     |
|        |              |      | 17 宿漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基  |                 |     |                 |     |                      | ■H29.6完成 |     |     |       |     |
|        |              |      | 18 津軽石<br>漁港海岸    | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門N=1基  | 用地、設計等          |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |
|        |              |      | 19 白浜(宮古)<br>漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基  | 用地、設計等          |     |                 |     |                      | ★工事      |     |     |       |     |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市2/4】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現




| 分野区分             | 細分項目等                                    | 事業主体                                       | 路線・箇所名等          | 事業概要                   | 年度別整備スケジュール   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     | 国復興期間 |
|------------------|--|--|------------------|------------------------|---|--------|--|--------------------------------|-----|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|
|                  |  |  |                  |                        | 第1期<br>（本格復興期間）   |        |  | 第2期<br>（本格復興期間）                |     |                  | 第3期<br>（更なる展開への連結期間） |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  |                        | H23   | H24    | H25                                      | H26                            | H27 | H28              | H29                  | H30 | H31 | H32 |       |
| 復興道路等            | 復興道路                                     | 国  | A 三陸沿岸道路         | 田老岩泉道路<br>（田老北～岩泉）     | ◆H25.3.27起工式 ★用地買収、工事等  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 宮古田老道路<br>（宮古中央～田老北）   | ◆H24.11.18起工式 ★用地買収、工事等<br>※田老第2IC～田老北IC H29供用予定、宮古中央IC～田老第2IC H32供用予定      |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 宮古道路<br>（宮古中央インター線）    | ■H25.3.23「宮古中央インター線（千徳大橋）」供用開始  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 山田宮古道路<br>（山田～宮古南）     | ◆H25.6.17起工式 ★用地買収、工事等  |        |  |                                |     | ■H29.11.19供用開始予定 |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  | B 宮古盛岡<br>横断道路   | 宮古箱石道路<br>（宮古～箱石）      | ◆H25.11.30起工式 ★用地買収、工事等 ※宮古市下川井地区 H31供用予定<br>宮古市藤原～松山IC、墓目～腰帯、川井～箱石 H32供用予定 |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 平津戸松草道路<br>（平津戸・岩井～松草） | ◆H26.8.24起工式 ★用地買収、工事等  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 区界道路<br>（区界～築川）        | ◆H26.8.24起工式 ★用地買収、工事等  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 宮古西道路                  | ★工事   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  | 復興支援助道                                   | 県  | C 国道340号         | 小国                     | ■H25.11.29供用開始  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 和井内道路                  | ★工事   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 立丸峠                    | ◆H26.3着工 ★工事  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  |                  | 押角峠                    | ◆H27.8着工 ★工事  |        |  |                                |     | ★工事              |                      |     |     |     |       |
|                  | 復興関連道路                                   |  | D（主）<br>重茂半島線    | 白浜～堀内                  | ■H27.3.31供用開始   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  | E 宮古市道<br>北部環状線  | 山口                     | ■H28.12.23供用開始  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  | F（一）<br>津軽石停車場線  | 津軽石                    | ◆H28.12着工 ★工事   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  |  | 復興まちづくり          | 土地区画整理                 | 市   | a 田老地区 | 区域面積：19.0ha<br>対象戸数：220戸<br>（民180戸・公40戸） | 民64戸 民116戸<br>公40戸<br>■H28.3完成 |     |                  |                      |     |     |     |       |
| b 鎌ヶ崎・<br>光岸地地区  | 区域面積：23.8ha<br>対象戸数：270戸<br>（民230戸・公40戸） | 用地、設計等 ★工事<br>民12戸 民141戸<br>公40戸 民60戸 民17戸 |                  |                        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| c 田老地区           | 対象戸数：230戸<br>（民159戸・公71戸）                | 民159戸<br>公71戸<br>■H27.9完成                  |                  |                        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| d 崎山地区<br>（大付）   | 対象戸数：30戸<br>（民6戸・公24戸）                   | 民6戸 公24戸<br>■H25.12完成                      |                  |                        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| e 高浜・金浜<br>地区    | 対象戸数：52戸<br>（民40戸・公12戸）                  | 民40戸<br>公12戸<br>■H28.3完成                   |                  |                        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| f 法之脇地区<br>（津軽石） | 対象戸数：12戸<br>（民12戸）                       | 民12戸<br>■H26.3完成                           |                  |                        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| g 赤前地区           | 対象戸数：46戸<br>（民46戸）                       | 民19戸 民23戸 民4戸<br>■H28.3完成                  |                  |                        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| h 津軽石地区          | 区域面積：約1.2ha                              | ■H29.2完成                                   |                  |                        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| 津波復興拠点           |  | i 中心市街地<br>地区                              |                  | 区域面積：約1.6ha            | 用地、設計等 ★工事  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | j 摂待地区                                     |                  | 対象戸数：3戸<br>（民3戸）       | 民3戸<br>■H25.7完成   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | k 小堀内地区                                    |                  | 対象戸数：2戸<br>（民2戸）       | 民2戸<br>■H26.3完成   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | l 浦の沢・<br>追切地区                             |                  | 対象戸数：2戸<br>（民2戸）       | 民2戸<br>■H25.3完成   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | m 音部地区                                     |                  | 対象戸数：3戸<br>（民3戸）       | 民3戸<br>■H26.7完成   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | n 重茂地区                                     |                  | 対象戸数：21戸<br>（民17戸・公4戸） | 民17戸 公4戸<br>■H27.3完成  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | o 千鶴地区                                     |                  | 対象戸数：3戸<br>（民3戸）       | 民3戸<br>■H25.12完成  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | p 女遊戸地区                                    |                  | 集落道他                   | 用地、設計等 ★工事  |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
| 漁業集落防災機能強化       |  | q 石浜地区                                     | 対象戸数：2戸<br>（民2戸） | 民2戸<br>■H26.7完成        |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |
|                  |  | r 田老野原地区                                   | 集落道、用地造成         | 用地、設計等 ★工事             |   |        |  |                                |     |                  |                      |     |     |     |       |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市3/4】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

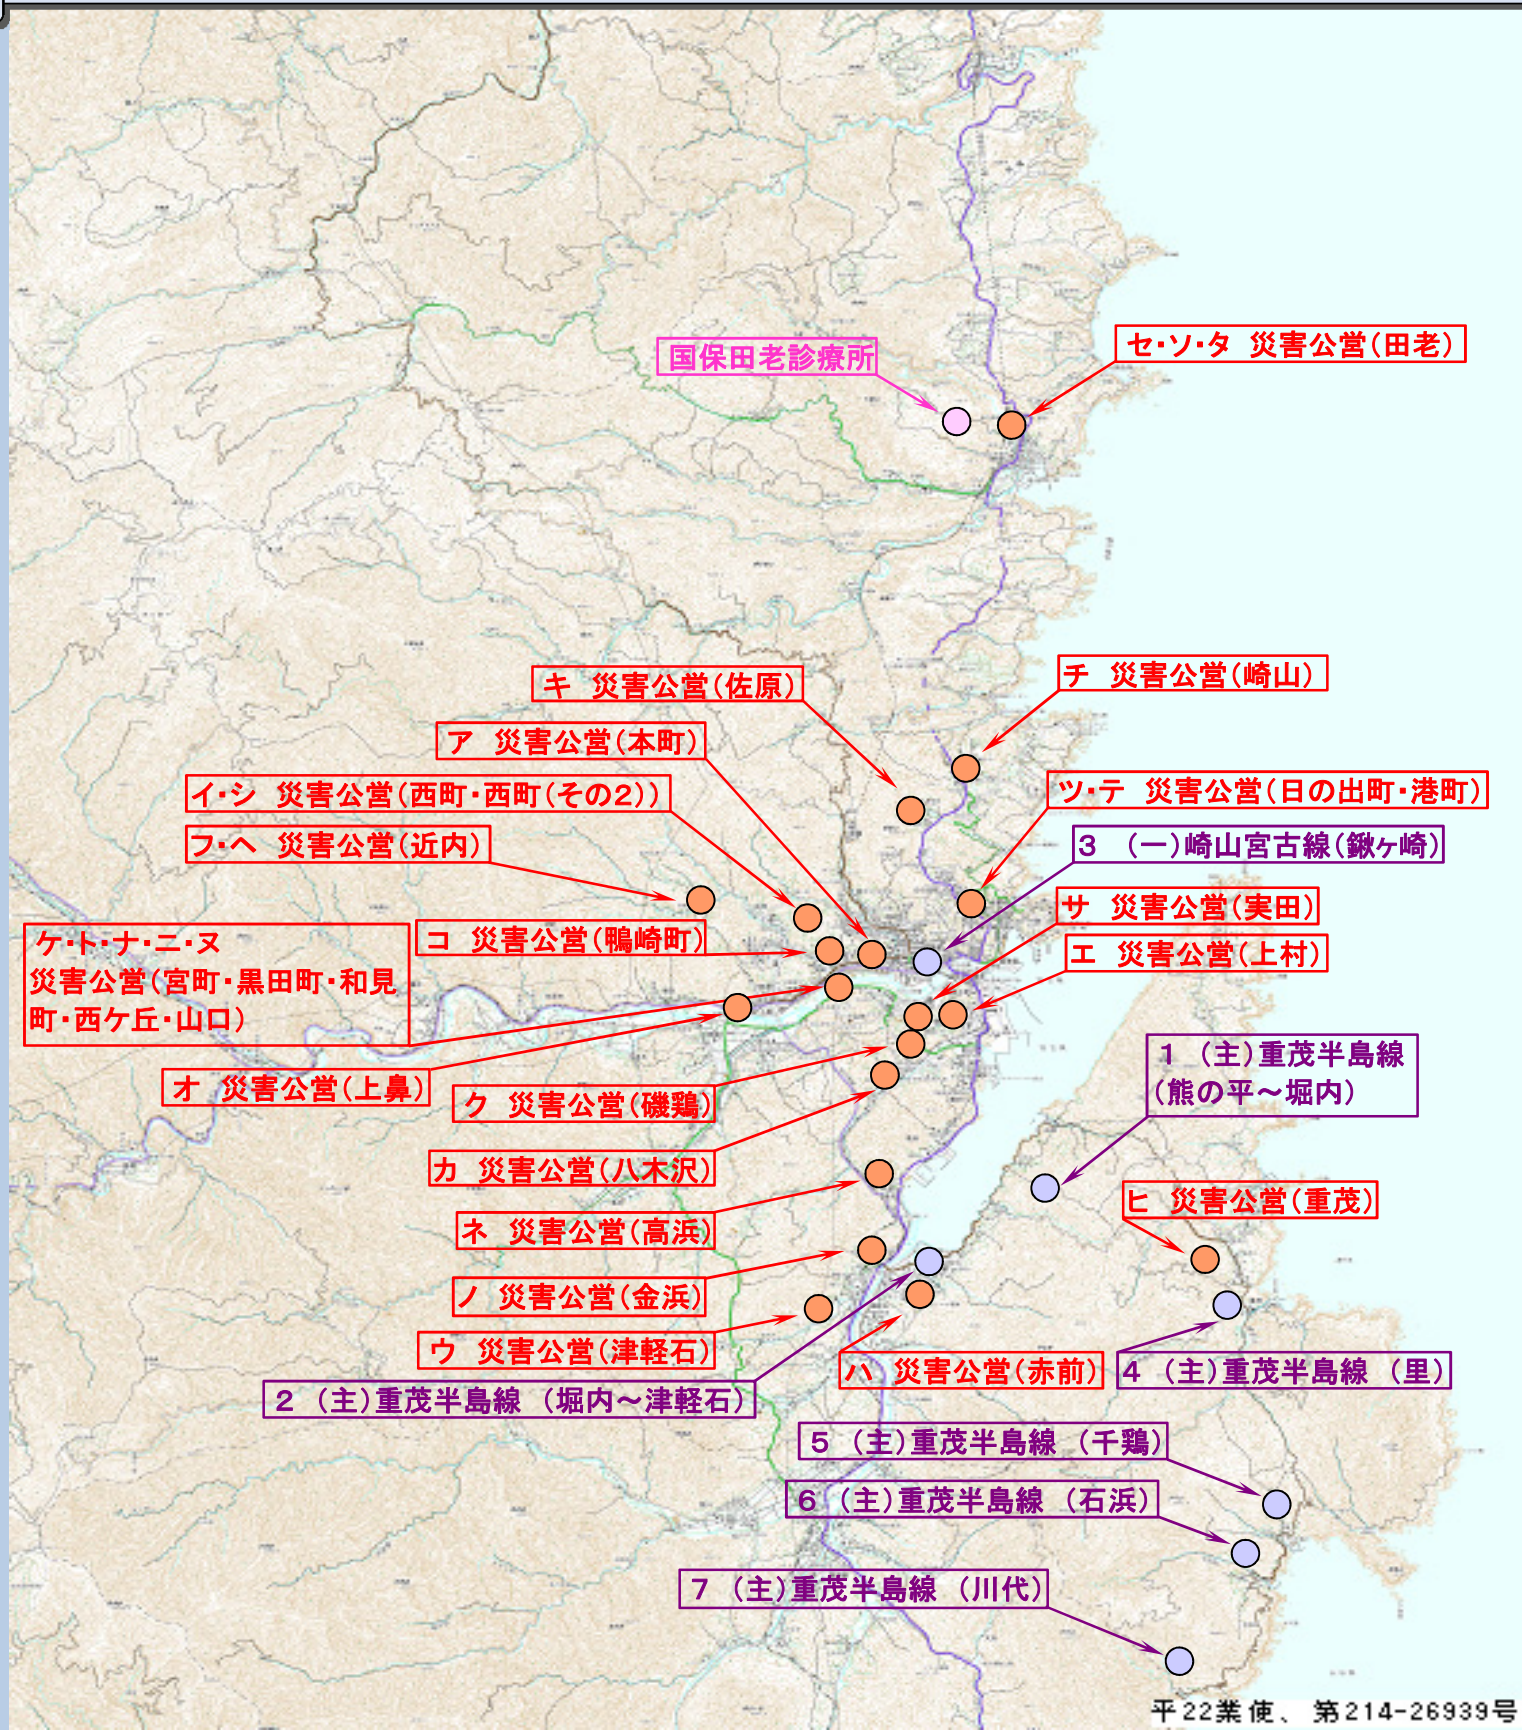


| 分野区分        | 細分項目等             | 事業主体                  | 路線・箇所名等              | 事業概要            | 年度別整備スケジュール     |               |                 |                  |                  |                  |                      |     |     |     | 国復興期間 |  |  |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|--|--|
|             |                   |                       |                      |                 | 第1期<br>(本格復興期間) |               |                 | 第2期<br>(本格復興期間)  |                  |                  | 第3期<br>(要なる展開への連結期間) |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       |                      |                 | H23             | H24           | H25             | H26              | H27              | H28              | H29                  | H30 | H31 | H32 |       |  |  |
| 復興<br>まちづくり | まちづくり<br>連携道路     | 県                     | 1 (主)重茂半島線           | 熊の平～堀内          |                 | ◆H27.10着工 ★工事 |                 |                  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | 2 (主)重茂半島線           | 堀内～津軽石          |                 | ◆H27.12着工 ★工事 |                 |                  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | 3 (一)崎山宮古線           | 鍛ヶ崎             |                 |               |                 |                  | ■H29.3.31供用開始    |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | 4 (主)重茂半島線           | 里               |                 | ◆H27.9着工 ★工事  |                 |                  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | 5 (主)重茂半島線           | 千鷲              |                 | ◆H27.8着工 ★工事  |                 |                  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | 6 (主)重茂半島線           | 石浜              |                 | ◆H28.10着工 ★工事 |                 |                  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | 7 (主)重茂半島線           | 川代              |                 | ◆H27.9着工 ★工事  |                 |                  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
| 災害公営<br>住宅  | 直接建設              | 県                     | ア 本町<br>(単独)         | RC造8階<br>戸数:34戸 |                 |               |                 |                  |                  | 34戸<br>■H27.9完成  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | イ 西町<br>(単独)         | RC造4階<br>戸数:23戸 |                 |               |                 |                  |                  | 23戸<br>■H27.6完成  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | ウ 津軽石<br>(単独)        | RC造5階<br>戸数:35戸 |                 |               |                 |                  |                  | 35戸<br>■H27.7完成  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | エ 上村<br>(単独)         | RC造4階<br>戸数:24戸 |                 |               |                 |                  |                  | 24戸<br>■H28.3完成  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | オ 上鼻<br>(単独)         | RC造4階<br>戸数:24戸 |                 |               |                 |                  |                  | 24戸<br>■H27.7完成  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | カ 八木沢<br>(単独)        | RC造5階<br>戸数:42戸 |                 |               |                 |                  |                  | 42戸<br>■H27.10完成 |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | キ 佐原<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:50戸 |                 |               |                 |                  | 50戸<br>■H27.2完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | ク 磯鷲<br>(単独)      |                       | S造2階<br>戸数:30戸       |                 |                 |               |                 | 30戸<br>■H27.3完成  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | ケ 宮町<br>(単独)      |                       | S造3階<br>戸数:20戸       |                 |                 |               |                 | 20戸<br>■H27.3完成  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | コ 鴨崎町<br>(単独)     |                       | S造3階<br>戸数:20戸       |                 |                 |               |                 |                  | 20戸<br>■H27.9完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | サ 実田<br>(単独)      |                       | S造3階<br>戸数:17戸       |                 |                 |               |                 |                  | 17戸<br>■H27.7完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | シ 西町(その2)<br>(単独) |                       | RC造5階<br>戸数:30戸      |                 |                 |               |                 |                  | 30戸<br>■H27.6完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | 敷地提案型<br>買取       |                       | セ 田老(高台)<br>(防:田老地区) | 木造<br>戸数:36戸    |                 |               |                 |                  |                  | 36戸<br>■H27.10完成 |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   |                       | ソ 田老<br>(区:田老地区)     | RC造5階<br>戸数:40戸 |                 |               |                 |                  |                  | 40戸<br>■H27.11完成 |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | タ 田老(高台Ⅱ)<br>(防:田老地区) | 木造<br>戸数:35戸         |                 |                 |               |                 |                  | 35戸<br>■H28.3完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | チ 崎山<br>(防:崎山地区)      | RC造4階<br>戸数:24戸      |                 |                 |               |                 | 24戸<br>■H27.3完成  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ツ 日の出町<br>(単独)        | 木造2階<br>戸数:26戸       |                 |                 |               |                 |                  | 26戸<br>■H27.4完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | テ 港町<br>(区:鍛ヶ崎地区)     | RC造5階<br>戸数:40戸      |                 |                 |               |                 |                  | 40戸<br>■H27.12完成 |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ト 黒田町<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:24戸      |                 |                 |               |                 |                  | 24戸<br>■H27.8完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ナ 和見町<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:23戸      |                 |                 |               |                 | 23戸<br>■H27.3完成  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ニ 西ヶ丘<br>(単独)         | RC造4階<br>戸数:24戸      |                 |                 |               |                 |                  | 24戸<br>■H27.4完成  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ヌ 山口<br>(単独)          | RC造4階<br>戸数:23戸      |                 |                 |               |                 |                  |                  | 23戸<br>■H29.1完成  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ネ 高浜<br>(単独)          | 木造2階<br>戸数:12戸       |                 |                 |               |                 | 12戸<br>■H26.4完成  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ノ 金浜<br>(防:金浜地区)      | 木造2階<br>戸数:12戸       |                 |                 |               |                 |                  | 12戸<br>■H27.11完成 |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ハ 赤前<br>(単独)          | 木造2階<br>戸数:14戸       |                 |                 |               |                 | 14戸<br>■H26.11完成 |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ヒ 重茂<br>(漁:重茂地区)      | 木造<br>戸数:4戸          |                 |                 |               |                 |                  | 4戸<br>■H27.6完成   |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | 買取                | フ 近内①<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:40戸      |                 |                 |               | 40戸<br>■H26.3完成 |                  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             |                   | ヘ 近内②<br>(単独)         | RC造5階<br>戸数:40戸      |                 |                 |               |                 | 40戸<br>■H27.3完成  |                  |                  |                      |     |     |     |       |  |  |
|             | 医療                | 医科診療所                 | 市                    | 国保田老診療所         | 診療所施設整備         |               |                 |                  |                  |                  | ■H28.8完成             |     |     |     |       |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市4/4】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

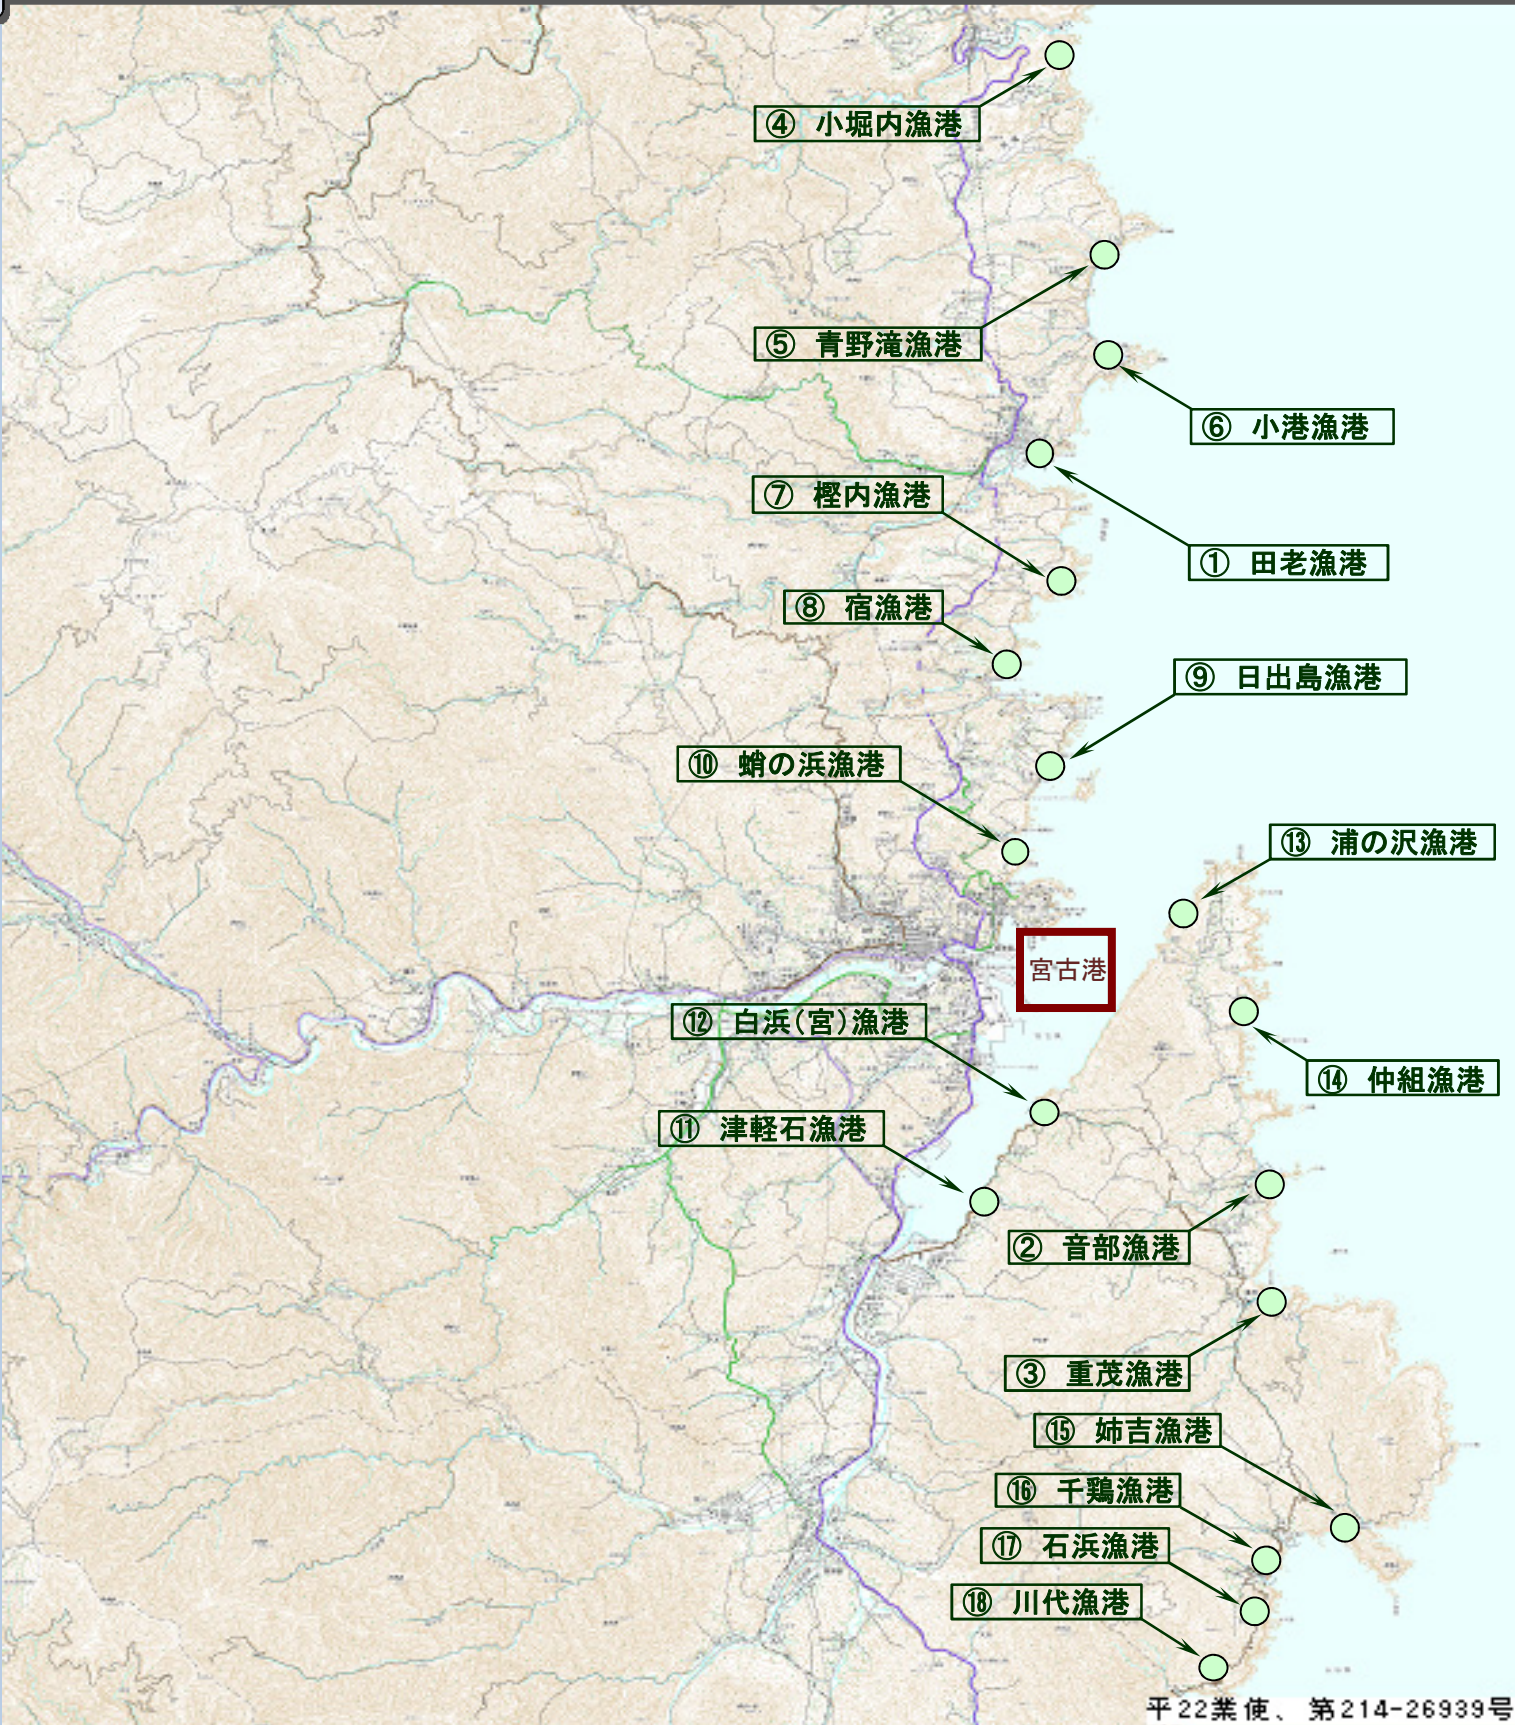


| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等   | 事業概要  | 年度別整備スケジュール     |     |           |                 |          |          |                      |  |     |  | 国復興期間 |  |     |
|------|-------|------|-----------|---|-----------------|-----|-----------|-----------------|----------|----------|----------------------|--|-----|--|-------|--|-----|
|      |       |      |           |   | 第1期<br>(基盤復興期間) |     |           | 第2期<br>(本格復興期間) |          |          | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      |           |   | H23             | H24 | H25       | H26             | H27      | H28      | H29                  |  | H30 |  |       |  | H31 |
| 漁 港  | 漁 港   | 県    | ① 田老漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=689m、<br>岸壁L=1,133m 他  |                 |     |           |                 | ■H27.9完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ② 音部漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=352m、<br>岸壁L=206m 他  |                 |     |           | ■H26.12完成       |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ③ 重茂漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=373m、<br>岸壁L=663m 他  |                 |     |           | ■H26.12完成       |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       | 市    | ④ 小堀内漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=121m、<br>岸壁L=127m 他  |                 |     |           | ■H27.3完成        |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑤ 青野滝漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=46m 他  |                 |     | ■H25.10完成 |                 |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑥ 小港漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=139m 他   |                 |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑦ 榎内漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=72m、<br>岸壁L=52m 他  |                 |     | ■H25.10完成 |                 |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑧ 宿漁港     | (漁港災害)<br>防波堤L=85m、<br>岸壁L=215m 他   |                 |     |           |                 |          | ■H29.3完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑨ 日出島漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=526m、<br>岸壁L=320m 他  |                 |     |           |                 |          | ■H29.3完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑩ 蛸の浜漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=260m 他   |                 |     |           |                 |          | ■H29.3完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑪ 津軽石漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=196m、<br>岸壁L=50m 他   |                 |     |           | ■H26.12完成       |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑫ 白浜(宮)漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=110m、<br>岸壁L=200m 他  |                 |     |           | ■H27.3完成        |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑬ 浦の沢漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=139m、<br>岸壁L=101m 他  |                 |     |           |                 |          | ■H28.9完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑭ 仲組漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=157m、<br>岸壁L=145m 他  |                 |     |           | ■H26.12完成       |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑮ 姉吉漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=86m、<br>岸壁L=40m 他  |                 |     |           |                 |          | ■H28.9完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑯ 千鷲漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=428m、<br>岸壁L=260m 他  |                 |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑰ 石浜漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=345m、<br>岸壁L=100m 他  |                 |     | ■H26.1完成  |                 |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑱ 川代漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=73m、<br>岸壁L=45m 他  |                 |     |           | ■H27.3完成        |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
| 港 湾  | 宮古港   | 国    | 竜神崎防波堤    | (防波堤整備・直轄災害復旧)防波堤L=400m   | ★工事(29年度完成予定)   |     |           |                 |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       | 県    | 出崎地区      | (災害復旧)<br>出崎防波堤(2)L=20m   |                 |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 鉾ヶ崎地区     | (災害復旧)<br>閉伊川<br>-1.5m物揚場L=295m、<br>-3.0m物揚場L=728m                          | 用地、設計等          |     |           | ★工事             |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 日立浜地区     | (災害復旧)<br>-4.5m岸壁L=240m、<br>-2.0m物揚場L=101m、<br>船揚場(1)L=228m、<br>船揚場(2)L=84m |                 |     |           |                 | ■H29.3完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 高浜地区      | (災害復旧)<br>防波堤(北)L=250.2m、<br>防波堤(南)L=200m、<br>-2.0m物揚場(1)、<br>(2)L=200m他    |                 |     |           | ■H27.3完成        |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 藤原地区      | (災害復旧)<br>船揚場L=50m、埠頭保安<br>設備L=1,250m                                       |                 |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 神林地区      | (災害復旧)<br>南防波堤L=112m、<br>防波堤L=31m、-2.0m物<br>揚場L=181m 他                      |                 |     |           |                 | ■H29.3完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 浄土ヶ浜地区    | (災害復旧)<br>防波堤L=89m、<br>-2.0m物揚場L=44m、<br>さん橋L=70m                           |                 |     | ■H25.7完成  |                 |          |          |                      |  |     |  |       |  |     |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

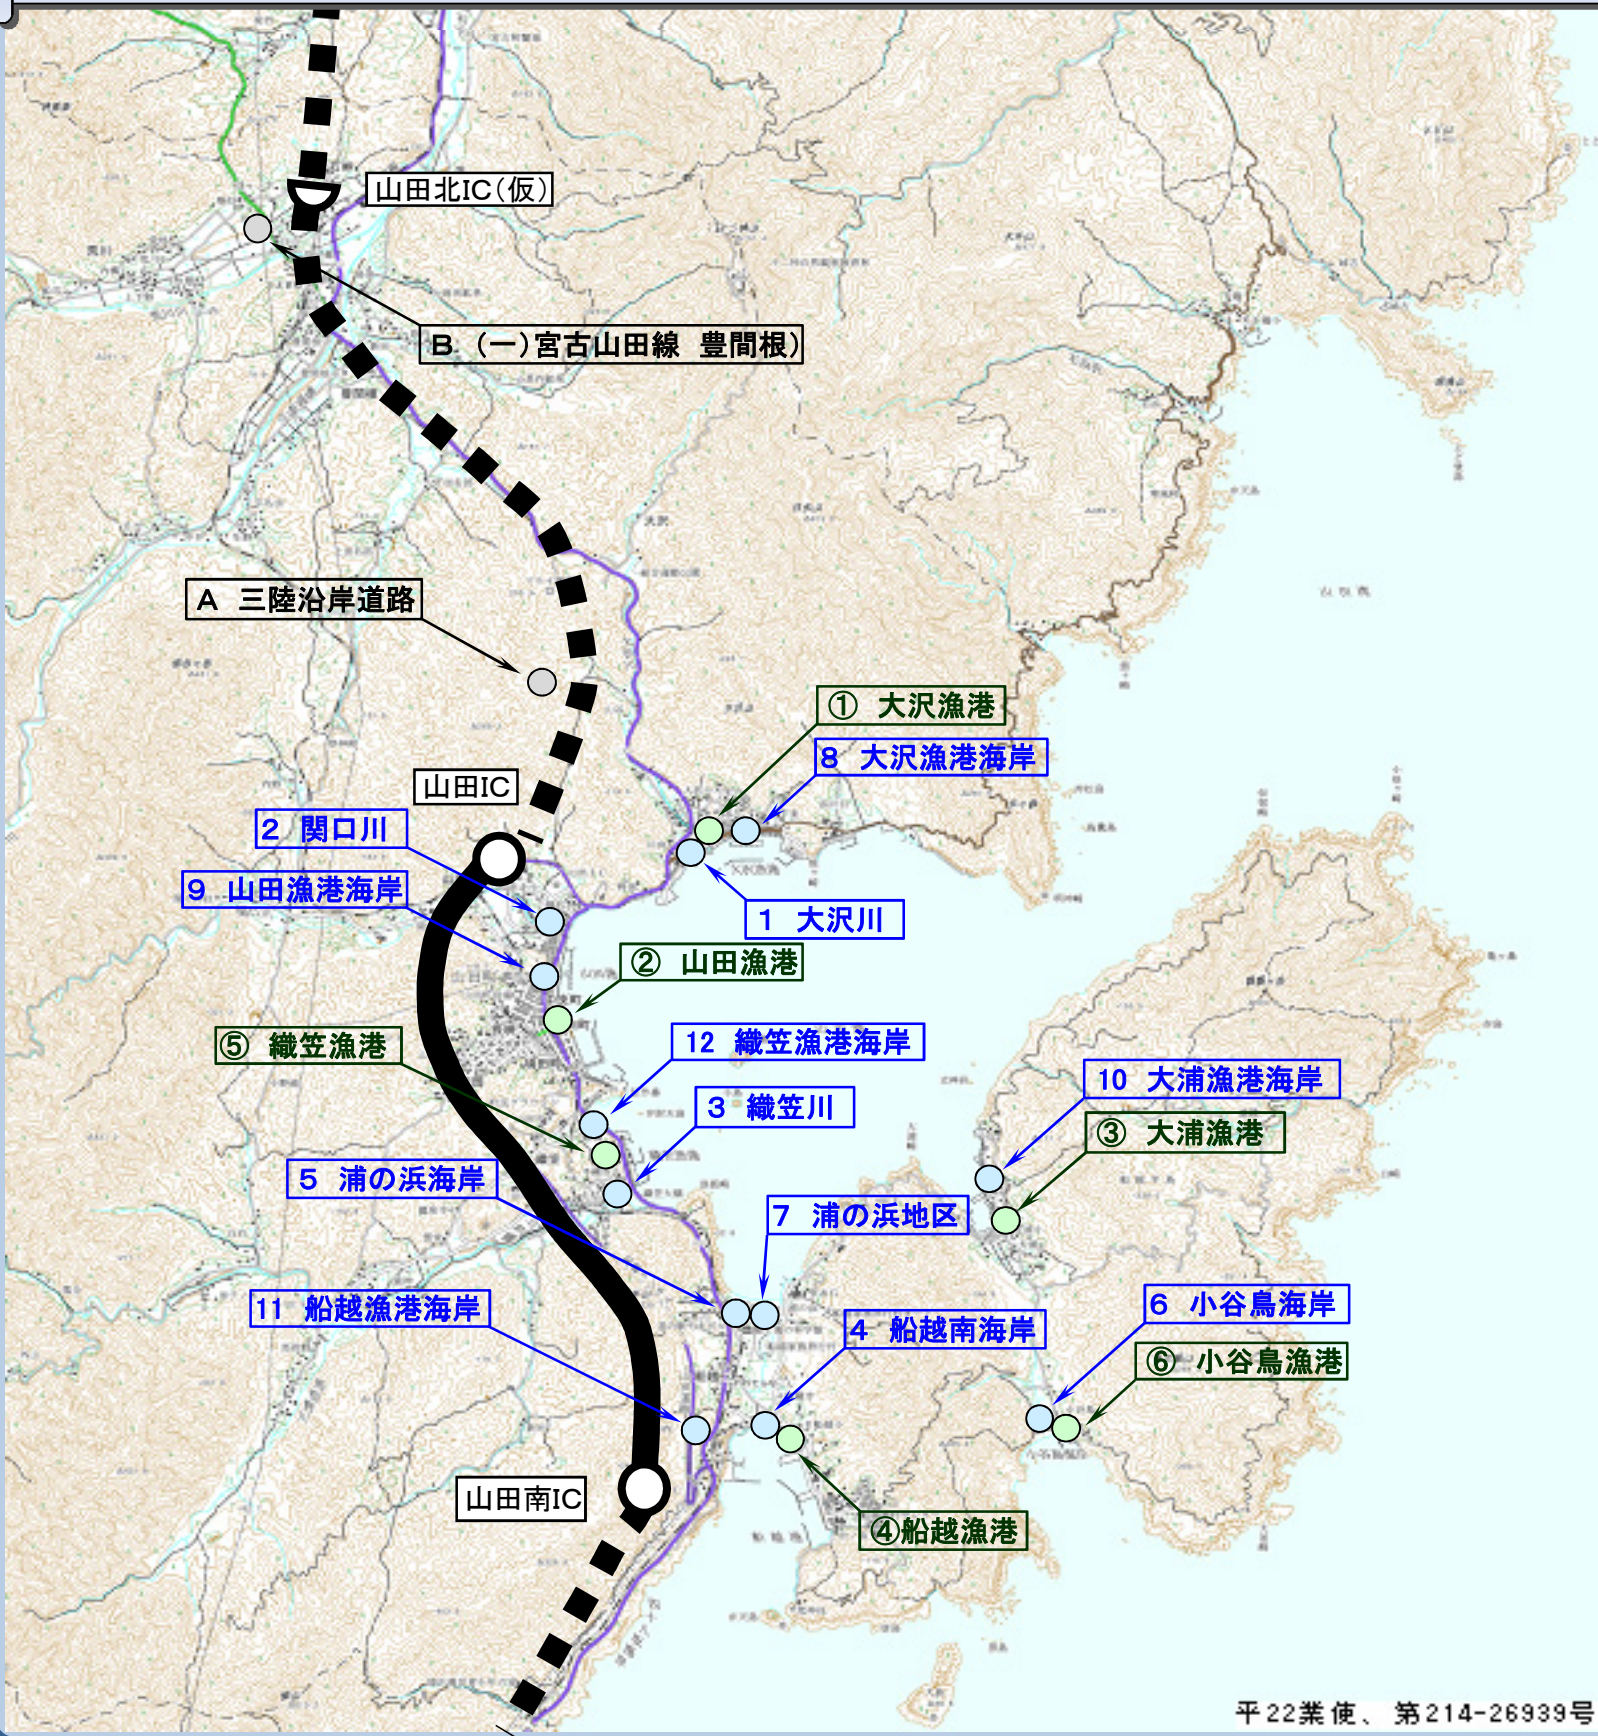


| 分野区分   | 細分項目等     | 事業主体                            | 路線・箇所名等            | 事業概要                                   | 年度別整備スケジュール     |   |           |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|--------|-----------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------|---|-----------|-----------------|----------|-----|----------------------|------------------|------------------|-------|--|--|
|        |           |                                 |                    |  | 第1期<br>(基盤復興期間) |   |           | 第2期<br>(本格復興期間) |          |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |                  |                  | 国復興期間 |  |  |
|        |           |                                 |                    |  | H23             | H24   | H25       | H26             | H27      | H28 | H29                  | H30              | H31              | H32   |  |  |
| 海岸保全施設 | 一般海岸      | 県                               | 1 大沢川              | (三陸高潮)<br>水門N=1基                       | 用地、設計等          |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 2 関口川              | (三陸高潮)<br>水門N=1基                       |                 |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 3 織笠川              | (三陸高潮)<br>水門N=1基                       |                 |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 4 船越南海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km                   | 用地、設計等          |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        | 農地海岸      |                                 | 5 浦の浜海岸            | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.6km<br>水門等N=1基    |                 |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 6 小谷島海岸            | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.4km<br>水門等N=3基    |                 |   | ■H29.3完成  |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        | 林野海岸      |                                 | 7 浦の浜地区            | (治山施設災害)<br>防潮堤L=0.4km                 | ■H25.3完成        |   |           |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        | 漁港海岸      |                                 | 8-1 大沢漁港海岸         | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.4km、<br>水門N=6基        | 用地、設計等          |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 8-2 大沢<br>(熊ヶ崎地区他) | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=1基        |                 |   | 用地、設計等    |                 | ★工事      |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 9-1 山田漁港海岸         | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.6km、<br>水門N=1基        | 用地、設計等          |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 9-2 山田<br>(柳沢地区)   | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門N=1基        |                 |   | 用地、設計等    |                 | ★工事      |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 10 大浦漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.7km、<br>水門N=4基        | 用地、設計等          |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 11 船越漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.5km、<br>水門N=6基        | 用地、設計等          |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
| 町      | 12 織笠漁港海岸 | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.4km、<br>水門N=1基 | 用地、設計等             |  | ★工事             |   |           |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        | 復興道路等     | 国                               | A 三陸沿岸道路           | 山田宮古道路<br>(山田～宮古南)                     | ◆H25.6.17起工式    |   | ★用地買収、工事等 |                 |          |     |                      | ■H29.11.19供用開始予定 |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | 釜石山田道路             | ★用地買収、工事等                              |                 | ※釜石JCT～釜石南IC、大槌IC～山田南IC H30供用予定<br>釜石北IC～大槌IC H31供用予定 |           |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
| 復興支援道路 | 県         | B (一)<br>宮古山田線                  | 豊間根                |  |                 | ◆H27.3着工  |           | ★工事             |          |     |                      |                  | ■H29.11.19供用開始予定 |       |  |  |
|        |           |                                 |                    |  |                 |   |           |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
| 漁港     | 漁港        | 県                               | ① 大沢漁港             | (漁港災害)<br>防波堤L=1,360m、<br>岸壁L=1,417m 他 | ■H27.3完成        |   |           |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | ② 山田漁港             | (漁港災害)<br>防波堤L=913m、<br>岸壁L=2,376m 他   |                 |   |           |                 | ■H29.3完成 |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | ③ 大浦漁港             | (漁港災害)<br>防波堤L=424m、<br>岸壁L=1,286m 他   |                 |   | ■H28.3完成  |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | ④ 船越漁港             | (漁港災害)<br>防波堤L=1,398m、<br>岸壁L=2,346m 他 |                 |   |           |                 | ■H29.3完成 |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           | 町                               | ⑤ 織笠漁港             | (漁港災害)<br>防波堤L=628m、<br>岸壁L=675m 他     |                 |   | ■H28.3完成  |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |
|        |           |                                 | ⑥ 小谷島漁港            | (漁港災害)<br>防波堤L=348m、<br>岸壁L=176m 他     |                 |   | ★工事       |                 |          |     |                      |                  |                  |       |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

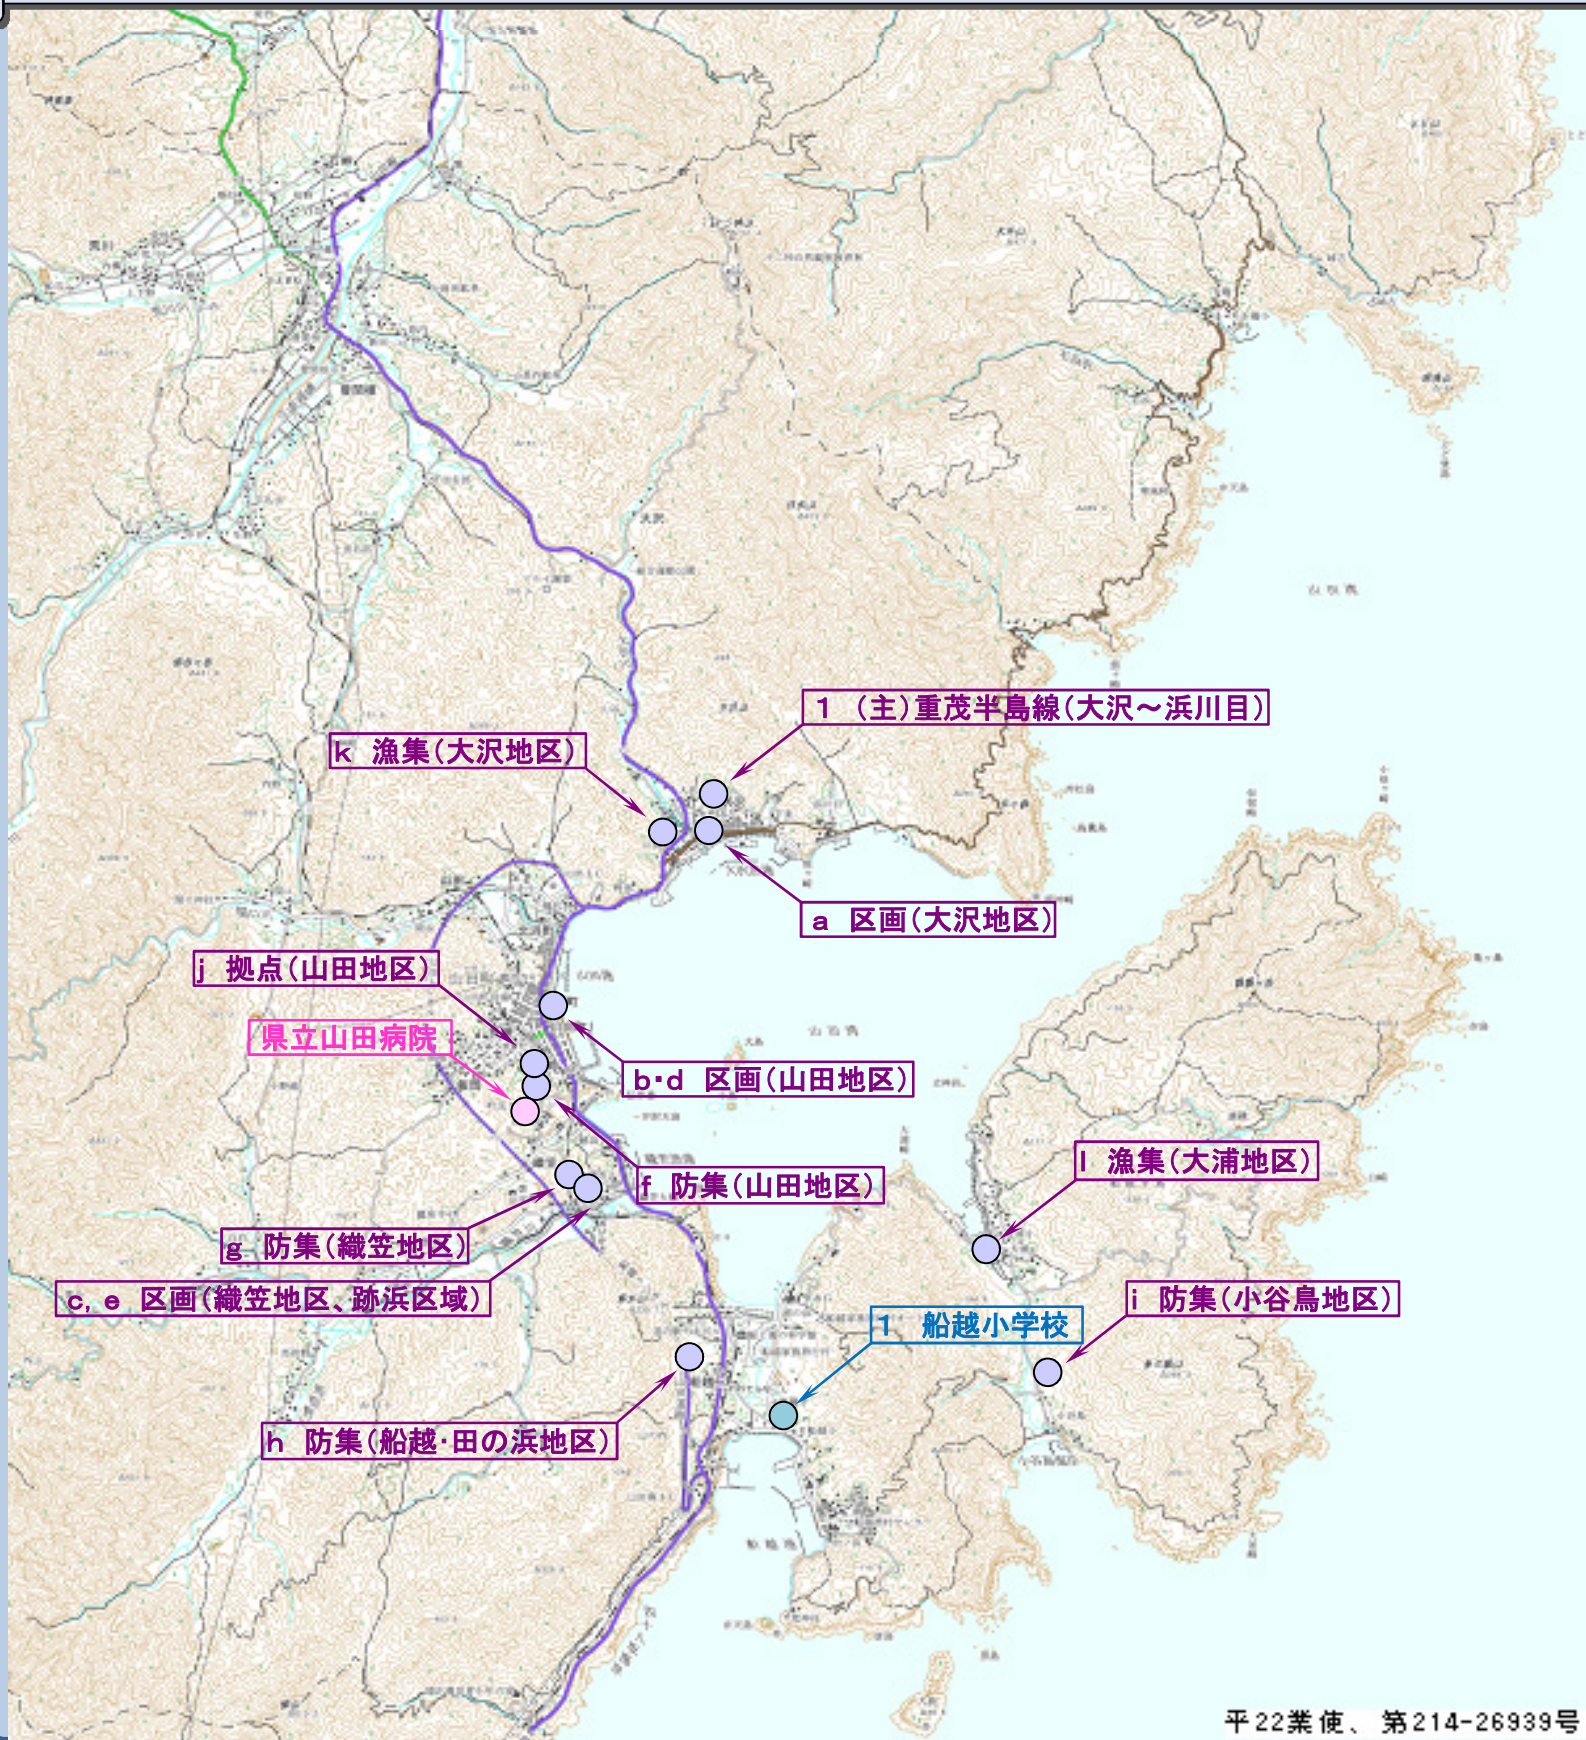

平22業使、第214-26939号


| 分野区分          | 細分項目等                   | 事業主体      | 路線・箇所名等           | 事業概要                                      | 年度別整備スケジュール              |     |     |                 |              |          |                      |          |      |              |  |  |  |
|---------------|-------------------------|-----------|-------------------|---|--------------------------|-----|-----|-----------------|--------------|----------|----------------------|----------|------|--------------|--|--|--|
|               |                         |           |                   |   | 第1期<br>（基盤復興期間）          |     |     | 第2期<br>（本格復興期間） |              |          | 第3期<br>（更なる展開への連結期間） |          |      | 国復興期間        |  |  |  |
|               |                         |           |                   |   | H23                      | H24 | H25 | H26             | H27          | H28      | H29                  | H30      | H31  | H32          |  |  |  |
| 復興<br>まちづくり   | 土地区画整理                  | 町         | a 大沢地区            | 区域面積：6.5ha<br>対象戸数：139戸<br>（民139戸）        |                          |     |     |                 | 民14戸         | 民125戸    | ■H28.10完成            |          |      |              |  |  |  |
|               |                         |           | b 山田地区            | 区域面積：20.4ha<br>対象戸数：619戸<br>（民473戸・公146戸） | 用地、設計等                   |     |     |                 |              | 公146戸    |                      | 民256戸    |      | 民217戸        |  |  |  |
|               |                         |           | c 織笠地区            | 区域面積：2.5ha<br>対象戸数：47戸<br>（民47戸）          |                          |     |     |                 |              | 民47戸     | ■H28.5完成             |          |      |              |  |  |  |
|               |                         |           | d 山田<br>国道45号周辺地区 | 区域面積：19.8ha                               | 用地、設計等                   |     |     |                 |              |          | ★工事                  |          |      |              |  |  |  |
|               |                         |           | e 織笠地区<br>（跡浜区域）  | 区域面積：2.5ha                                |                          |     |     |                 |              | 用地、設計等   |                      | ★工事      |      |              |  |  |  |
|               | 津波復興拠点                  |           | f 山田地区            | 対象戸数：139戸<br>（民93戸・公46戸）                  | 用地、設計等                   |     |     |                 |              | 民63戸     |                      |          |      | 公46戸<br>民30戸 |  |  |  |
|               |                         |           | g 織笠地区            | 対象戸数：170戸<br>（民148戸・公22戸）                 |                          |     |     | 民60戸            | 民73戸<br>公22戸 | 民15戸     | ■H28.5完成             |          |      |              |  |  |  |
|               |                         |           | h 船越・<br>田の浜地区    | 対象戸数：210戸<br>（民144戸・公66戸）                 |                          |     |     |                 | 民59戸         | 民85戸     | ■H28.8完成             |          | 公66戸 |              |  |  |  |
|               |                         |           | i 小谷鳥地区           | 対象戸数：4戸<br>（民4戸）                          |                          |     |     | 民4戸             | ■H26.9完成     |          |                      |          |      |              |  |  |  |
|               |                         |           | 漁業集落防災<br>機能強化    | j 山田地区                                    | （中心市街地エリア）<br>区域面積：3.1ha |     |     |                 |              |          | ■H29.3完成             |          |      |              |  |  |  |
|               | （公共防災エリア）<br>区域面積：3.7ha |           |                   |   | 用地、設計等                   |     |     |                 |              |          | ★工事                  |          |      |              |  |  |  |
|               | k 大沢地区                  |           |                   | 対象戸数：151戸<br>（民136戸・公15戸）                 |                          |     |     |                 |              | 民34戸     | 民102戸<br>公15戸        | ■H28.8完成 |      |              |  |  |  |
|               | l 大浦地区                  |           | 対象戸数：8戸<br>（民8戸）  |   |                          |     |     | 民3戸             | 民5戸          | ■H27.6完成 |                      |          |      |              |  |  |  |
| まちづくり<br>連携道路 | 県                       | 1（主）重茂半島線 | 大沢～浜川目            |   | ◆H26.12着工                |     |     | ★工事             |              |          |                      |          |      |              |  |  |  |
| 医 療           | 病院                      | 県         | 県立山田病院            | 病院（RC造）                                   |                          |     |     |                 |              |          | ■H28.7完成             |          |      |              |  |  |  |
| 教 育           | 小学校                     | 町         | 1 船越小学校           | （災害復旧）<br>移転                              | ■H26.3完成                 |     |     |                 |              |          |                      |          |      |              |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

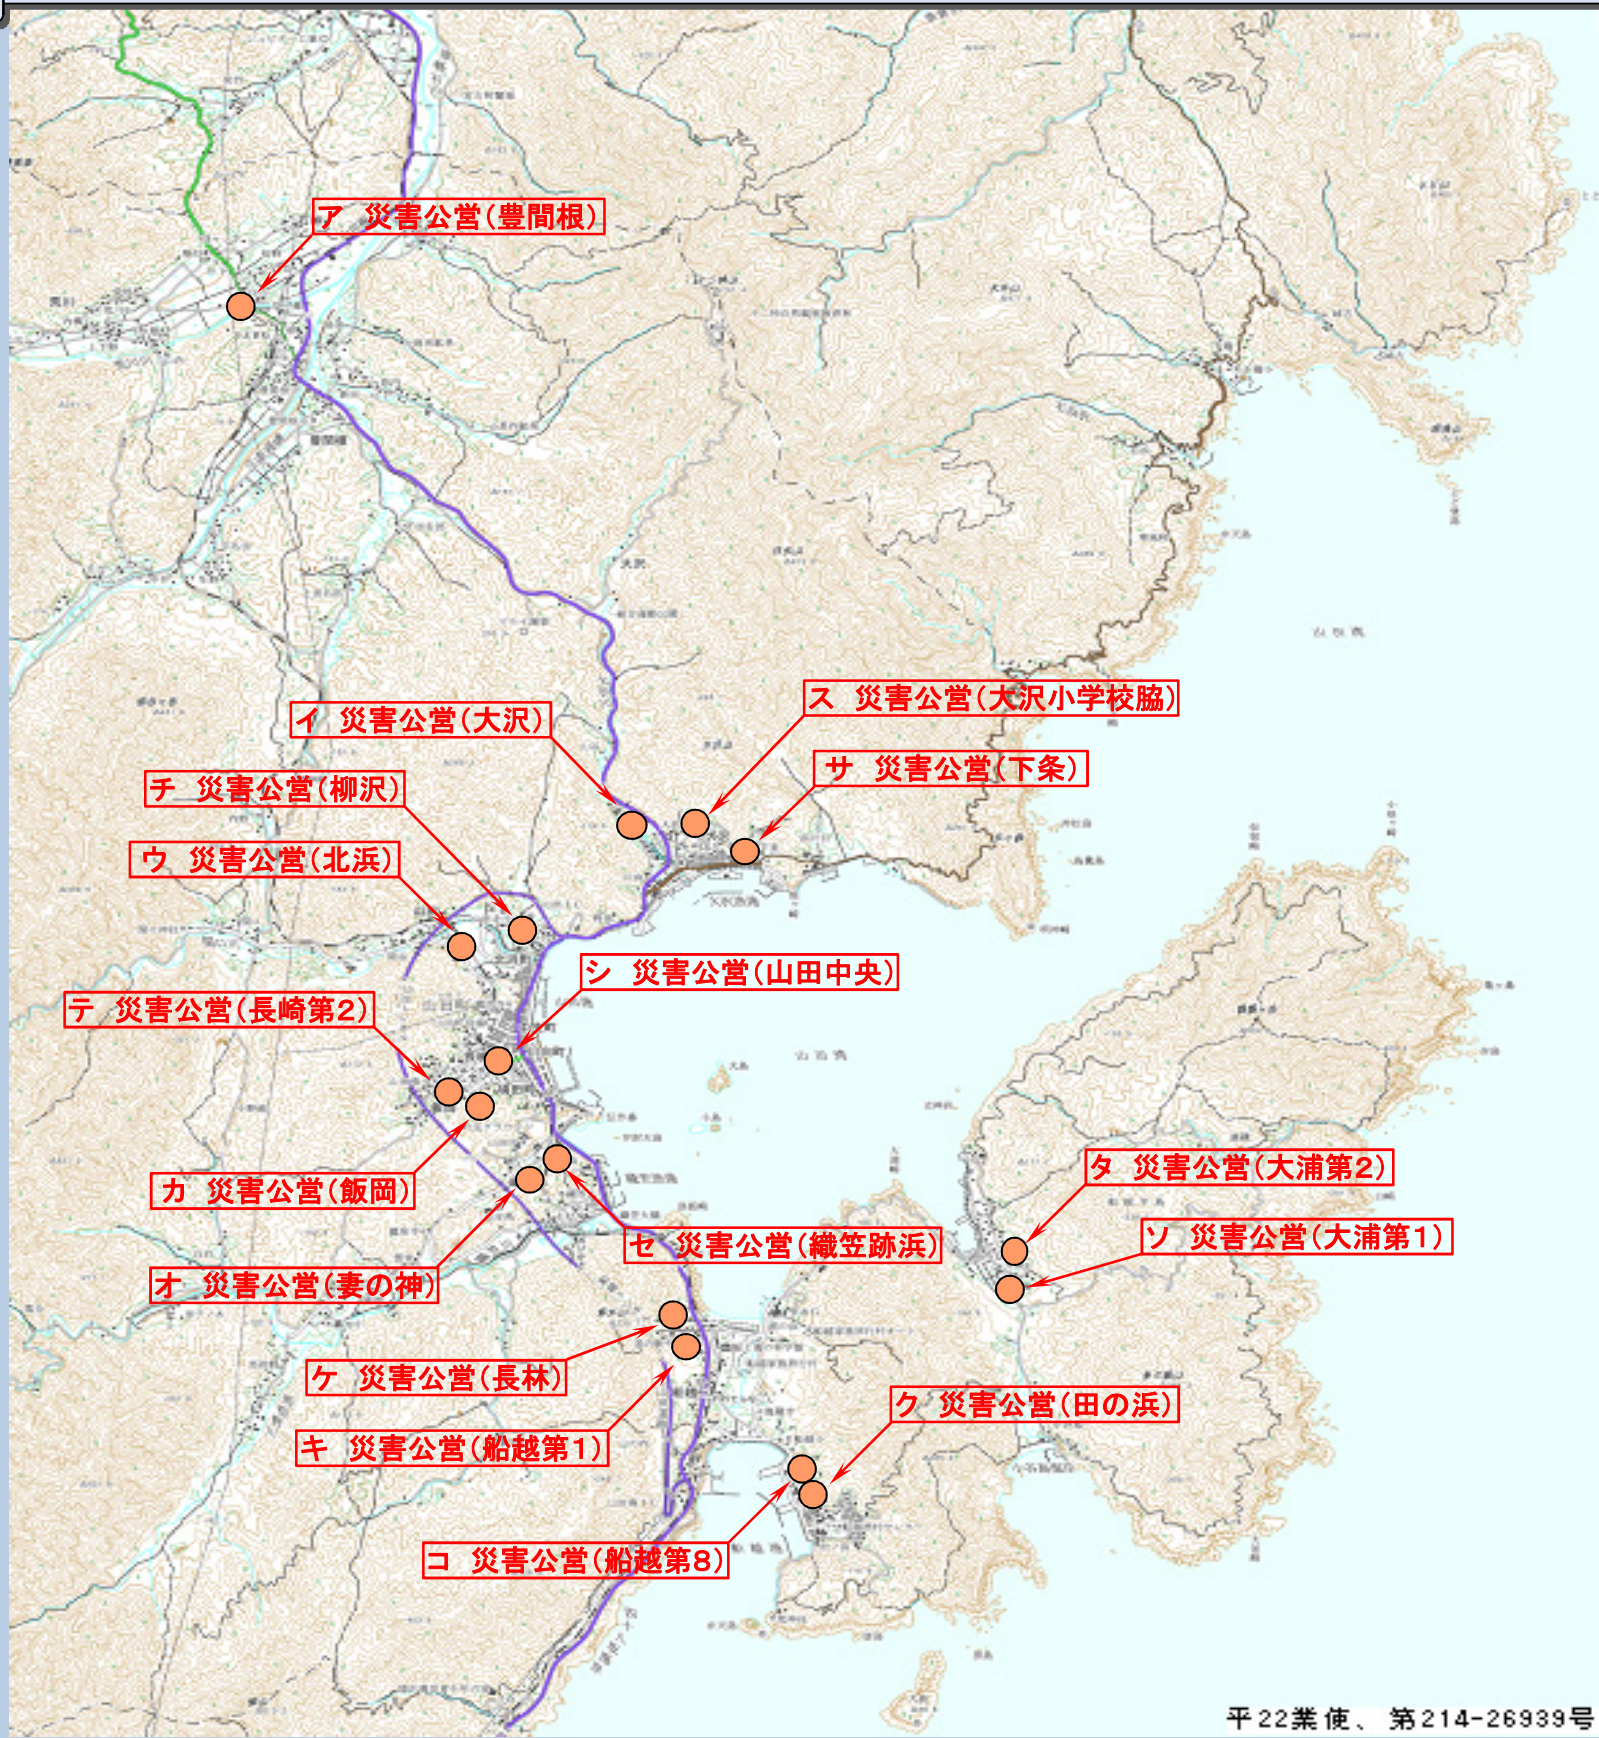


| 分野区分   | 細分項目等            | 事業主体           | 路線・箇所名等                | 事業概要             | 年度別整備スケジュール     |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     |      | 国復興期間 |  |
|--------|------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|--|
|        |                  |                |                        |                  | 第1期<br>(基盤復興期間) |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |     |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |     |     |      |       |  |
|        |                  |                |                        |                  | H23             | H24 | H25 | H26             | H27 | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32 |     |      |       |  |
| 災害公営住宅 | 直接建設             | 県              | ア 豊間根<br>(単独)          | S造3階<br>戸数:72戸   |                 |     |     | 72戸             |     |     |                      |     |     |     |     |      |       |  |
|        |                  |                | イ 大沢<br>(単独)           | RC造5階<br>戸数:35戸  |                 |     |     |                 | 35戸 |     |                      |     |     |     |     |      |       |  |
|        |                  |                | ウ 北浜<br>(単独)           | RC造4階<br>戸数:72戸  |                 |     |     |                 |     | 72戸 |                      |     |     |     |     |      |       |  |
|        |                  | 設計・施工一括選定      | 県                      | オ 妻の神<br>(単独)    | RC造4階<br>戸数:52戸 |     |     |                 |     | 52戸 |                      |     |     |     |     |      |       |  |
|        | 買取               | 町              | カ 飯岡<br>(防:山田地区)       | 戸数:46戸           |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 46戸  |       |  |
|        | 直接建設             | 町<br>(県建設分)    | キ 船越第1<br>(防:船越・田の浜地区) | RC造3階<br>戸数:21戸  |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     | 21戸 |      |       |  |
|        |                  |                | ク 田の浜<br>(防:船越・田の浜地区)  | RC造3階<br>戸数:18戸  |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 18戸  |       |  |
|        |                  |                | ケ 長林<br>(防:船越・田の浜地区)   | 木造<br>戸数:16戸     |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 16戸  |       |  |
|        |                  | 買取             | コ 船越第8<br>(防:船越・田の浜地区) | 木造<br>戸数:11戸     |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 11戸  |       |  |
|        |                  |                | サ 下条団地<br>(単独)         | 木造<br>戸数:8戸      |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 8戸   |       |  |
|        |                  |                | シ 山田中央<br>(区:山田地区)     | RC造6階<br>戸数:146戸 |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 146戸 |       |  |
|        |                  |                | ス 大沢小学校脇<br>(漁:大沢地区)   | 木造<br>戸数:15戸     |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 15戸  |       |  |
|        |                  |                | セ 織笠跡浜<br>(防:織笠地区)     | S造<br>戸数:22戸     |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 22戸  |       |  |
|        | 町                | ソ 大浦第1<br>(単独) | 木造<br>戸数:9戸            |                  |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     | 9戸  |      |       |  |
|        |                  | タ 大浦第2<br>(単独) | 木造<br>戸数:8戸            |                  |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     | 8戸  |      |       |  |
|        |                  | 改修             | チ 柳沢(改修)<br>(単独)       | RC造<br>戸数:49戸    |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 49戸  |       |  |
|        |                  |                | 買取                     | テ 長崎第2-1<br>(単独) | RC造<br>戸数:42戸   |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     |      | 42戸   |  |
|        | テ 長崎第2-2<br>(単独) | 木造<br>戸数:8戸    |                        |                  |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |     | 8戸   |       |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町1/3】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」

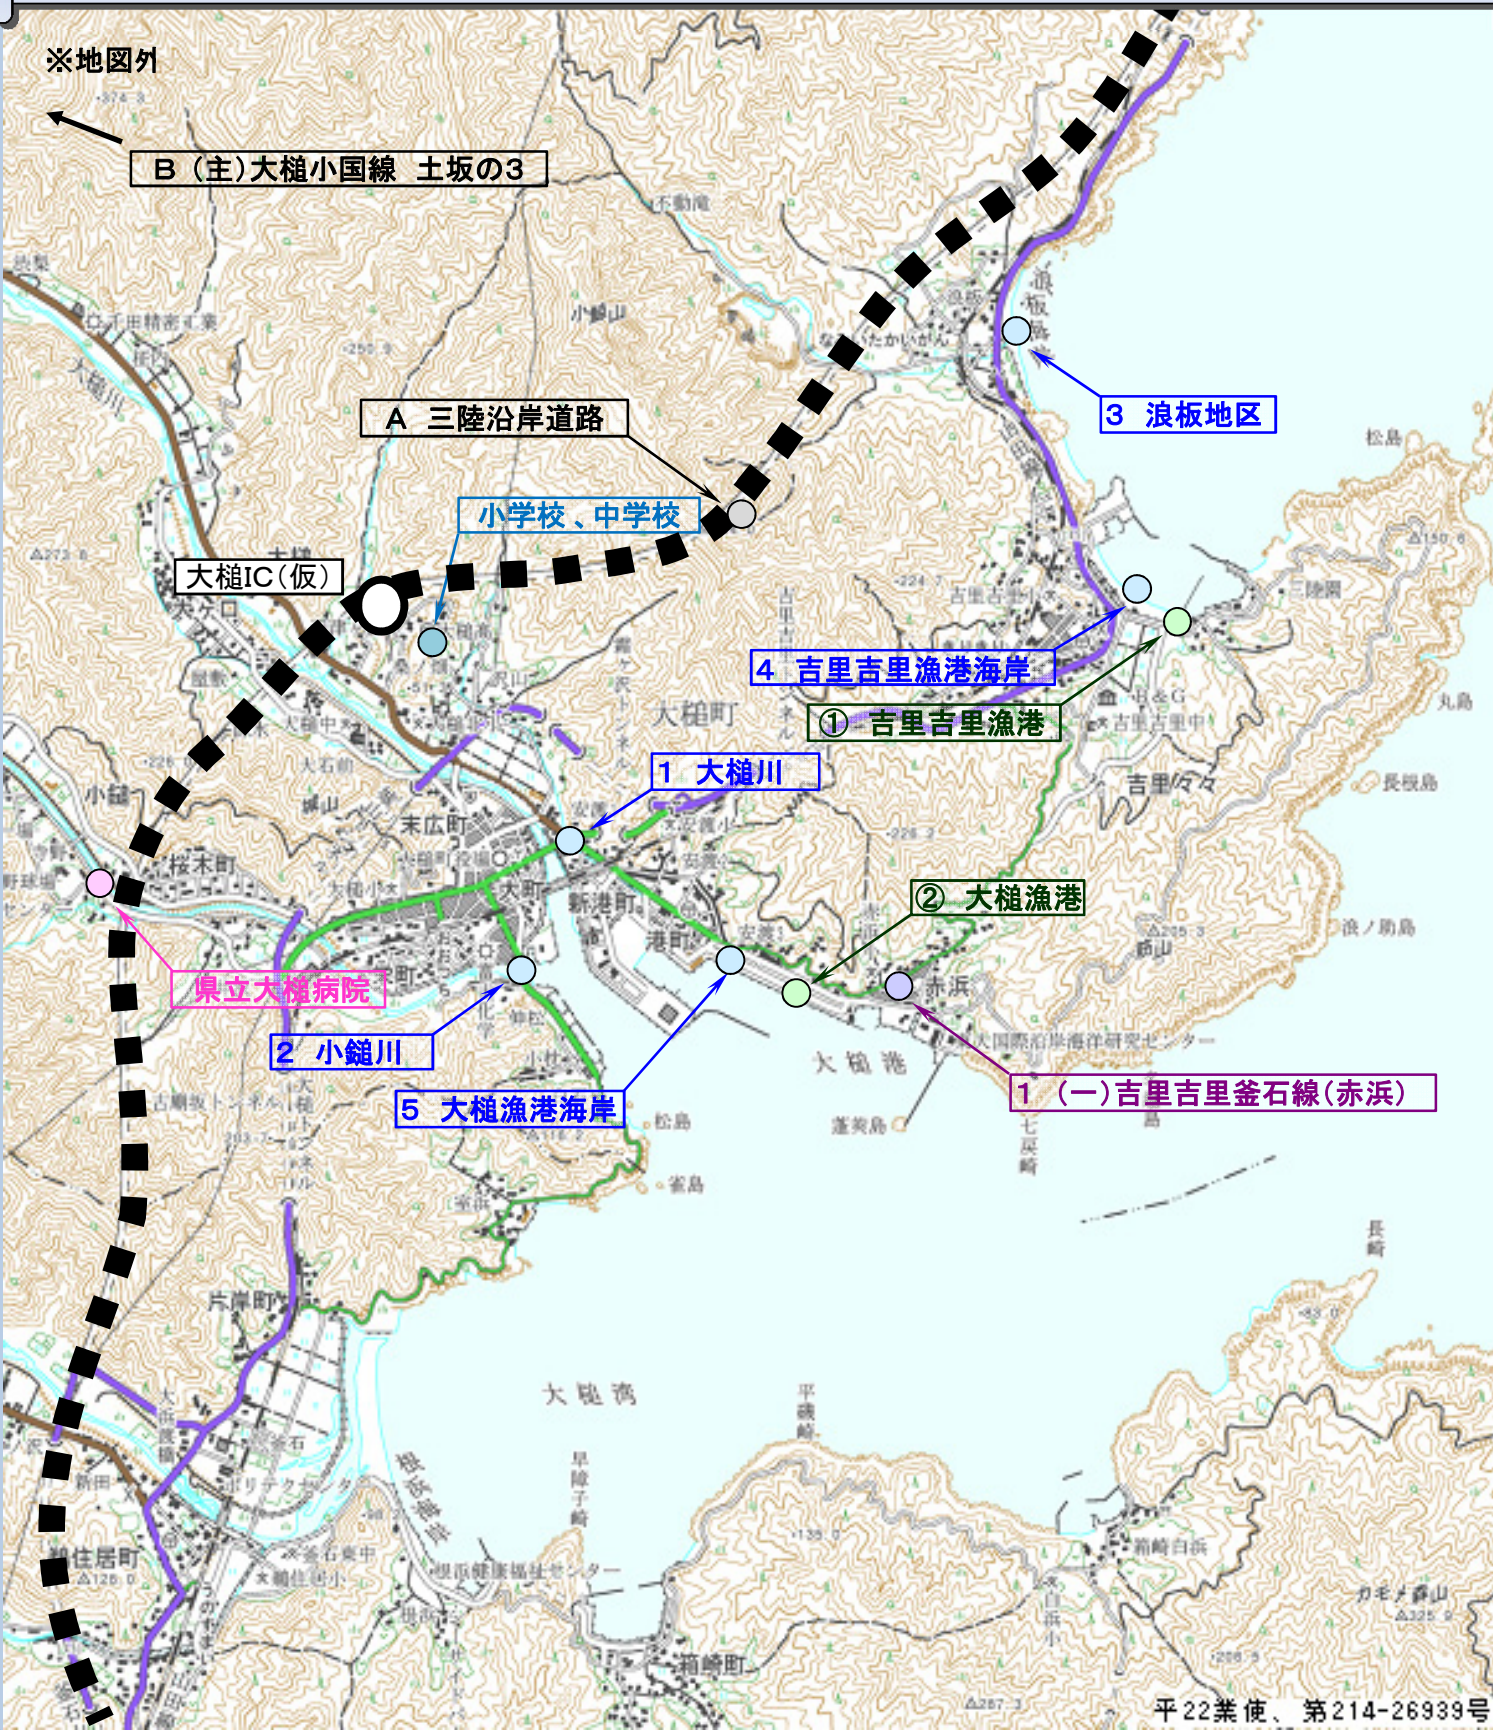


| 分野区分        | 細分項目等         | 事業主体 | 路線・箇所名等                           | 事業概要                                   | 年度別整備スケジュール  |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
|-------------|---------------|------|-----------------------------------|--|--|-----|-----|-----------------|-----|-----|----------------------|--|-----|-------|-----|
|             |               |      |                                   |  | 第1期<br>(基盤復興期間)  |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |     |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |  |     | 国復興期間 |     |
|             |               |      |                                   |  | H23  | H24 | H25 | H26             | H27 | H28 | H29                  |  | H30 | H31   | H32 |
| 海岸保全施設      | 一般海岸          | 県    | 1 大槌川                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門等N=1基       | 用地、設計等   |     |     | ★工事             |     |     |                      |  |     |       |     |
|             |               |      | 2 小槌川                             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門等N=1基       | 用地、設計等   |     |     | ★工事             |     |     |                      |  |     |       |     |
|             | 林野海岸          |      | 3 浪板地区                            | (治山施設災害)<br>防潮堤L=0.4km                 | ■H24.10完成  |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
|             | 漁港海岸          |      | 4 吉里吉里<br>漁港海岸                    | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.9km、<br>水門N=2基        | 用地、設計等   |     |     | ★工事             |     |     |                      |  |     |       |     |
|             |               |      | 5 大槌漁港海岸                          | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.0km、<br>水門N=1基        | 用地、設計等   |     |     | ★工事             |     |     |                      |  |     |       |     |
| 復興道路等       | 復興道路          | 国    | A 三陸沿岸道路                          | 釜石山田道路                                 | ★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30供用予定<br>釜石北IC～大槌IC H31供用予定 |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
|             | 復興関連道路        | 県    | B (主)<br>大槌小国線                    | 土坂の3                                   | ★工事  |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
| 漁 港         | 漁 港           | 県    | ① 吉里吉里漁港                          | (漁港災害)<br>防波堤L=596m、<br>岸壁L=753m 他     | ■H28.3完成   |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
|             |               |      | ② 大槌漁港                            | (漁港災害)<br>防波堤L=1,486m、<br>岸壁L=2,582m 他 | ■H28.3完成   |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
| 医 療         | 病院            | 県    | 県立大槌病院                            | 病院(RC造)<br>医師公舎(RC造)<br>職員公舎(RC造)      | ■H28.3完成   |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
| 教 育         | 小学校           | 町    | 大槌小学校<br>安渡小学校<br>赤浜小学校<br>大槌北小学校 | (災害復旧)<br>移転                           | ■H28.9完成   |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
|             | 中学校           |      | 大槌中学校                             | (災害復旧)<br>移転                           | ■H28.9完成   |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |
| 復興<br>まちづくり | まちづくり<br>連携道路 | 県    | 1 (一)吉里吉里<br>釜石線                  | 赤浜                                     | ■H29.9.29供用開始  |     |     |                 |     |     |                      |  |     |       |     |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町2/3】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」

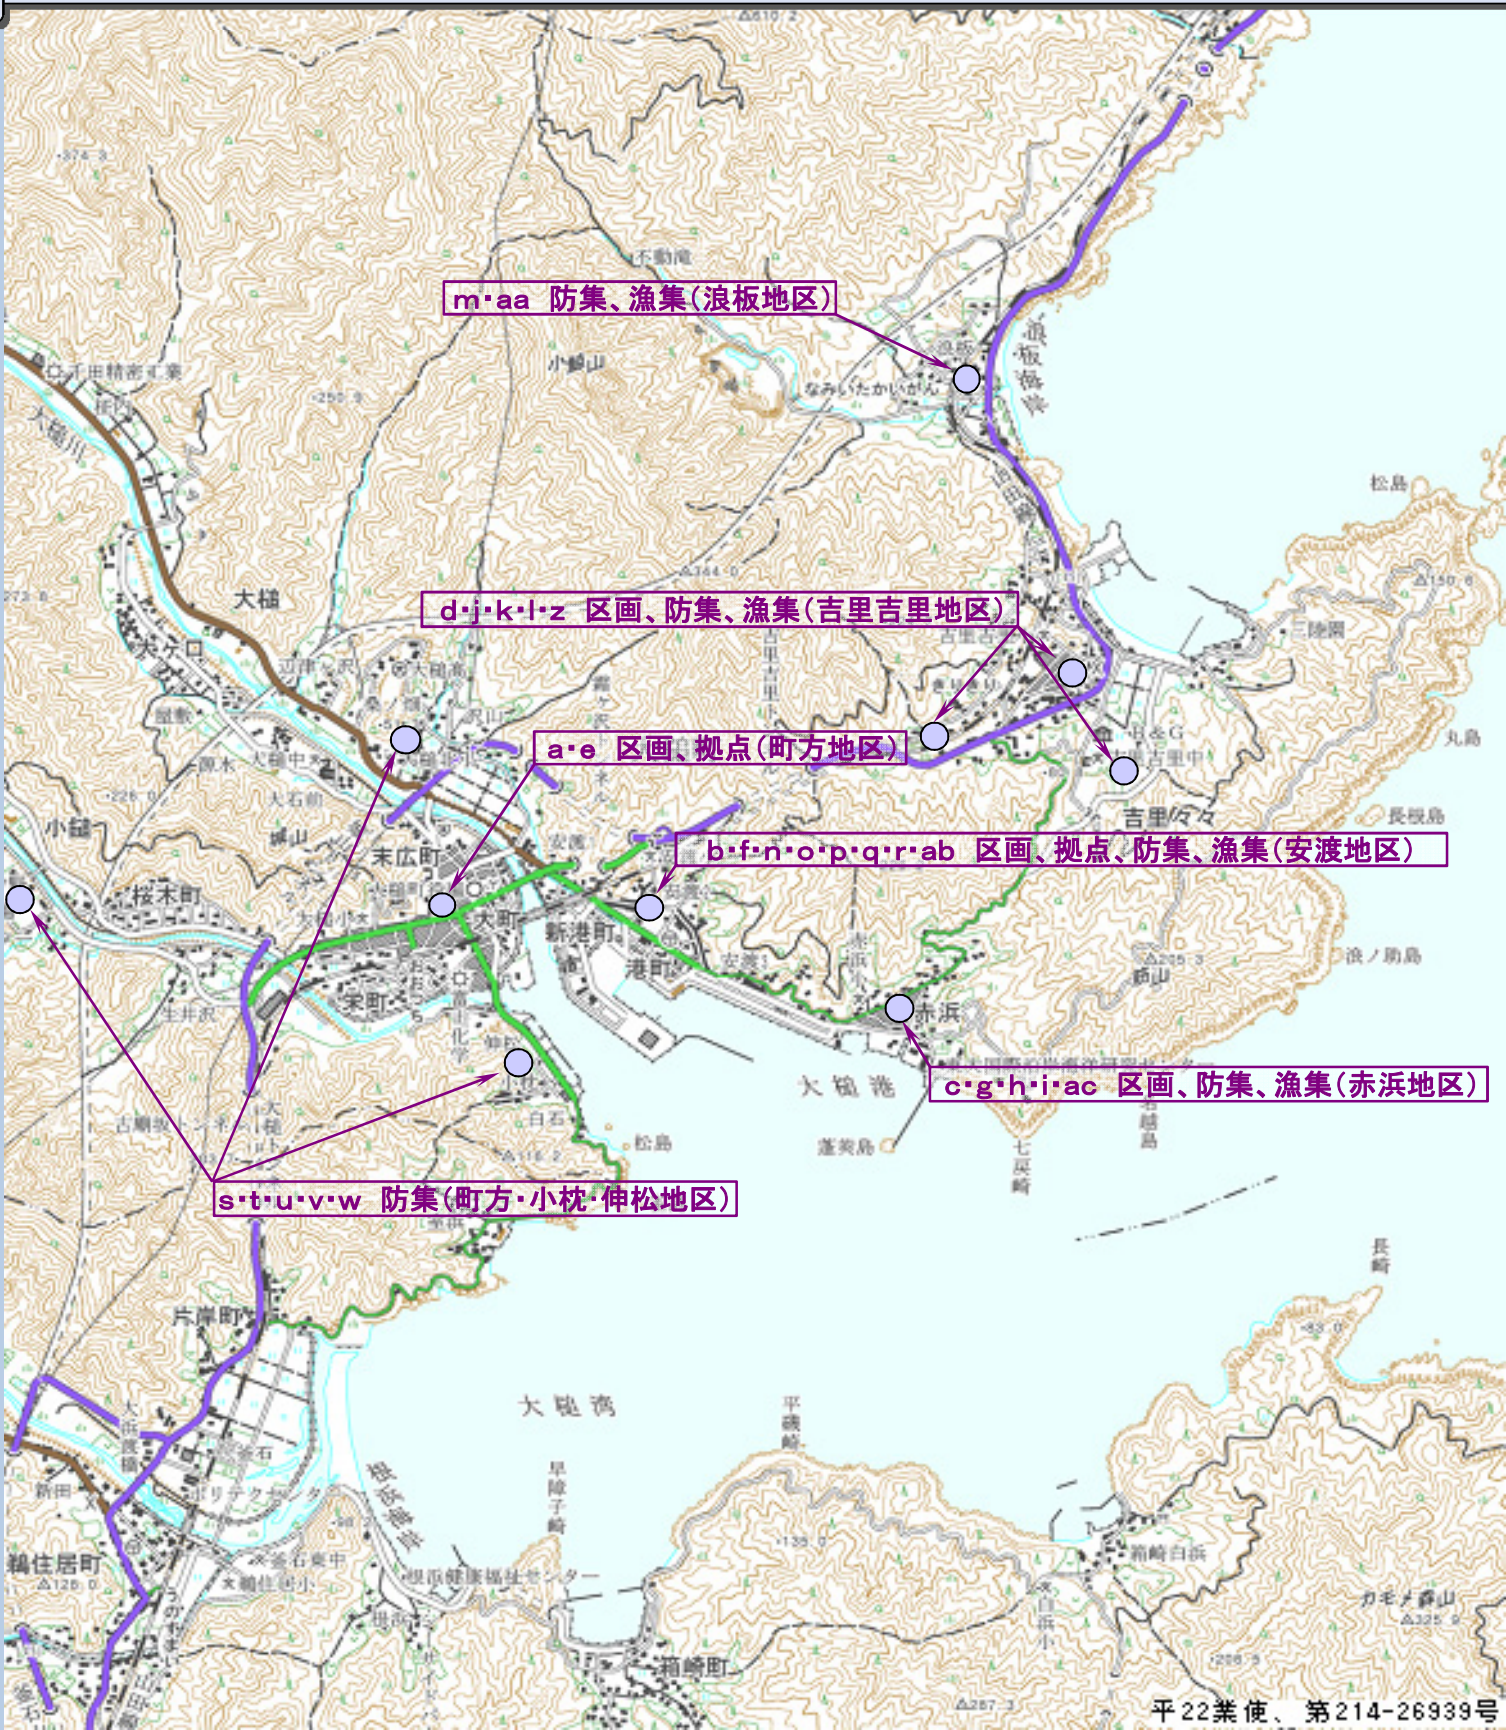


| 分野区分    | 細分項目等  | 事業主体                     | 路線・箇所名等             | 事業概要  | 年度別整備スケジュール              |        |     |                 |      |           |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|---------|--|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------|-----|-----------------|------|-----------|----------------------|-------------|------|-------|----------|-----------|--|--|
|         |  |                          |                     |   | 第1期<br>(基礎復興期間)          |        |     | 第2期<br>(本格復興期間) |      |           | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |             |      | 国復興期間 |          |           |  |  |
|         |  |                          |                     |   | H23                      | H24    | H25 | H26             | H27  | H28       | H29                  | H30         | H31  | H32   |          |           |  |  |
| 復興まちづくり | 土地区画整理                                       | 町                        | a 町方地区              | 区域面積: 30.0ha<br>対象戸数: 793戸<br>(民510戸・公283戸) | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 公171戸                |             |      |       |          |           |  |  |
|         |  |                          | b 安渡地区              | 区域面積: 5.9ha<br>対象戸数: 171戸<br>(民110戸・公61戸)   | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民81戸<br>公33戸         |             |      |       |          |           |  |  |
|         |  |                          | c 赤浜地区              | 区域面積: 7.7ha<br>対象戸数: 147戸<br>(民147戸)        | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民82戸                 |             |      |       |          |           |  |  |
|         |  |                          | d 吉里吉里地区            | 区域面積: 9.1ha<br>対象戸数: 219戸<br>(民200戸・公19戸)   | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民41戸<br>公19戸         |             |      |       |          |           |  |  |
|         | 津波復興拠点                                       |                          | e 町方地区              | 区域面積<br>町方地区 (3.8ha)                        | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         |  |                          | f 安渡地区              | 区域面積<br>安渡地区 (19.6ha)                       | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         |  |                          | 防災集団移転              | g 赤浜地区<br>(赤浜①団地)                           | 対象戸数: 18戸<br>(民11戸・公7戸)  | 用地、設計等 |     |                 | ★工事  |           |                      | 民11戸<br>公7戸 |      |       |          |           |  |  |
|         |  |                          |                     | h 赤浜地区<br>(赤浜②団地)                           | 対象戸数: 34戸<br>(民24戸・公10戸) |        |     |                 |      |           | ■H28.9完成             | 公10戸        |      |       |          |           |  |  |
|         | i 赤浜地区<br>(赤浜⑥団地)                            |                          |                     | 対象戸数: 32戸<br>(民13戸・公19戸)                    | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民13戸<br>公19戸         |             |      |       |          |           |  |  |
|         | j 吉里吉里地区<br>(吉里吉里①団地)                        |                          |                     | 対象戸数: 18戸<br>(民18戸)                         |                          |        | 民2戸 |                 |      | ■H27.7完成  |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         | k 吉里吉里地区<br>(吉里吉里②団地)                        |                          |                     | 対象戸数: 35戸<br>(民35戸)                         |                          |        |     |                 |      | ■H28.9完成  |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         | l 吉里吉里地区<br>(吉里吉里③団地)                        |                          |                     | 対象戸数: 13戸<br>(民13戸)                         |                          |        |     |                 |      | ■H28.3完成  |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         | m 浪板地区<br>(浪板①団地)                            |                          |                     | 対象戸数: 11戸<br>(民11戸)                         |                          |        |     |                 |      | ■H27.6完成  |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         | n 安渡地区                                       |                          |                     | 対象戸数: 4戸<br>(民4戸)                           | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民4戸                  |             |      |       |          |           |  |  |
|         | o 安渡地区<br>(安渡①団地)                            |                          |                     | 対象戸数: 27戸<br>(民27戸)                         |                          |        |     |                 |      | ■H29.7完成  | 民27戸                 |             |      |       |          |           |  |  |
|         | p 安渡地区<br>(安渡②団地)                            |                          |                     | 対象戸数: 13戸<br>(民13戸)                         |                          |        |     |                 |      | ■H28.11完成 |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         | q 安渡地区<br>(安渡③団地)                            |                          |                     | 対象戸数: 10戸<br>(民10戸)                         |                          |        |     |                 |      | ■H29.2完成  |                      |             |      |       |          |           |  |  |
|         | r 安渡地区<br>(安渡④団地)                            |                          |                     | 対象戸数: 11戸<br>(民11戸)                         | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民11戸                 |             |      |       |          |           |  |  |
|         | s 町方・小枕・<br>伸松地区<br>(寺野臼澤団地)                 |                          |                     | 対象戸数: 138戸<br>(民100戸・公38戸)                  | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民34戸<br>公11戸         |             |      |       |          |           |  |  |
|         | t 町方・小枕・<br>伸松地区<br>(大ヶ口、沢山、夏本、<br>砥内、屋敷前団地) |                          |                     | 対象戸数: 65戸<br>(民65戸)                         |                          |        | 民4戸 |                 |      | 民37戸      |                      |             | 民24戸 |       |          | ■H28.11完成 |  |  |
|         | u 町方・小枕・<br>伸松地区<br>(町方団地)                   |                          |                     | 対象戸数: 35戸<br>(民35戸)                         | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           | 民14戸                 |             |      |       |          |           |  |  |
|         | v 町方・小枕・<br>伸松地区<br>(小枕団地)                   |                          |                     | 対象戸数: 22戸<br>(民22戸)                         |                          |        |     |                 |      |           |                      |             | 民22戸 |       |          | ■H28.11完成 |  |  |
|         | w 町方・小枕・<br>伸松地区<br>(花輪田地区)                  |                          | 対象戸数: 10戸<br>(民10戸) |   |                          |        |     |                 | 民10戸 |           |                      |             |      |       | ■H27.1完成 |           |  |  |
|         | 漁業集落防災<br>機能強化                               |                          | z 吉里吉里地区            | 漁業集落排水施設他                                   | 用地、設計等                   |        |     | ★工事             |      |           |                      |             |      |       |          |           |  |  |
| aa 浪板地区 |  | 対象戸数: 21戸<br>(民10戸・公11戸) |                     |   |                          |        |     |                 |      | 民10戸      |                      |             | 公11戸 |       |          | ■H28.12完成 |  |  |
| ab 安渡地区 |  | 集落道他                     | 用地、設計等              |   |                          | ★工事    |     |                 |      |           |                      |             |      |       |          |           |  |  |
| ac 赤浜地区 |  | 対象戸数: 2戸<br>(民2戸)        |                     |   |                          |        |     |                 |      |           |                      |             | 民2戸  |       |          | ■H29.7完成  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町3/3】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」

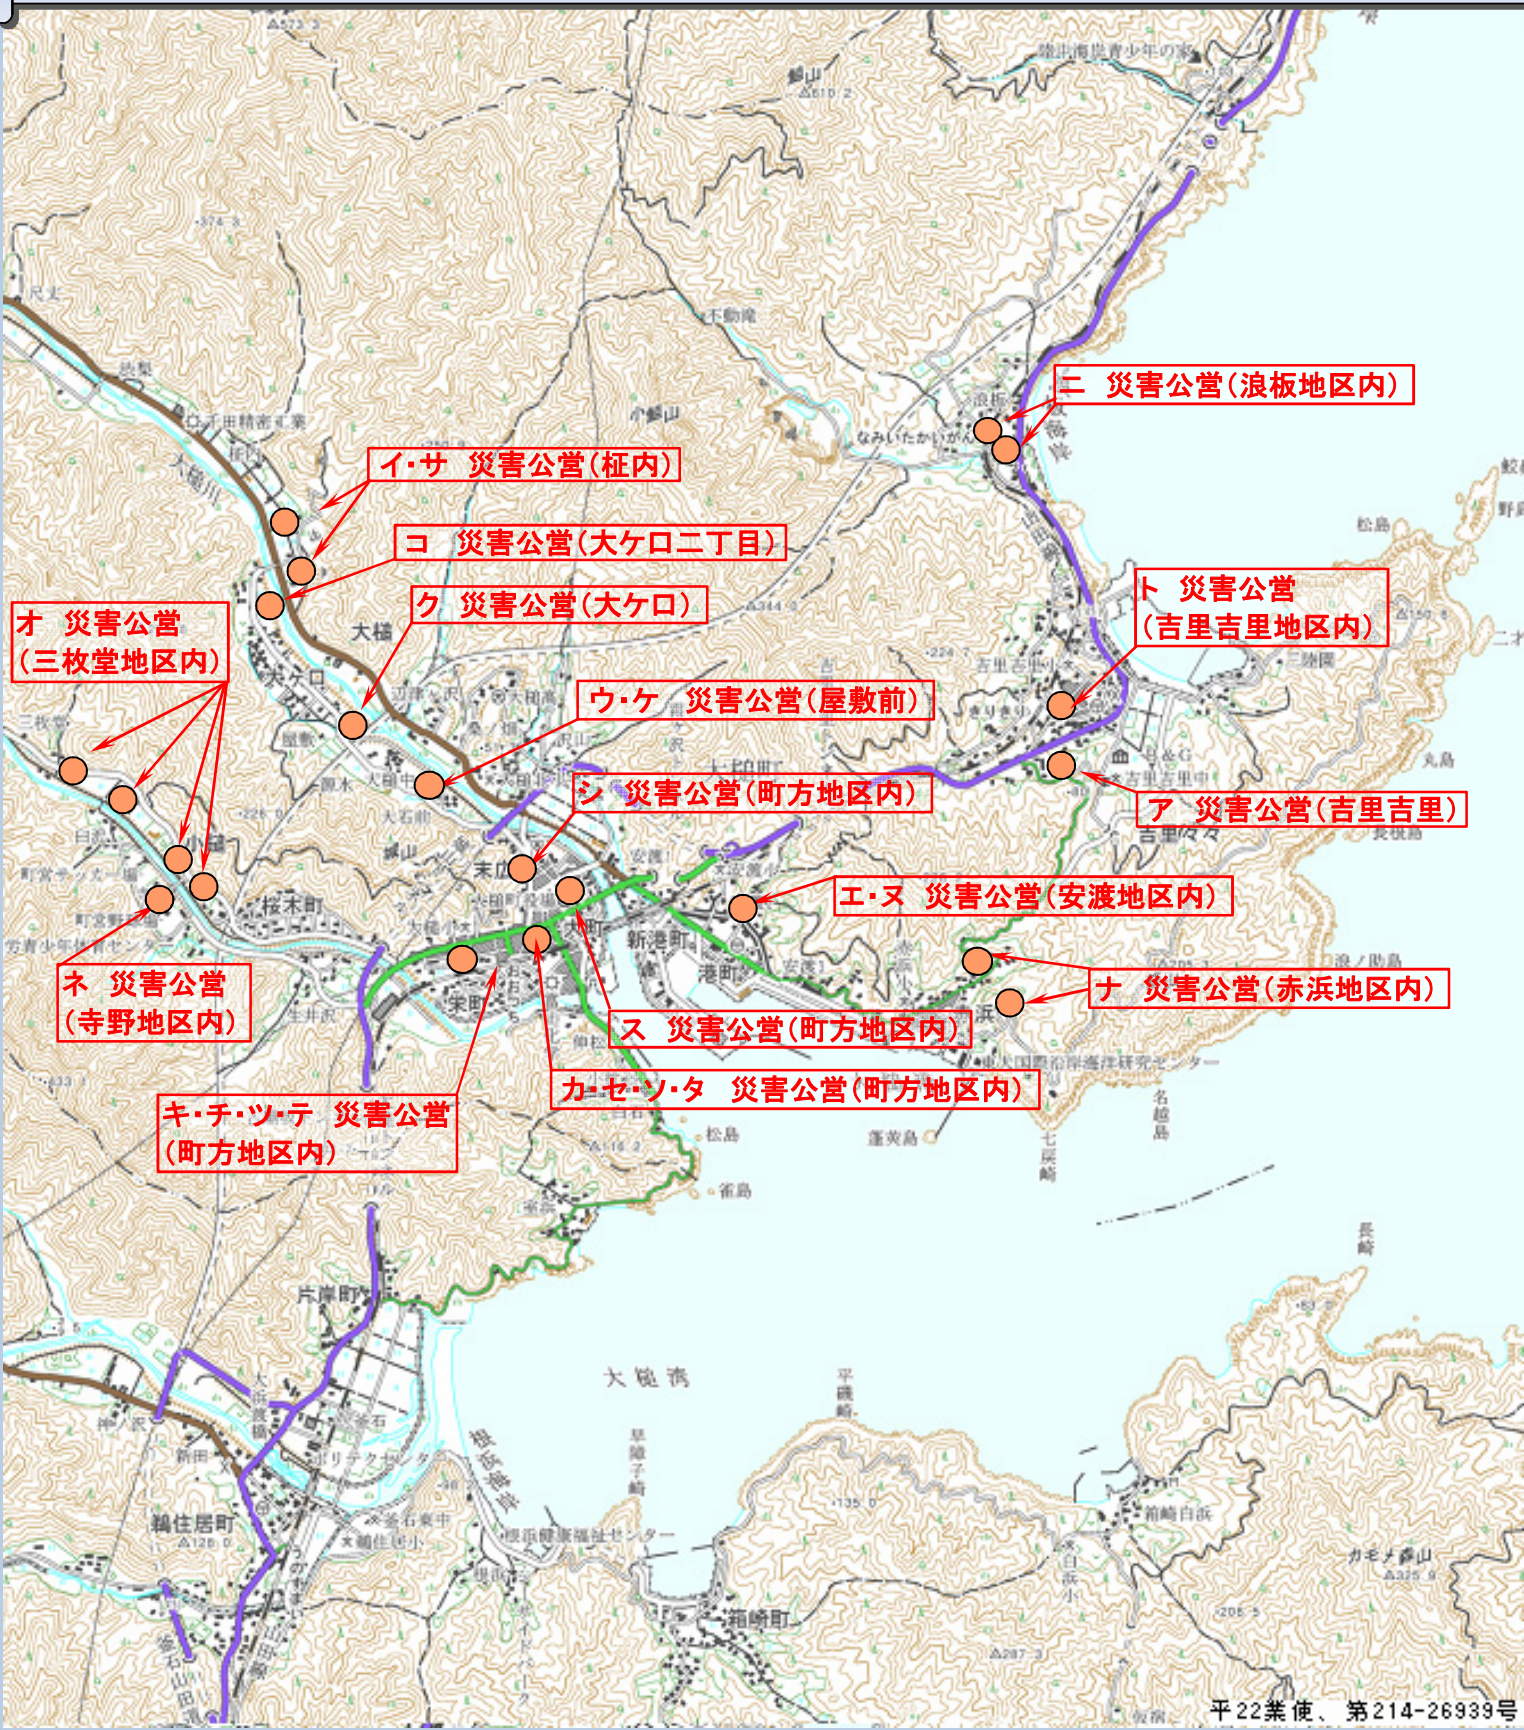


| 分野区分                 | 細分項目等        | 事業主体 | 路線・箇所名等                  | 事業概要             | 年度別整備スケジュール           |               |     |                 |     |           |                      |     |     |          |  |     | 国復興期間 |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----|-----------------|-----|-----------|----------------------|-----|-----|----------|--|-----|-------|--|--|--|--|
|                      |              |      |                          |                  | 第1期<br>(基礎復興期間)       |               |     | 第2期<br>(本格復興期間) |     |           | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      |                          |                  | H23                   | H24           | H25 | H26             | H27 | H28       | H29                  | H30 | H31 | H32      |  |     |       |  |  |  |  |
| 災害公営住宅               | 直接建設         | 県    | ア 吉里吉里<br>(単独)           | RC造5階<br>戸数:34戸  | ■H25.8完成              |               |     |                 |     |           |                      |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | イ 大槌(桎内)<br>(単独)         | 木造<br>戸数:24戸     |                       |               |     | ■H28.3完成        |     |           | 24戸                  |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ウ 大槌(屋敷前)<br>(単独)        | RC造5階<br>戸数:151戸 |                       |               |     | ■H27.10完成       |     |           | 151戸                 |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | エ 安渡(G)<br>(区:安渡地区)      | RC造5階<br>戸数:23戸  |                       |               |     | 用地、設計等・工事       |     |           | ★工事                  |     |     | 23戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | オ 三枚堂<br>(単独)            | 木造<br>戸数:98戸     |                       |               |     | 用地、設計等・工事       |     |           | ★工事                  |     |     | 98戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | カ 町方1(共同)<br>(区:町方地区)    | RC造<br>戸数:23戸    |                       |               |     | 用地、設計等・工事       |     |           | ★工事                  |     |     | 23戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | キ 町方2(戸建)<br>(区:町方地区)    | 木造<br>戸数:38戸     |                       |               |     | 用地、設計等・工事       |     |           | ★工事                  |     |     | 38戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | 買取                       | 町                | キ 町方2(共同)<br>(区:町方地区) | RC造<br>戸数:23戸 |     |                 |     | 用地、設計等・工事 |                      |     | ★工事 |          |  | 23戸 |       |  |  |  |  |
|                      |              |      |                          |                  | キ 町方2(共同)<br>(区:町方地区) | RC造<br>戸数:23戸 |     |                 |     | 用地、設計等・工事 |                      |     | ★工事 |          |  | 23戸 |       |  |  |  |  |
|                      | 買取           | 町    | ク 大ケロ<br>(単独)            | 木造<br>戸数:70戸     | ■H25.8完成              |               |     |                 |     |           |                      |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ケ 屋敷前<br>(単独)            | 木造<br>戸数:21戸     | ■H25.11完成             |               |     |                 |     |           |                      |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | コ 大ケロ2丁目<br>(単独)         | 木造2階<br>戸数:23戸   |                       |               |     | ■H26.9完成        |     |           | 23戸                  |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | サ 桎内①<br>(単独)            | 木造<br>戸数:13戸     |                       |               |     | ■H26.12完成       |     |           | 13戸                  |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | シ 町方(末広町)<br>(区:町方地区)    | RC造6階<br>戸数:53戸  |                       |               |     | ■H28.3完成        |     |           | 53戸                  |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ス 町方(御社地)<br>(区:町方地区)    | RC造<br>戸数:24戸    |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 24戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | セ 町方(本町)<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:8戸      |                       |               |     |                 |     |           | ■H29.3完成             |     |     | 8戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ソ 町方D東-1<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:4戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 4戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ソ 町方D東-2<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:5戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 5戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ソ 町方D東-4<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:12戸     |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 12戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | タ 町方E-1<br>(区:町方地区)      | 木造<br>戸数:3戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 3戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | タ 町方E-2<br>(区:町方地区)      | 木造<br>戸数:8戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 8戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | タ 町方E-3<br>(区:町方地区)      | 木造<br>戸数:11戸     |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 11戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | チ 町方(上町)<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:4戸      |                       |               |     |                 |     |           | ■H29.3完成             |     |     | 4戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ツ 町方D西-6<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:2戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 2戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ソ 町方D西-7<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:3戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 3戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ツ 町方D西-8<br>(区:町方地区)     | 木造<br>戸数:5戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 5戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | テ 町方F-1<br>(区:町方地区)      | 木造<br>戸数:16戸     |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 16戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | テ 町方F-2<br>(区:町方地区)      | 木造<br>戸数:27戸     |                       |               |     | 用地、設計等・工事       |     |           | ★工事                  |     |     | 27戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | テ 町方F-3<br>(区:町方地区)      | 木造<br>戸数:14戸     |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 14戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ト 吉里吉里(A)<br>(区:吉里吉里地区)  | 木造<br>戸数:5戸      |                       |               |     |                 |     |           | 1戸                   |     |     | ■H29.4完成 |  |     | 4戸    |  |  |  |  |
|                      |              |      | ト 吉里吉里(B1)<br>(区:吉里吉里地区) | 木造<br>戸数:12戸     |                       |               |     |                 |     |           |                      |     |     | ■H29.7完成 |  |     | 12戸   |  |  |  |  |
|                      |              |      | ト 吉里吉里(C1)<br>(区:吉里吉里地区) | 木造<br>戸数:2戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 2戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ナ 赤浜①団地<br>(防:赤浜地区)      | 木造<br>戸数:7戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 7戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ナ 赤浜②団地<br>(防:赤浜地区)      | 木造<br>戸数:10戸     |                       |               |     |                 |     |           |                      |     |     | ■H29.5完成 |  |     | 10戸   |  |  |  |  |
|                      |              |      | ナ 赤浜⑥団地<br>(防:赤浜地区)      | 木造<br>戸数:19戸     |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 19戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ニ 浪板<br>(漁:浪板地区)         | 木造<br>戸数:11戸     |                       |               |     |                 |     |           |                      |     |     | ■H29.7完成 |  |     | 11戸   |  |  |  |  |
|                      |              |      | ニ 浪板(1)<br>(単独)          | 木造<br>戸数:3戸      |                       |               |     |                 |     |           | 3戸                   |     |     | ■H28.6完成 |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ヌ 安渡(A①)<br>(区:安渡地区)     | 木造<br>戸数:11戸     |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 11戸      |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ヌ 安渡(A②)<br>(区:安渡地区)     | 木造<br>戸数:8戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 8戸       |  |     |       |  |  |  |  |
|                      |              |      | ヌ 安渡(A③)<br>(区:安渡地区)     | 木造<br>戸数:2戸      |                       |               |     | 用地、設計等          |     |           | ★工事                  |     |     | 2戸       |  |     |       |  |  |  |  |
| ヌ 安渡(B1)<br>(区:安渡地区) | 木造<br>戸数:12戸 |      |                          |                  |                       |               |     |                 |     |           | ■H29.7完成             |     |     | 12戸      |  |     |       |  |  |  |  |
| ヌ 安渡(B2)<br>(区:安渡地区) | 木造<br>戸数:5戸  |      |                          |                  | 用地、設計等                |               |     | ★工事             |     |           | 5戸                   |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
| ホ 寺野1<br>(防:寺野地区)    | 木造<br>戸数:16戸 |      |                          |                  |                       |               |     | 16戸             |     |           | ■H27.9完成             |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |
| ホ 寺野2<br>(防:寺野地区)    | 木造<br>戸数:11戸 |      |                          |                  |                       |               |     |                 |     |           | ■H28.7完成             |     |     | 11戸      |  |     |       |  |  |  |  |
| ホ 寺野3<br>(防:寺野地区)    | 木造<br>戸数:11戸 |      |                          |                  | 用地、設計等                |               |     | ★工事             |     |           | 11戸                  |     |     |          |  |     |       |  |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市1/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

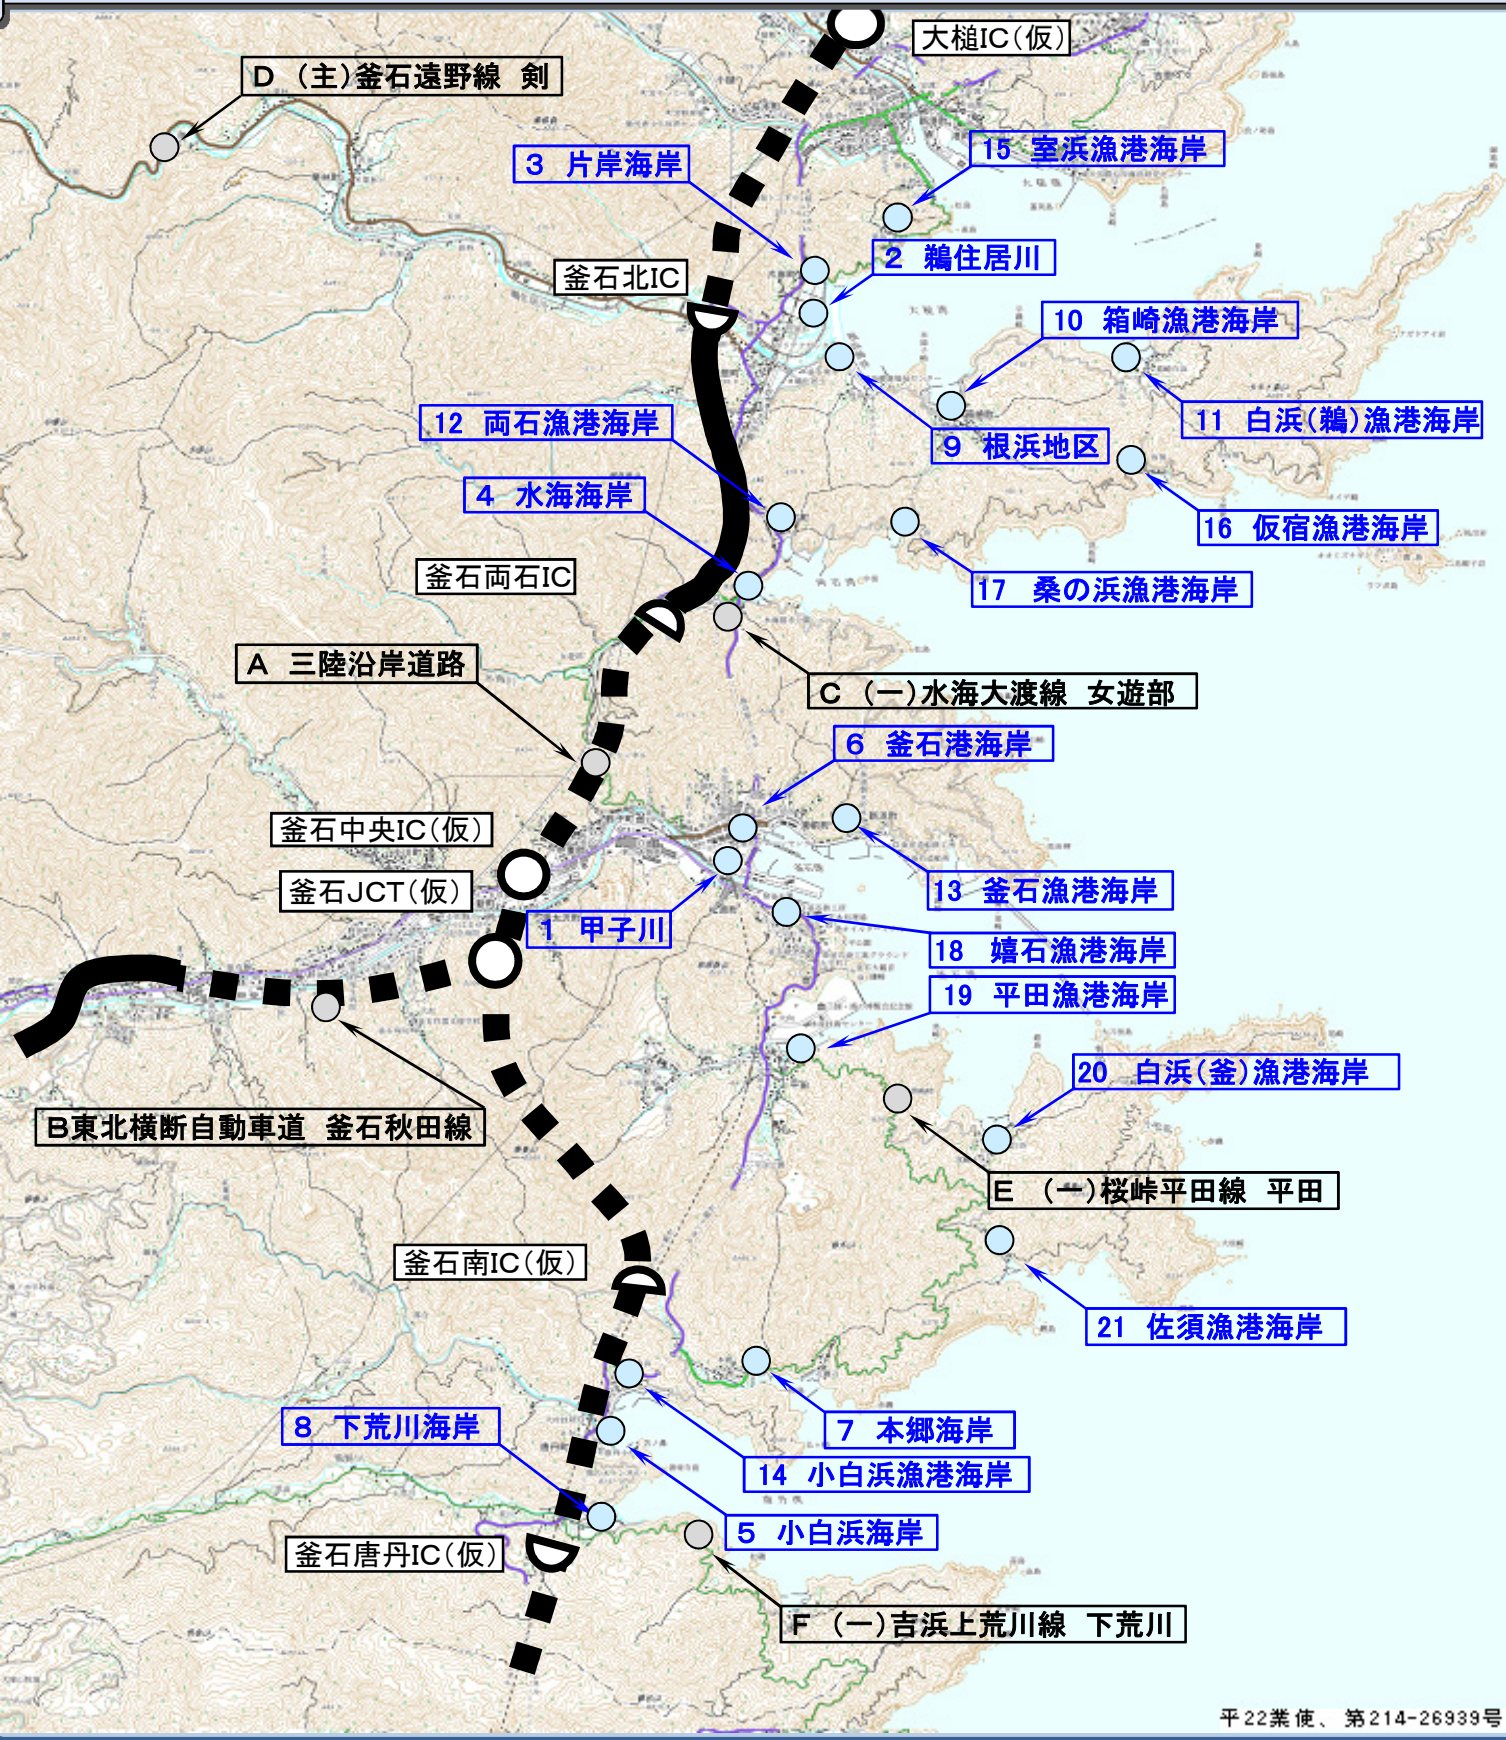

平22業使、第214-26939号


| 分野区分   | 細分項目等        | 事業主体 | 路線・箇所名等             | 事業概要  | 年度別整備スケジュール  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|--------|--------------|------|---------------------|---|--|-----|-----------------|---------------|-----|----------------------|----------|-----|-------|----------------|
|        |              |      |                     |   | 第1期<br>(基盤復興期間)  |     | 第2期<br>(本格復興期間) |               |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |          |     | 国復興期間 |                |
|        |              |      |                     |   | H23  | H24 | H25             | H26           | H27 | H28                  | H29      | H30 | H31   | H32            |
| 海岸保全施設 | 一般海岸<br>港湾海岸 | 県    | 1 甲子川               | (三陸高潮)<br>水門N=1基                              | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       | ■H31.8津波防護機能発現 |
|        |              |      | 2 鵜住居川              | (災害復旧)<br>水門等N=1基                             | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       | ■H31.8津波防護機能発現 |
|        |              |      | 3 片岸海岸              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.8km                          | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 4 水海海岸              | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>水門N=1基、<br>離岸堤L=280m |  |     |                 | ■H28.3完成      |     |                      |          |     |       |                |
|        | 農地海岸         | 県    | 5 小白浜海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門等N=2基              | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 6 釜石港海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.1km、<br>水門等N=19基             |  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 7 本郷海岸              | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.3km<br>水門等N=3基           |  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        | 林野海岸         | 県    | 8 下荒川海岸             | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.3km<br>水門等N=3基           | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 9 根浜地区              | (治山施設災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km                      |  |     |                 | ■H28.3完成      |     |                      |          |     |       |                |
|        | 漁港海岸         | 市    | 10 箱崎漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=2基               | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 11 白浜(鵜)漁港海岸        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=2基               | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 12 両石漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=1基               |  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 13 釜石漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.0km、<br>水門N=11基              |  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 14 小白浜漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=1基               |  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 15 室浜漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>水門N=2基               | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 16 仮宿漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km                          |  |     |                 |               |     |                      | ■H29.8完成 |     |       |                |
|        |              |      | 17 桑の浜漁港海岸          | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km                          | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 18 嬉石漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km                          | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 19 平田漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=1基               |  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 20 白浜(釜)漁港海岸        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km                          |  |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | 21 佐須漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.1km、<br>水門N=1基               | 用地、設計等   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
| 復興道路等  | 復興道路         | 国    | A 三陸沿岸道路            | 釜石山田道路  | ★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30供用予定<br>釜石北IC～大槌IC H31供用予定 |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      |                     | 吉浜釜石道路<br>(吉浜～釜石)                             | ◆H25.2.25起工式   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        | 復興支援道路       | 県    | B 東北横断自動車道<br>釜石秋田線 | 釜石道路<br>(釜石～釜石西)                              | ◆H24.11.4起工式   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        |              |      | C (一)水海大渡線          | 女遊部   | ■H24.3.5供用開始   |     |                 |               |     |                      |          |     |       |                |
|        | 復興関連道路       | 県    | D (主)釜石遠野線          | 剣   |  |     |                 |               |     | ■H28.8.10供用開始        |          |     |       |                |
|        |              |      | E (一)桜峠平田線          | 平田  |  |     |                 |               |     | ■H28.8.10供用開始        |          |     |       |                |
|        |              |      | F (一)吉浜上荒川線         | 下荒川   |  |     |                 | ■H28.3.22供用開始 |     |                      |          |     |       |                |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市2/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

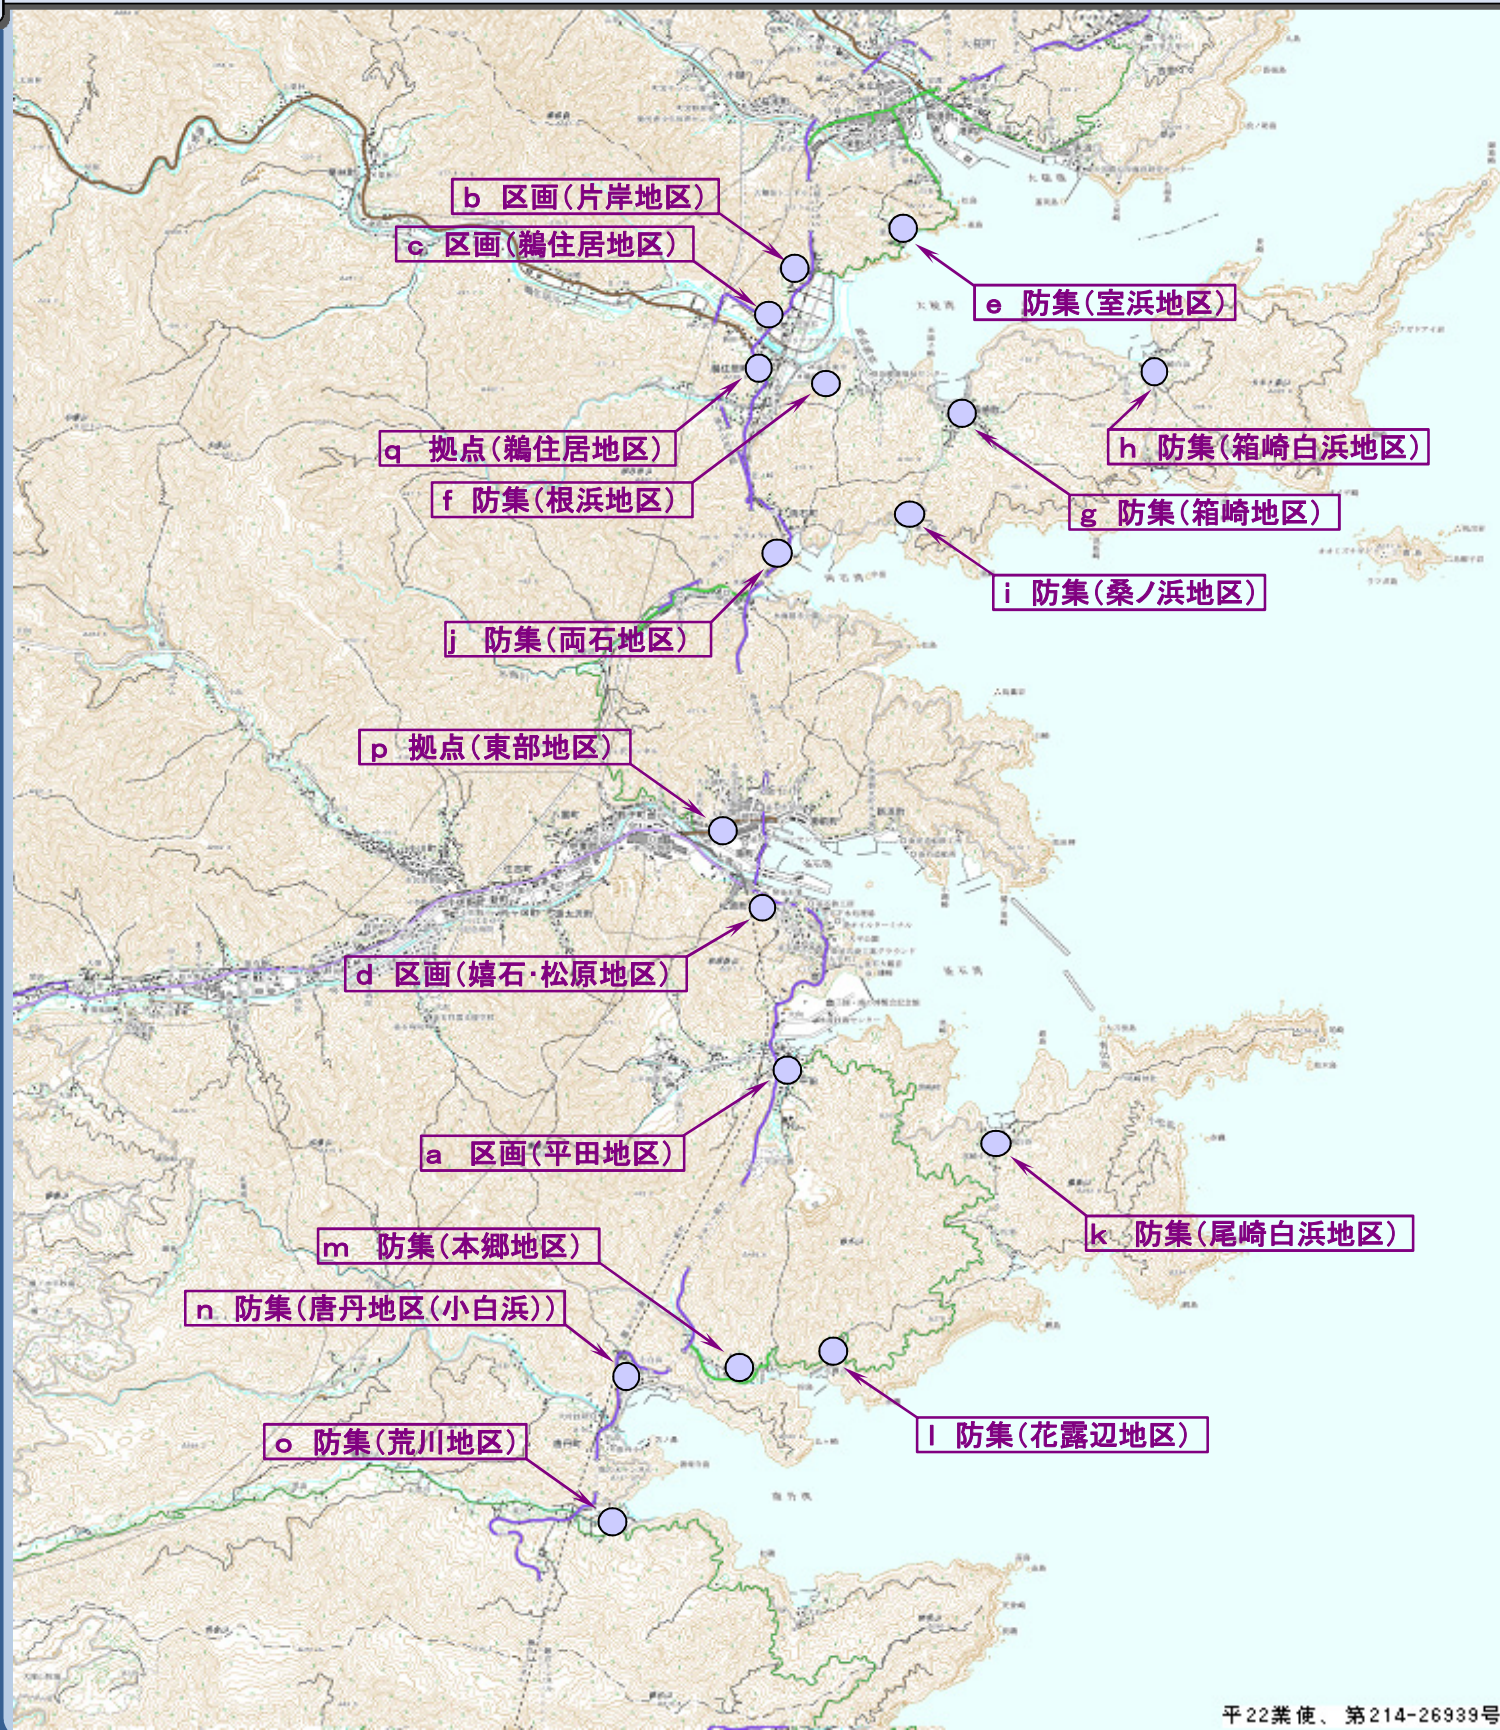

平22業使、第214-26939号


| 分野区分            | 細分項目等                   | 事業主体                                      | 路線・箇所名等                | 事業概要                                | 年度別整備スケジュール     |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|-----------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|------|-----------------|-------------|------------|----------------------|------|-----|-------|--|--|--|
|                 |                         |   |                        |                                     | 第1期<br>(基盤復興期間) |     |      | 第2期<br>(本格復興期間) |             |            | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |      |     | 国復興期間 |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     | H23             | H24 | H25  | H26             | H27         | H28        | H29                  | H30  | H31 | H32   |  |  |  |
| 復興<br>まちづくり     | 土地区画整理                  | 市   | a 平田地区                 | 区域面積:22.7ha<br>対象戸数:158戸<br>(民158戸) |                 |     |      | 民30戸            |             | 民67戸       |                      | 民61戸 |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 | b 片岸地区                  | 区域面積:22.7ha<br>対象戸数:209戸<br>(民191戸・公18戸)  |                        |                                     |                 |     |      | 民23戸            | 民29戸        | 民139戸・公18戸 |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 | c 鵜住居地区                 | 区域面積:49.2ha<br>対象戸数:649戸<br>(民529戸・公120戸) |                        |                                     |                 |     | 民16戸 | 民1戸             | 民138戸・公46戸  | 民359戸・公74戸 |                      | 民15戸 |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 | d 嬉石・松原地区               | 区域面積:13.0ha<br>対象戸数:323戸<br>(民179戸・公144戸) |                        |                                     |                 |     | 民16戸 | 民7戸             | 民86戸・公80戸   | 民70戸・公84戸  |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 | 防災集団移転                  | 市   | e 室浜地区                 | 対象戸数:9戸<br>(民7戸・公2戸)                |                 |     |      |                 |             | 民7戸        | 公2戸                  |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| f 根浜地区          |                         |   | 対象戸数:34戸<br>(民25戸・公9戸) |                                     |                 |     |      |                 |             | 民25戸・公9戸   |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| g 箱崎地区          | 対象戸数:34戸<br>(民18戸・公16戸) |   |                        |                                     |                 |     |      | 民18戸            | 公16戸        |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| h 箱崎白浜地区        | 対象戸数:7戸<br>(民7戸)        |   |                        |                                     |                 |     |      | 民7戸             |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| i 桑ノ浜地区         | 対象戸数:12戸<br>(民7戸・公5戸)   |   |                        |                                     |                 |     |      |                 | 民7戸・公5戸     |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| j 両石地区          | 対象戸数:62戸<br>(民34戸・公28戸) |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             | 民34戸       | 公28戸                 |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| k 尾崎白浜地区        | 対象戸数:6戸<br>(民4戸・公2戸)    |   |                        |                                     |                 |     |      | 公2戸             | 民4戸         |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| l 花露辺地区         | 対象戸数:17戸<br>(民4戸・公13戸)  |   |                        |                                     |                 |     |      |                 | 民4戸<br>公13戸 |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| m 本郷地区          | 対象戸数:17戸<br>(民10戸・公7戸)  |   |                        |                                     |                 |     |      |                 | 民10戸        | 公7戸        |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| n 唐丹地区<br>(小白浜) | 対象戸数:18戸<br>(民18戸)      |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             | 民18戸       |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| o 荒川地区          | 対象戸数:9戸<br>(民1戸・公8戸)    |   |                        |                                     |                 |     |      |                 | 民1戸         | 公8戸        |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| 津波復興拠点          | 市                       | p 東部地区                                    | 区域面積:16.4ha            |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
| q 鵜住居地区         | 区域面積:16.9ha             |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |
|                 |                         |   |                        |                                     |                 |     |      |                 |             |            |                      |      |     |       |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市3/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

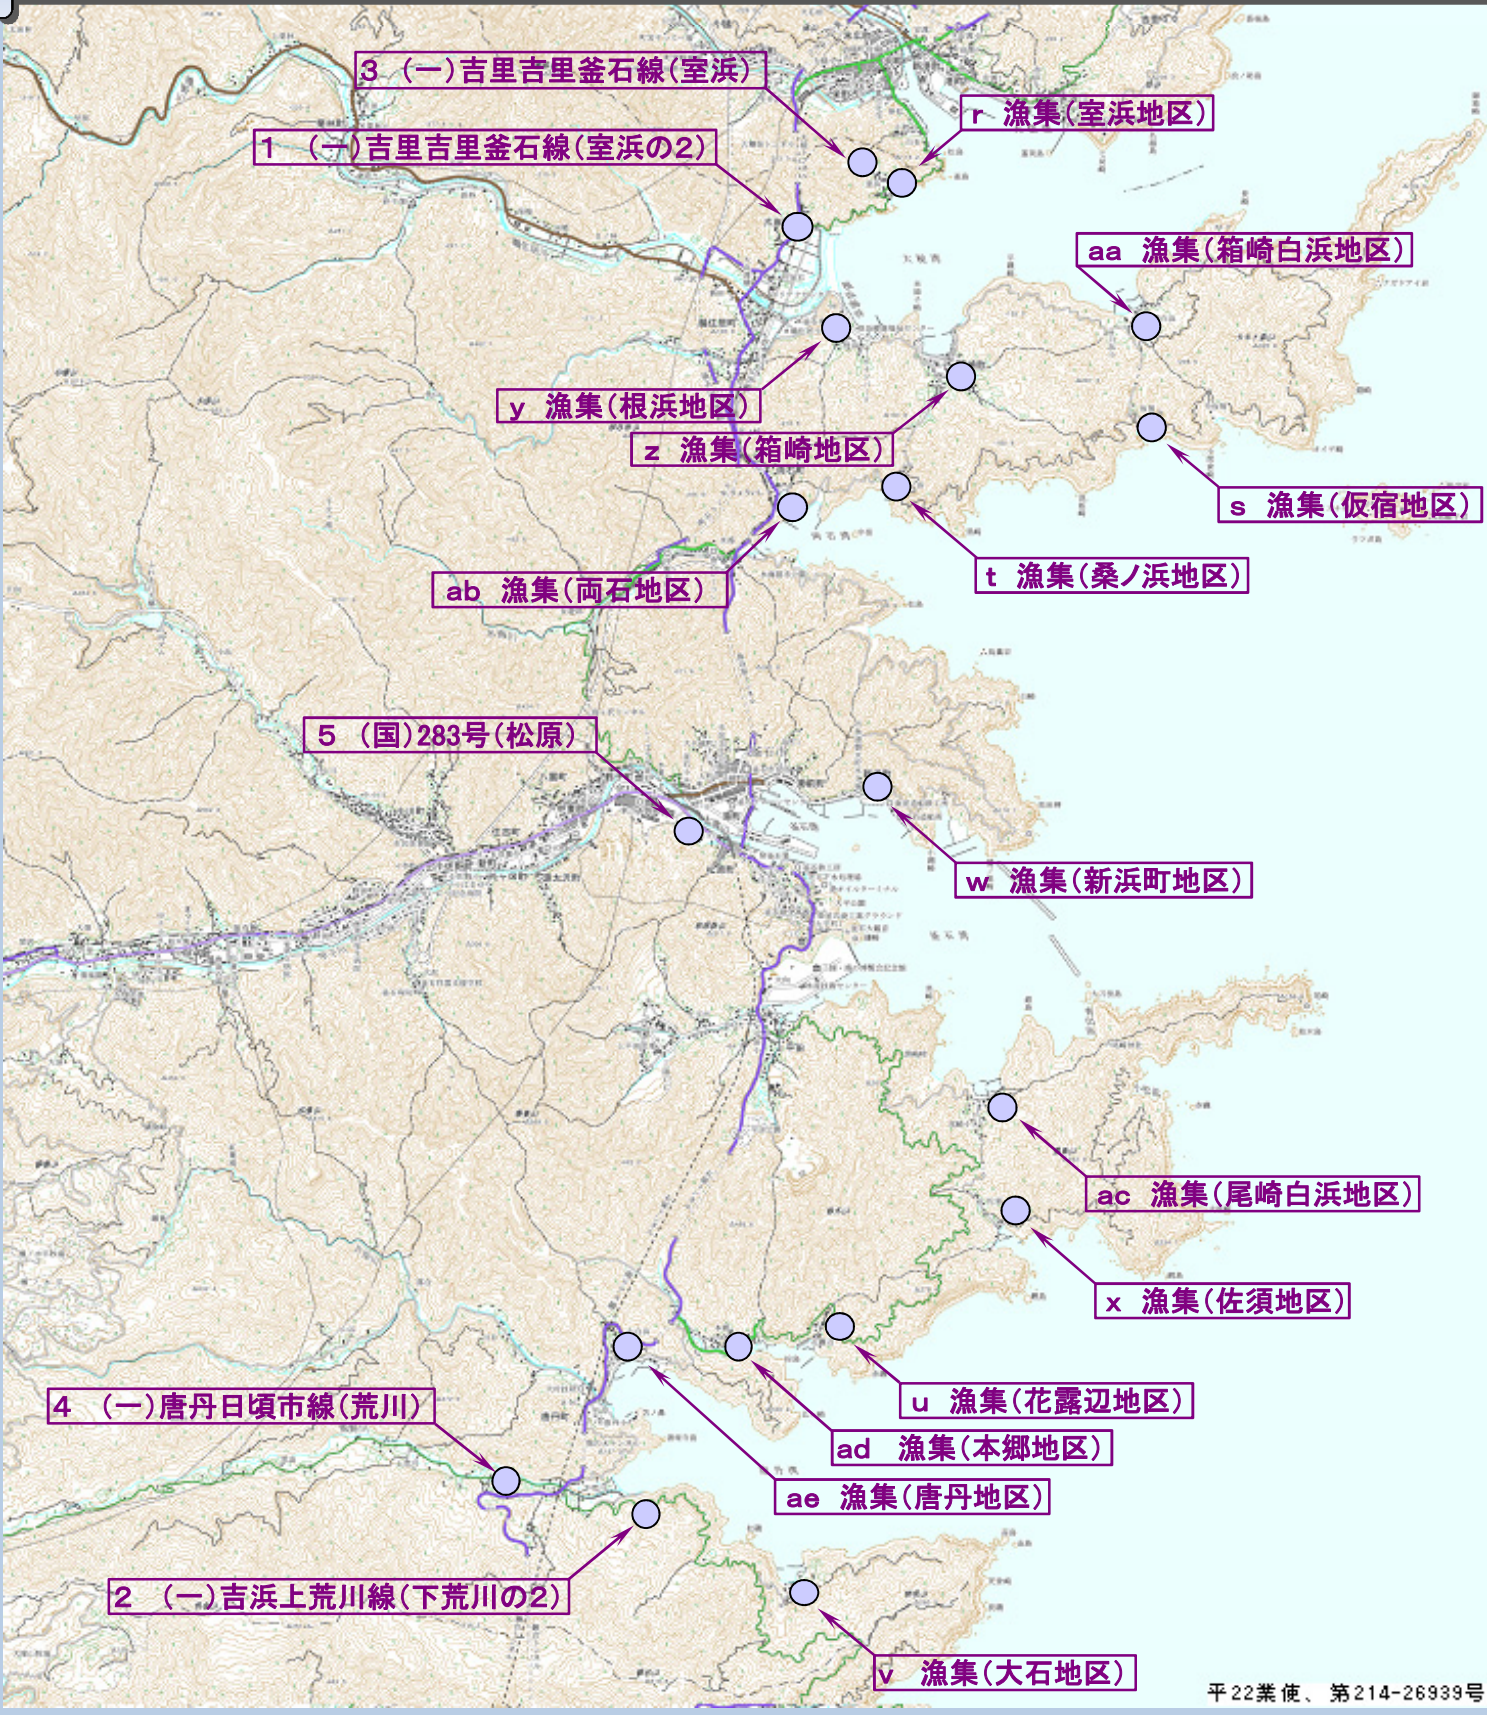


| 分野区分        | 細分項目等          | 事業主体 | 路線・箇所名等          | 事業概要                             | 年度別整備スケジュール     |               |     |                 |      |         |                      |  |     |  | 国復興期間 |  |     |     |
|-------------|----------------|------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----|-----------------|------|---------|----------------------|--|-----|--|-------|--|-----|-----|
|             |                |      |                  |                                  | 第1期<br>(基盤復興期間) |               |     | 第2期<br>(本格復興期間) |      |         | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      |                  |                                  | H23             | H24           | H25 | H26             | H27  | H28     | H29                  |  | H30 |  |       |  | H31 | H32 |
| 復興<br>まちづくり | 漁業集落防災<br>機能強化 | 市    | r 室浜地区           | 対象戸数:16戸<br>(民11戸・公5戸)           |                 |               |     |                 | 民11戸 | 公5戸     |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | s 仮宿地区           | 対象戸数2戸<br>(民2戸)                  |                 |               |     |                 | 民2戸  |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | t 桑ノ浜地区          | 対象戸数:6戸<br>(民3戸・公3戸)             |                 |               |     |                 |      | 民3戸・公3戸 |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | u 花露辺地区          | 集落道 他                            |                 |               |     |                 |      |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | v 大石地区           | 集落道 他                            | 用地、設計等          |               |     |                 |      |         |                      |  |     |  | 工事    |  |     |     |
|             |                |      | w 新浜町地区          | 用地造成他                            | 用地、設計等          |               |     |                 |      |         |                      |  |     |  | 工事    |  |     |     |
|             |                |      | x 佐須地区           | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)                 |                 |               |     |                 | 民5戸  |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | y 根浜地区           | 対象戸数:7戸<br>(民6戸・公1戸)             |                 |               |     |                 |      | 民6戸・公1戸 |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | z 箱崎地区           | 対象戸数:29戸<br>(民14戸・公15戸)          |                 |               |     |                 | 民14戸 | 公15戸    |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | aa 箱崎白浜地区        | 対象戸数:3戸<br>(民3戸)                 |                 |               |     |                 | 民3戸  |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | ab 両石地区          | 対象戸数:57戸<br>(民36戸・公21戸)          | 用地、設計等          |               |     |                 |      |         |                      |  |     |  | ★工事   |  |     |     |
|             |                |      | ac 尾崎白浜地区        | 対象戸数:1戸<br>(民1戸)                 |                 |               |     |                 | 民1戸  |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | ad 本郷地区          | 対象戸数7戸<br>(民2戸・公5戸)              |                 |               |     |                 | 民2戸  | 公5戸     |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | ae 唐丹地区          | 集落排水施設整備<br>L=3,353m<br>処理施設整備1式 | 用地、設計等          |               | ★工事 |                 |      |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             | まちづくり<br>連携道路  | 県    | 1 (一)<br>吉里吉里釜石線 | 室浜の2                             |                 | ◆H26.10着工 ★工事 |     |                 |      |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | 2 (一)<br>吉浜上荒川線  | 下荒川の2                            |                 |               |     |                 |      |         | ■H27.11.4供用開始        |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | 3 (一)<br>吉里吉里釜石線 | 室浜                               |                 | ◆H26.9着工 ★工事  |     |                 |      |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | 4 (一)<br>唐丹日頃市線  | 荒川                               |                 | ◆H26.12着工 ★工事 |     |                 |      |         |                      |  |     |  |       |  |     |     |
|             |                |      | 5 (国)283号        | 松原                               |                 |               |     |                 |      |         | ■H28.3.14供用開始        |  |     |  |       |  |     |     |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市4/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

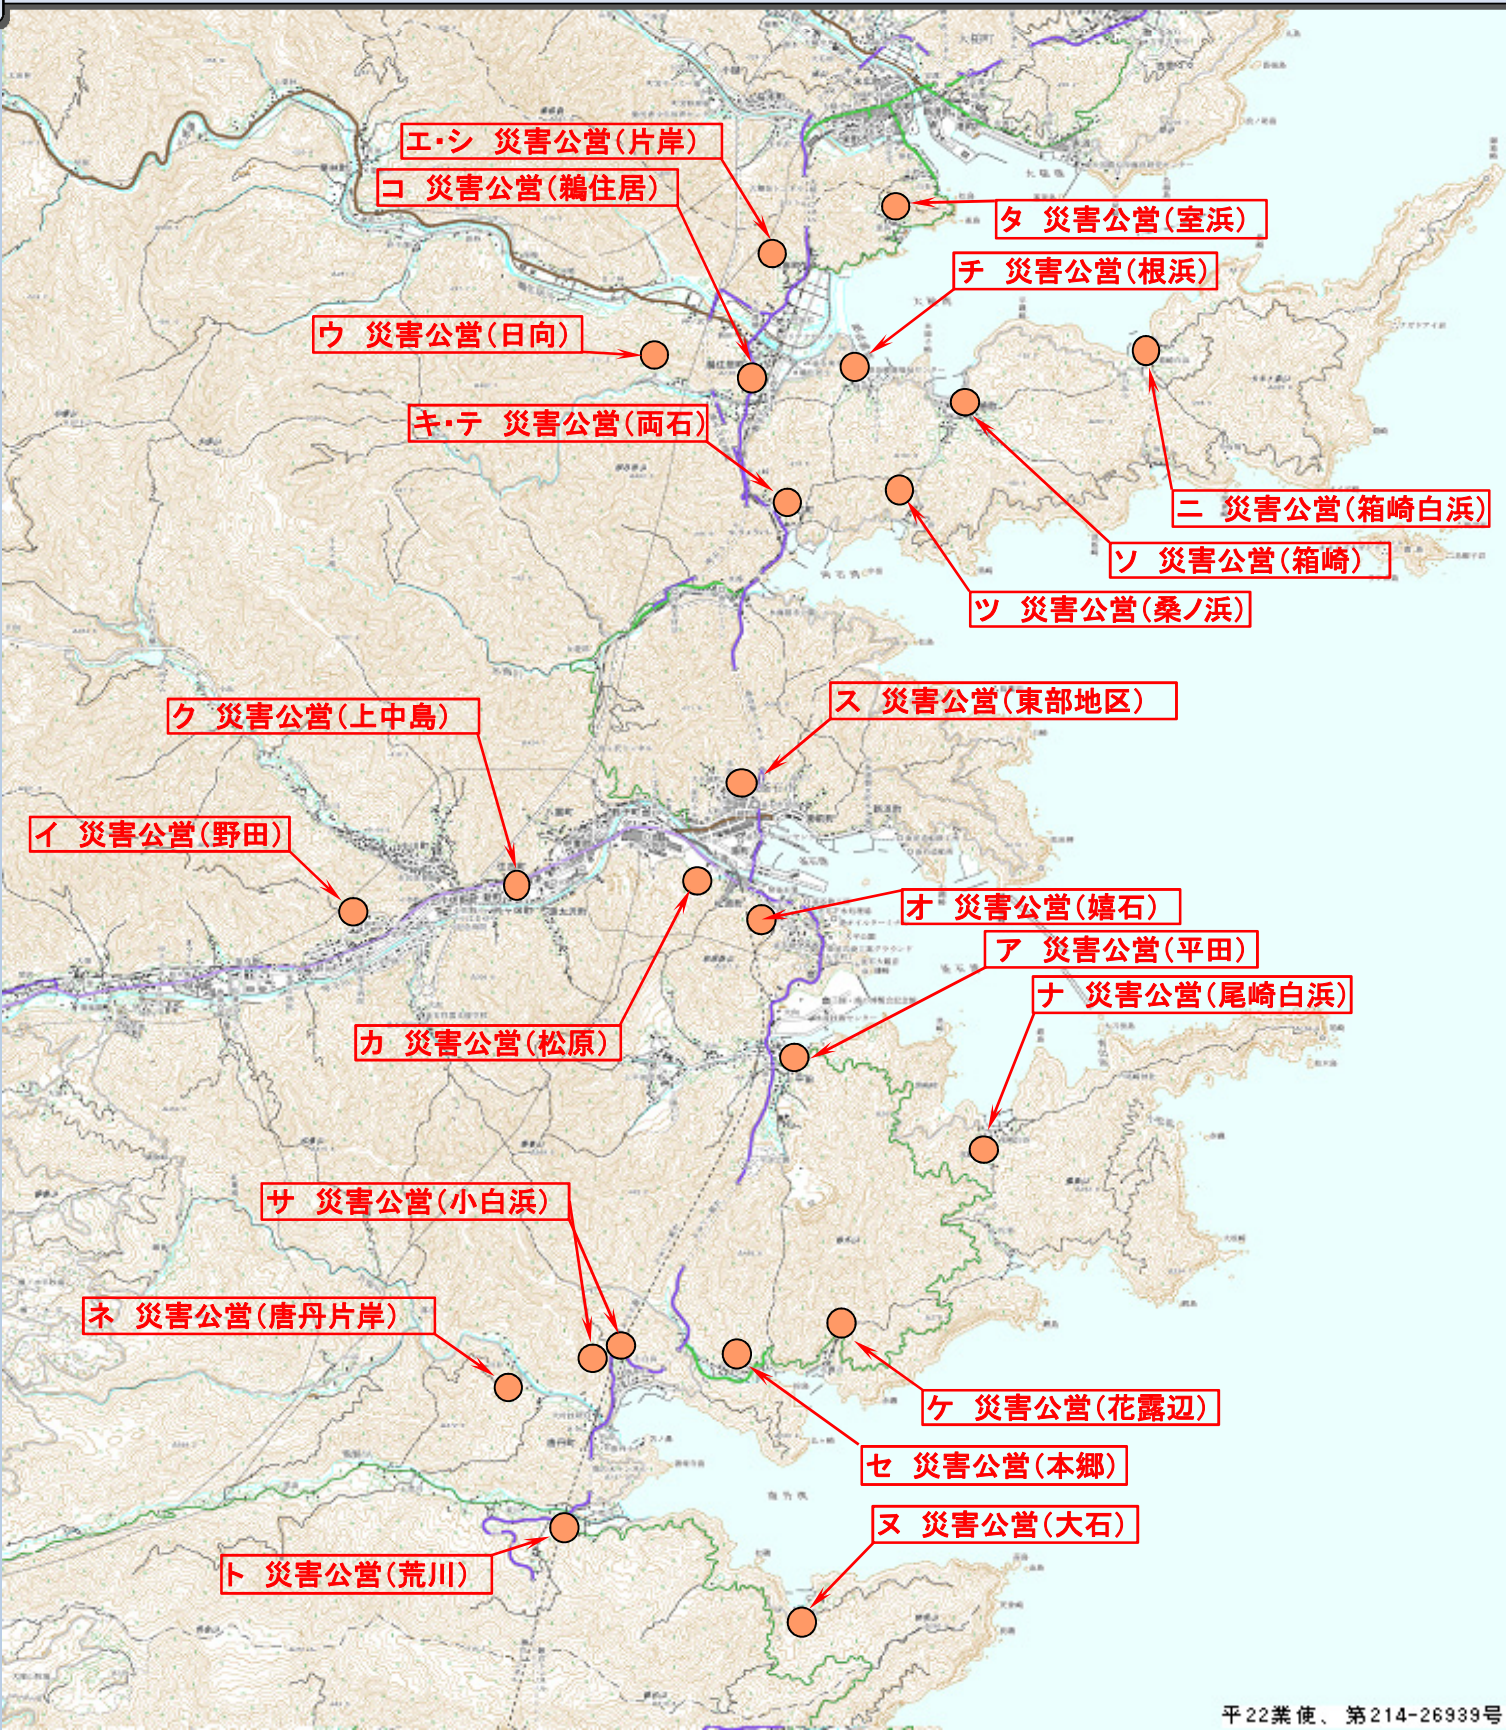

平22業使、第214-26939号


| 分野区分   | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等                 | 事業概要             | 年度別整備スケジュール                  |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|--------|-------|------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------|------|-----|----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|--|
|        |       |      |                         |                  | 第1期<br>(基礎復興期間)              |             |      | 第2期<br>(本格復興期間) |      |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     | 国復興期間 |     |     |     |    |  |
|        |       |      |                         |                  | H23                          | H24         | H25  | H26             | H27  | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32   |     |     |     |    |  |
| 災害公営住宅 | 直接建設  | 県    | ア 平田<br>(単独)            | RC造7階<br>戸数:126戸 |                              |             | 126戸 |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | イ 野田<br>(単独)            | RC造5階<br>戸数:32戸  |                              |             | 32戸  |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | ウ 日向<br>(単独)            | RC造6階<br>戸数:30戸  |                              |             |      |                 | 30戸  |     |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | エ 片岸<br>(単独)            | RC造<br>戸数:17戸    |                              |             |      |                 |      | 17戸 |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | オ 嬉石第1<br>(区:嬉石・松原地区)   | RC造<br>戸数:52戸    |                              |             |      |                 |      |     |                      | 52戸 |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | カ 嬉石第2<br>(区:嬉石・松原地区)   | RC造<br>戸数:32戸    |                              |             |      |                 |      |     |                      |     | 32戸 |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | キ 松原<br>(区:嬉石・松原地区)     | RC造<br>戸数:60戸    |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     | 60戸   |     |     |     |    |  |
|        |       |      | ク 両石<br>(防:両石地区)        | RC造<br>戸数:24戸    |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 24戸 |     |    |  |
|        | 買取    | 市    | ク 上中島①<br>(単独)          | S造3階<br>戸数:54戸   |                              |             | 54戸  |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | ク 上中島②<br>(単独)          | S造8階<br>戸数:156戸  |                              |             |      |                 | 156戸 |     |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | ケ 花露辺<br>(防:花露辺地区)      | RC造4階<br>戸数:13戸  |                              |             |      |                 |      | 13戸 |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | コ 鶴住居①<br>(区:鶴住居地区)     | 木造<br>戸数:14戸     |                              |             |      |                 |      |     | 14戸                  |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | コ 鶴住居①<br>(区:鶴住居地区)     | 木造<br>戸数:31戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     | 31戸 |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | コ 鶴住居②<br>(区:鶴住居地区)     | RC造<br>戸数:32戸    |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     | 32戸   |     |     |     |    |  |
|        |       |      | コ 鶴住居②<br>(区:鶴住居地区)     | RC造<br>戸数:43戸    |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       | 43戸 |     |     |    |  |
|        |       |      | サ 小白浜1号<br>(単独)         | S造4階<br>戸数:27戸   |                              |             |      |                 |      |     | 27戸                  |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | サ 小白浜2号<br>(単独)         | 木造<br>戸数:3戸      |                              |             |      |                 |      |     |                      | 3戸  |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      | シ 片岸<br>(区:片岸地区)        | 木造<br>戸数:18戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       | 18戸 |     |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(天神町) (単独)    | S造5階<br>戸数:52戸   |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       | 52戸 |     |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大町1号) (単独)   | S造6階<br>戸数:44戸   |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 44戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大町2号) (単独)   | 5階<br>戸数:29戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 29戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大町3号) (単独)   | 8階<br>戸数:34戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 34戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大町4号) (単独)   | RC造8階<br>戸数:41戸  |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 41戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大町5号) (単独)   | RC造6階<br>戸数:24戸  |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 24戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大町6号) (単独)   | RC造8階<br>戸数:27戸  |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 27戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(只越1号) (単独)   | S造6階<br>戸数:33戸   |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 33戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(只越2号) (単独)   | S造5階<br>戸数:11戸   |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 11戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(只越3号) (単独)   | 6階<br>戸数:19戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 19戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(只越4号) (単独)   | 8階<br>戸数:27戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 27戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(只越5号) (単独)   | 戸数:22戸           |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 22戸 |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大只越1号) (単独)  | S造5階<br>戸数:14戸   |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     | 14戸 |     |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(大只越2号) (単独)  | 5階<br>戸数:22戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 22戸 |    |  |
|        |       |      | ス 東部地区<br>(浜町) (単独)     | 5階<br>戸数:31戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 31戸 |    |  |
|        |       |      | セ 本郷<br>(防:漁:本郷地区)      | 木造<br>戸数:12戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 12戸 |    |  |
|        |       |      | ソ 箱崎(上前)<br>(防:漁:箱崎地区)  | 木造<br>戸数:10戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 10戸 |    |  |
|        |       |      | ソ 箱崎(野川前)<br>(防:漁:箱崎地区) | 木造<br>戸数:17戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 17戸 |    |  |
|        |       |      | ソ 箱崎(横瀬)<br>(防:漁:箱崎地区)  | 木造<br>戸数:4戸      |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 4戸  |    |  |
|        |       |      | タ 室浜<br>(防:漁:室浜地区)      | 木造<br>戸数:7戸      |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 7戸  |    |  |
|        |       |      | チ 根浜<br>(防:漁:根浜地区)      | 木造<br>戸数:10戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 10戸 |    |  |
|        |       |      | ツ 桑ノ浜<br>(防:漁:桑ノ浜地区)    | 木造<br>戸数:8戸      |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 8戸  |    |  |
|        |       |      | テ 両石<br>(防:漁:両石地区)      | 木造<br>戸数:25戸     |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 25戸 |    |  |
|        |       |      | ト 荒川<br>(防:荒川地区)        | 木造<br>戸数:8戸      |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     | 8戸  |    |  |
|        |       |      | 直接建設                    | 県                | ナ 尾崎白浜<br>(防:尾崎白浜地区)<br>(単独) | 木造<br>戸数:5戸 |      |                 |      |     | 5戸                   |     |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      |                         |                  | ニ 箱崎白浜<br>(単独)               | 木造<br>戸数:9戸 |      |                 |      |     |                      | 9戸  |     |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      |                         |                  | ヌ 大石<br>(単独)                 | 木造<br>戸数:3戸 |      |                 |      |     |                      |     | 3戸  |       |     |     |     |    |  |
|        |       |      |                         |                  | ネ 唐丹片岸<br>(単独)               | 木造<br>戸数:4戸 |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     |     | 4戸 |  |
|        |       |      |                         |                  |                              |             |      |                 |      |     |                      |     |     |       |     |     |     |    |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市5/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

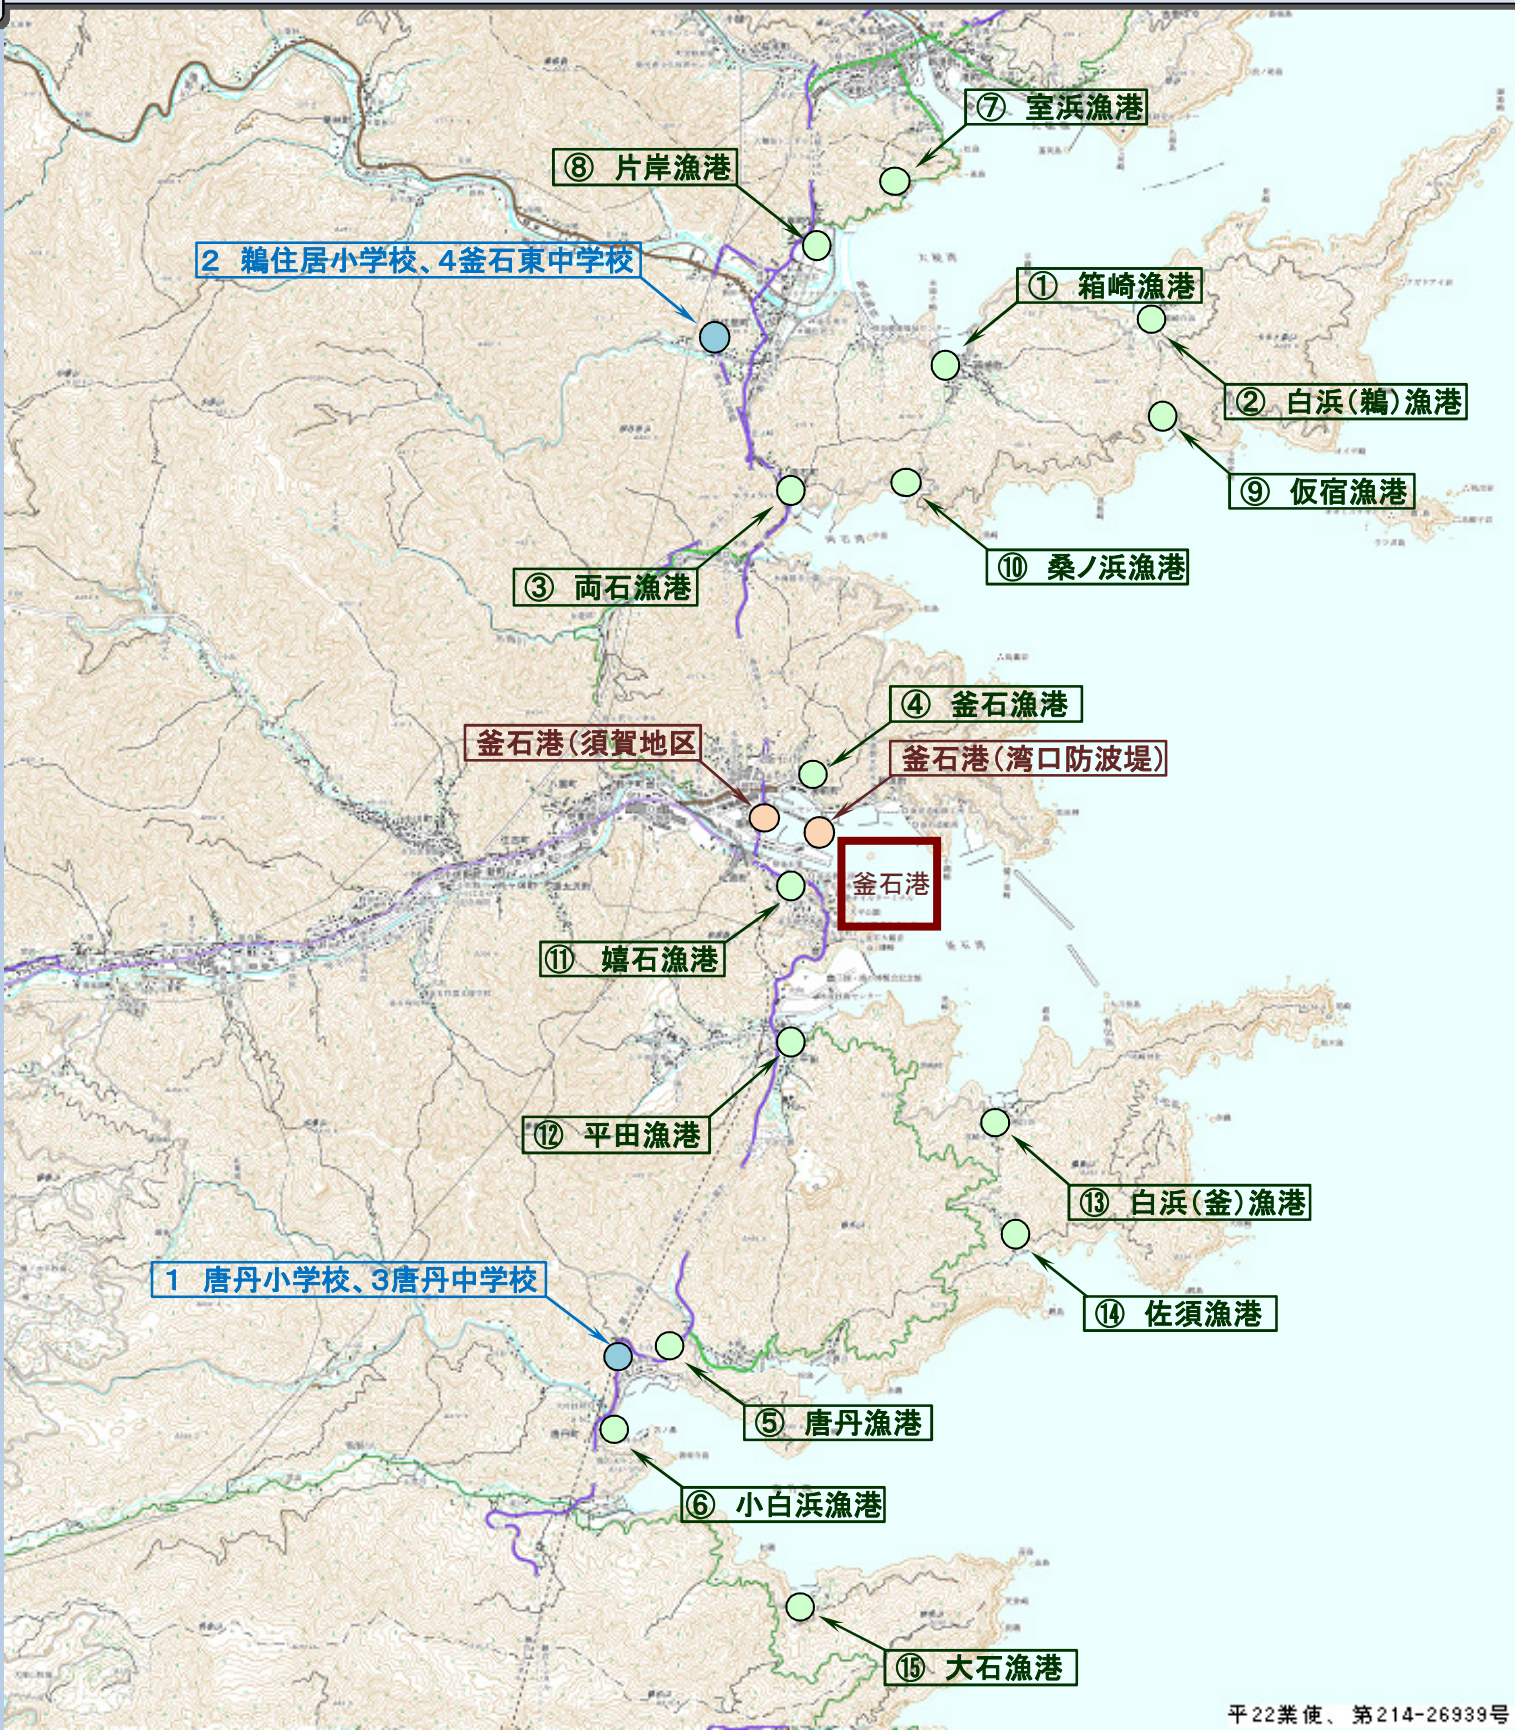


| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等   | 事業概要   | 年度別整備スケジュール     |     |     |                 |           |          |                      |  |     |  | 国復興期間 |  |     |
|------|-------|------|-----------|--|-----------------|-----|-----|-----------------|-----------|----------|----------------------|--|-----|--|-------|--|-----|
|      |       |      |           |  | 第1期<br>(基盤復興期間) |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |           |          | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      |           |  | H23             | H24 | H25 | H26             | H27       | H28      | H29                  |  | H30 |  |       |  | H31 |
| 漁 港  | 漁 港   | 県    | ① 箱崎漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=624m、<br>岸壁L=889m 他                               |                 |     |     | ■H27.3完成        |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ② 白浜(鵜)漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=505m、<br>岸壁L=504m 他                               |                 |     |     | ■H27.1完成        |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ③ 両石漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=596m、<br>岸壁L=834m 他                               |                 |     |     |                 | ■H28.3完成  |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ④ 釜石漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=1,120m、<br>岸壁L=1,898m 他                           |                 |     |     |                 |           | ■H29.3完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑤ 唐丹漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=623m、<br>岸壁L=572m 他                               |                 |     |     | ■H27.3完成        |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑥ 小白浜漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=819m、<br>岸壁L=834m 他                               |                 |     |     | ■H26.12完成       |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       | 市    | ⑦ 室浜漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=163m、<br>岸壁L=190m 他                               |                 |     |     |                 | ■H28.3完成  |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑧ 片岸漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=72m、<br>岸壁L=135m 他                                |                 |     |     | ■H27.3完成        |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑨ 仮宿漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=130m、<br>岸壁L=60m 他                                |                 |     |     | ■H27.3完成        |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑩ 桑ノ浜漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=209m、<br>岸壁L=250m 他                               |                 |     |     | ■H27.3完成        |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑪ 嬉石漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=76m、<br>岸壁L=304m 他                                |                 |     |     |                 |           | ■H29.3完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑫ 平田漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=215m、<br>岸壁L=598m 他                               |                 |     |     | ■H27.3完成        |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑬ 白浜(釜)漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=449m、<br>岸壁L=378m 他                               |                 |     |     |                 | ■H27.10完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑭ 佐須漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=174m、<br>岸壁L=103m 他                               |                 |     |     |                 | ■H28.3完成  |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | ⑮ 大石漁港    | (漁港災害)<br>防波堤L=361m、<br>岸壁L=233m 他                               |                 |     |     |                 | ■H27.12完成 |          |                      |  |     |  |       |  |     |
| 港 湾  | 釜石港   | 国    | A 湾口防波堤   | (直轄災害復旧)<br>防波堤L=1,660m  | ★工事(平成29年度完成予定) |     |     |                 |           |          |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       | 県    | B 須賀地区    | (災害復旧)<br>南防波堤L=266m、<br>-4.0m1号物揚場<br>L=200m、<br>-7.5m岸壁L=152m他 |                 |     |     |                 | ■H28.3完成  |          |                      |  |     |  |       |  |     |
| 教 育  | 小学校   | 市    | 1 唐丹小学校   | (災害復旧)<br>移転   |                 |     |     |                 |           | ■H29.2完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 2 鶴住居小学校  | (災害復旧)<br>移転   |                 |     |     |                 |           | ■H29.3完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      | 中学校   |      | 3 唐丹中学校   | (災害復旧)<br>現敷地で新築   |                 |     |     |                 |           | ■H29.2完成 |                      |  |     |  |       |  |     |
|      |       |      | 4 釜石東中学校  | (災害復旧)<br>移転   |                 |     |     |                 |           | ■H29.3完成 |                      |  |     |  |       |  |     |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市1/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

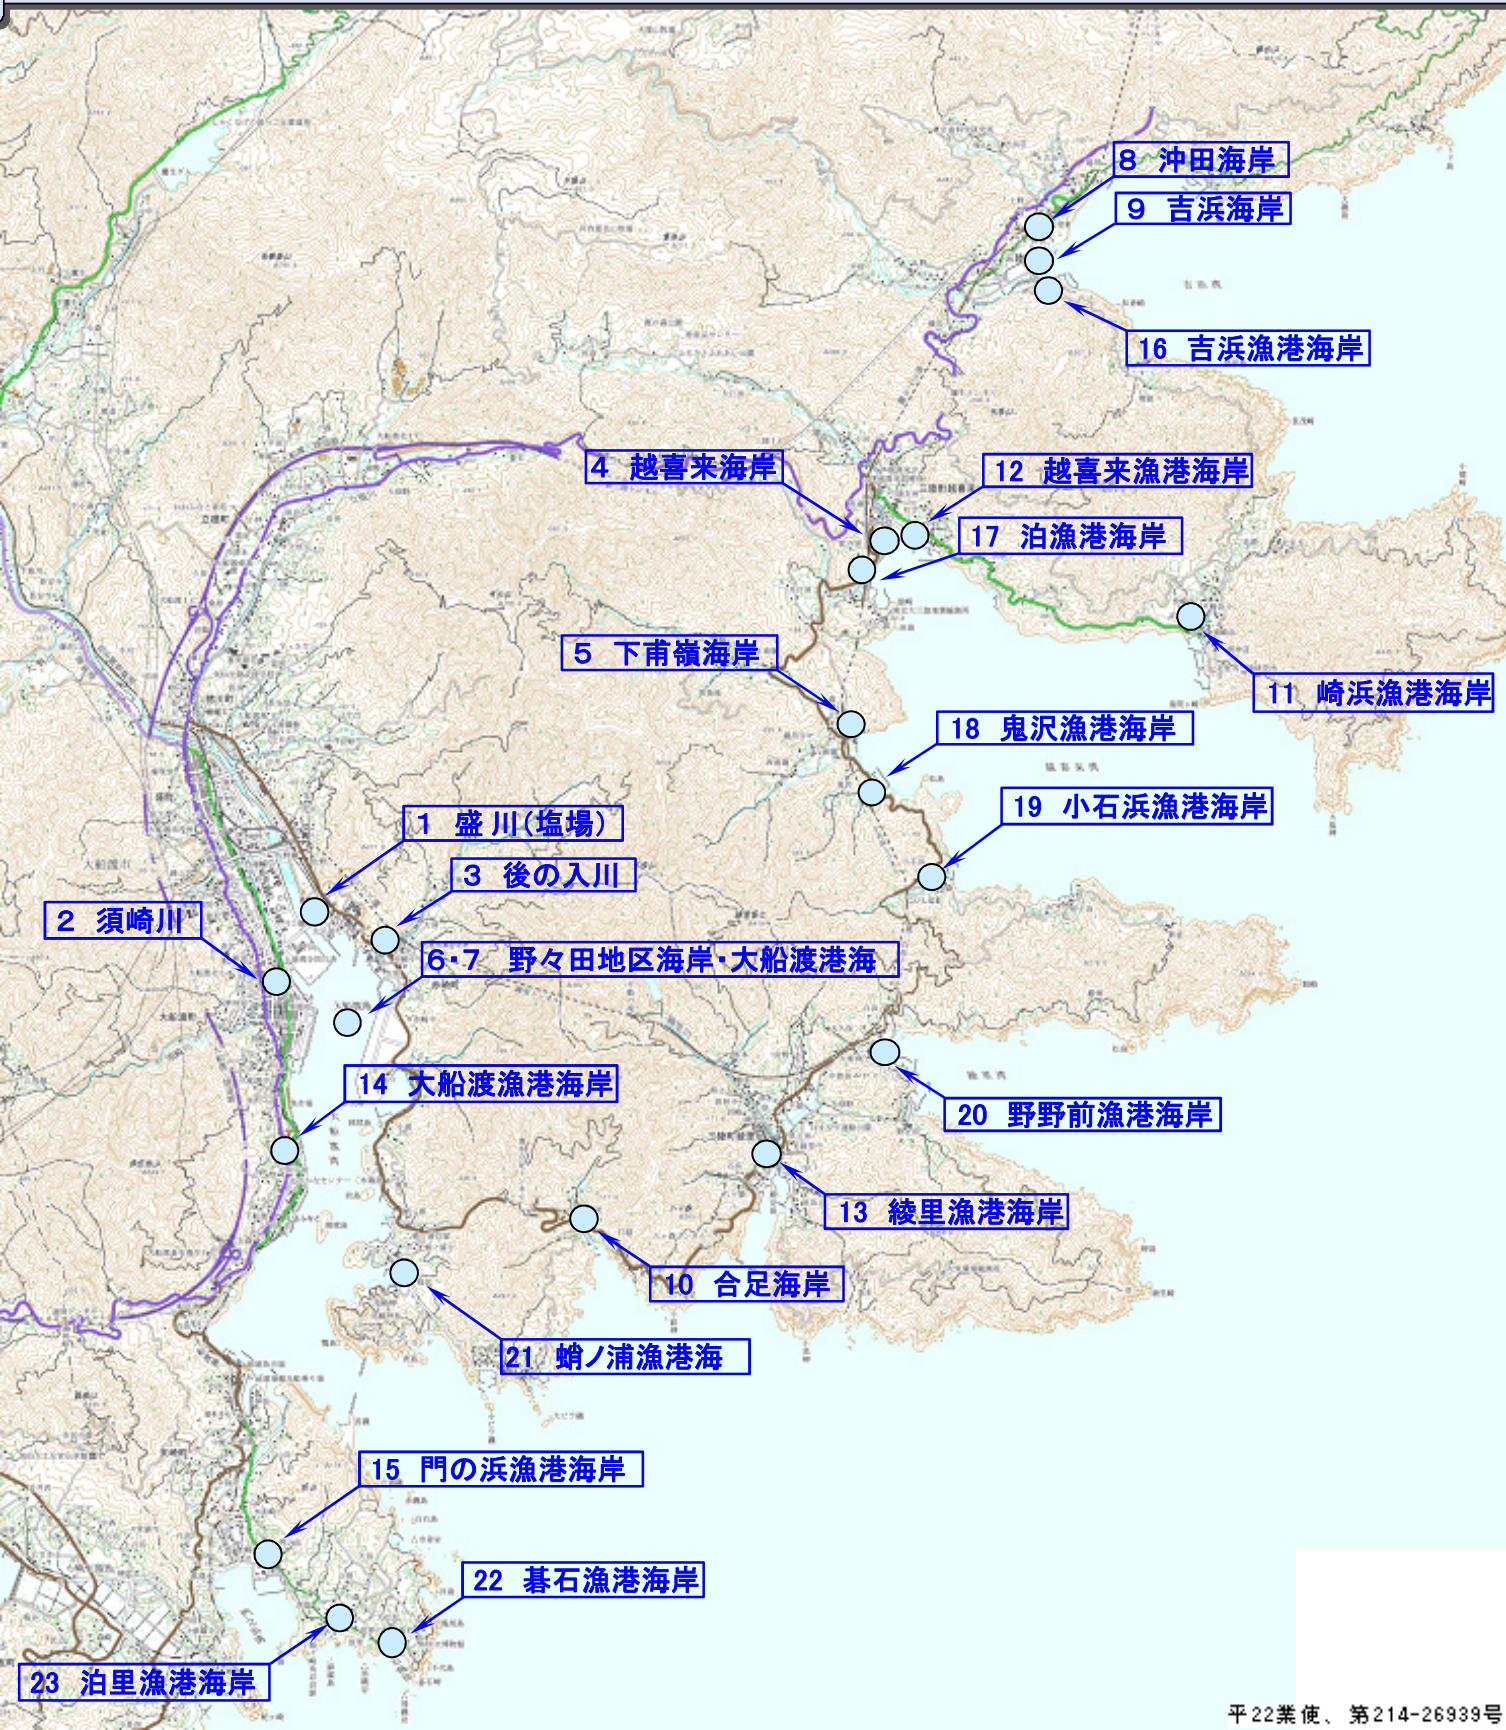

平22業使、第214-26939号


| 分野区分       | 細分項目等        | 事業主体 | 路線・箇所名等             | 事業概要                                 | 年度別整備スケジュール     |     |                 |           |     |                      |           |     |  |  | 国復興期間 |     |
|------------|--------------|------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|--|--|-------|-----|
|            |              |      |                     |                                      | 第1期<br>(基礎復興期間) |     | 第2期<br>(本格復興期間) |           |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |           |     |  |  | H31   | H32 |
|            |              |      |                     |                                      | H23             | H24 | H25             | H26       | H27 | H28                  | H29       | H30 |  |  |       |     |
| 海岸保全<br>施設 | 一般海岸<br>港湾海岸 | 県    | 1 盛川(塩場)            | (災害復旧)<br>防潮堤L=2.3km                 |                 |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 2 須崎川               | (三陸高潮)<br>水門N=1基                     | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 3 後の入川              | (三陸高潮)<br>水門N=1基                     | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 4 越喜来海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.9km、<br>水門N=2基他     |                 |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 5 下甫嶺海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=2基他     |                 |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 6 野々田<br>地区海岸       | (港湾高潮)<br>防潮堤L=4.1km                 | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 7 大船渡海岸             | (災害復旧)<br>防潮堤L=3.6km、<br>水門等N=38基    | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            | 農地海岸         | 県    | 8 沖田海岸              | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.2km             |                 |     | ■H25.6完成        |           |     |                      |           |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 9 吉浜海岸              | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門等N=2基 |                 |     |                 |           |     |                      | ■H29.3完成  |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 10 合足海岸             | (海岸保全施設災害)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門等N=2基 |                 |     |                 |           |     | ■H28.3完成             |           |     |  |  |       |     |
|            | 漁港海岸         | 市    | 11 崎浜漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km、<br>水門N=3基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 12 越喜来<br>漁港海岸      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km、<br>水門N=1基      |                 |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 13-1 綾里漁港海岸         | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門N=3基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 13-2 綾里<br>(石浜地区)   | (海岸高潮)<br>防潮堤L=0.3km、<br>水門N=1基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 14-1 大船渡<br>漁港海岸    | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.5km、<br>水門N=10基     | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 14-2 大船渡<br>(細浦他地区) | (海岸高潮)<br>防潮堤L=1.7km、<br>水門N=7基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 15 門の浜<br>漁港海岸      | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.6km、<br>水門N=2基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 16 吉浜<br>漁港海岸       | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.1km                 |                 |     |                 |           |     |                      | ■H28.11完成 |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 17 泊漁港海岸            | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.3km                 |                 |     |                 |           |     |                      | ■H29.3完成  |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 18 鬼沢<br>漁港海岸       | (災害復旧)<br>海岸護岸L=0.1km                |                 |     |                 | ■H26.12完成 |     |                      |           |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 19 小石浜<br>漁港海岸      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基      |                 |     |                 |           |     |                      | ■H29.3完成  |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 20 野野前<br>漁港海岸      | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=2基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 21 蛸ノ浦<br>漁港海岸      | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.5km、<br>水門N=5基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 22 碁石漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基      |                 |     |                 |           |     |                      | ■H28.7完成  |     |  |  |       |     |
|            |              |      | 23 泊里漁港海岸           | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.4km、<br>水門N=1基      | 用地、設計等          |     |                 |           |     |                      | ★工事       |     |  |  |       |     |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市2/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

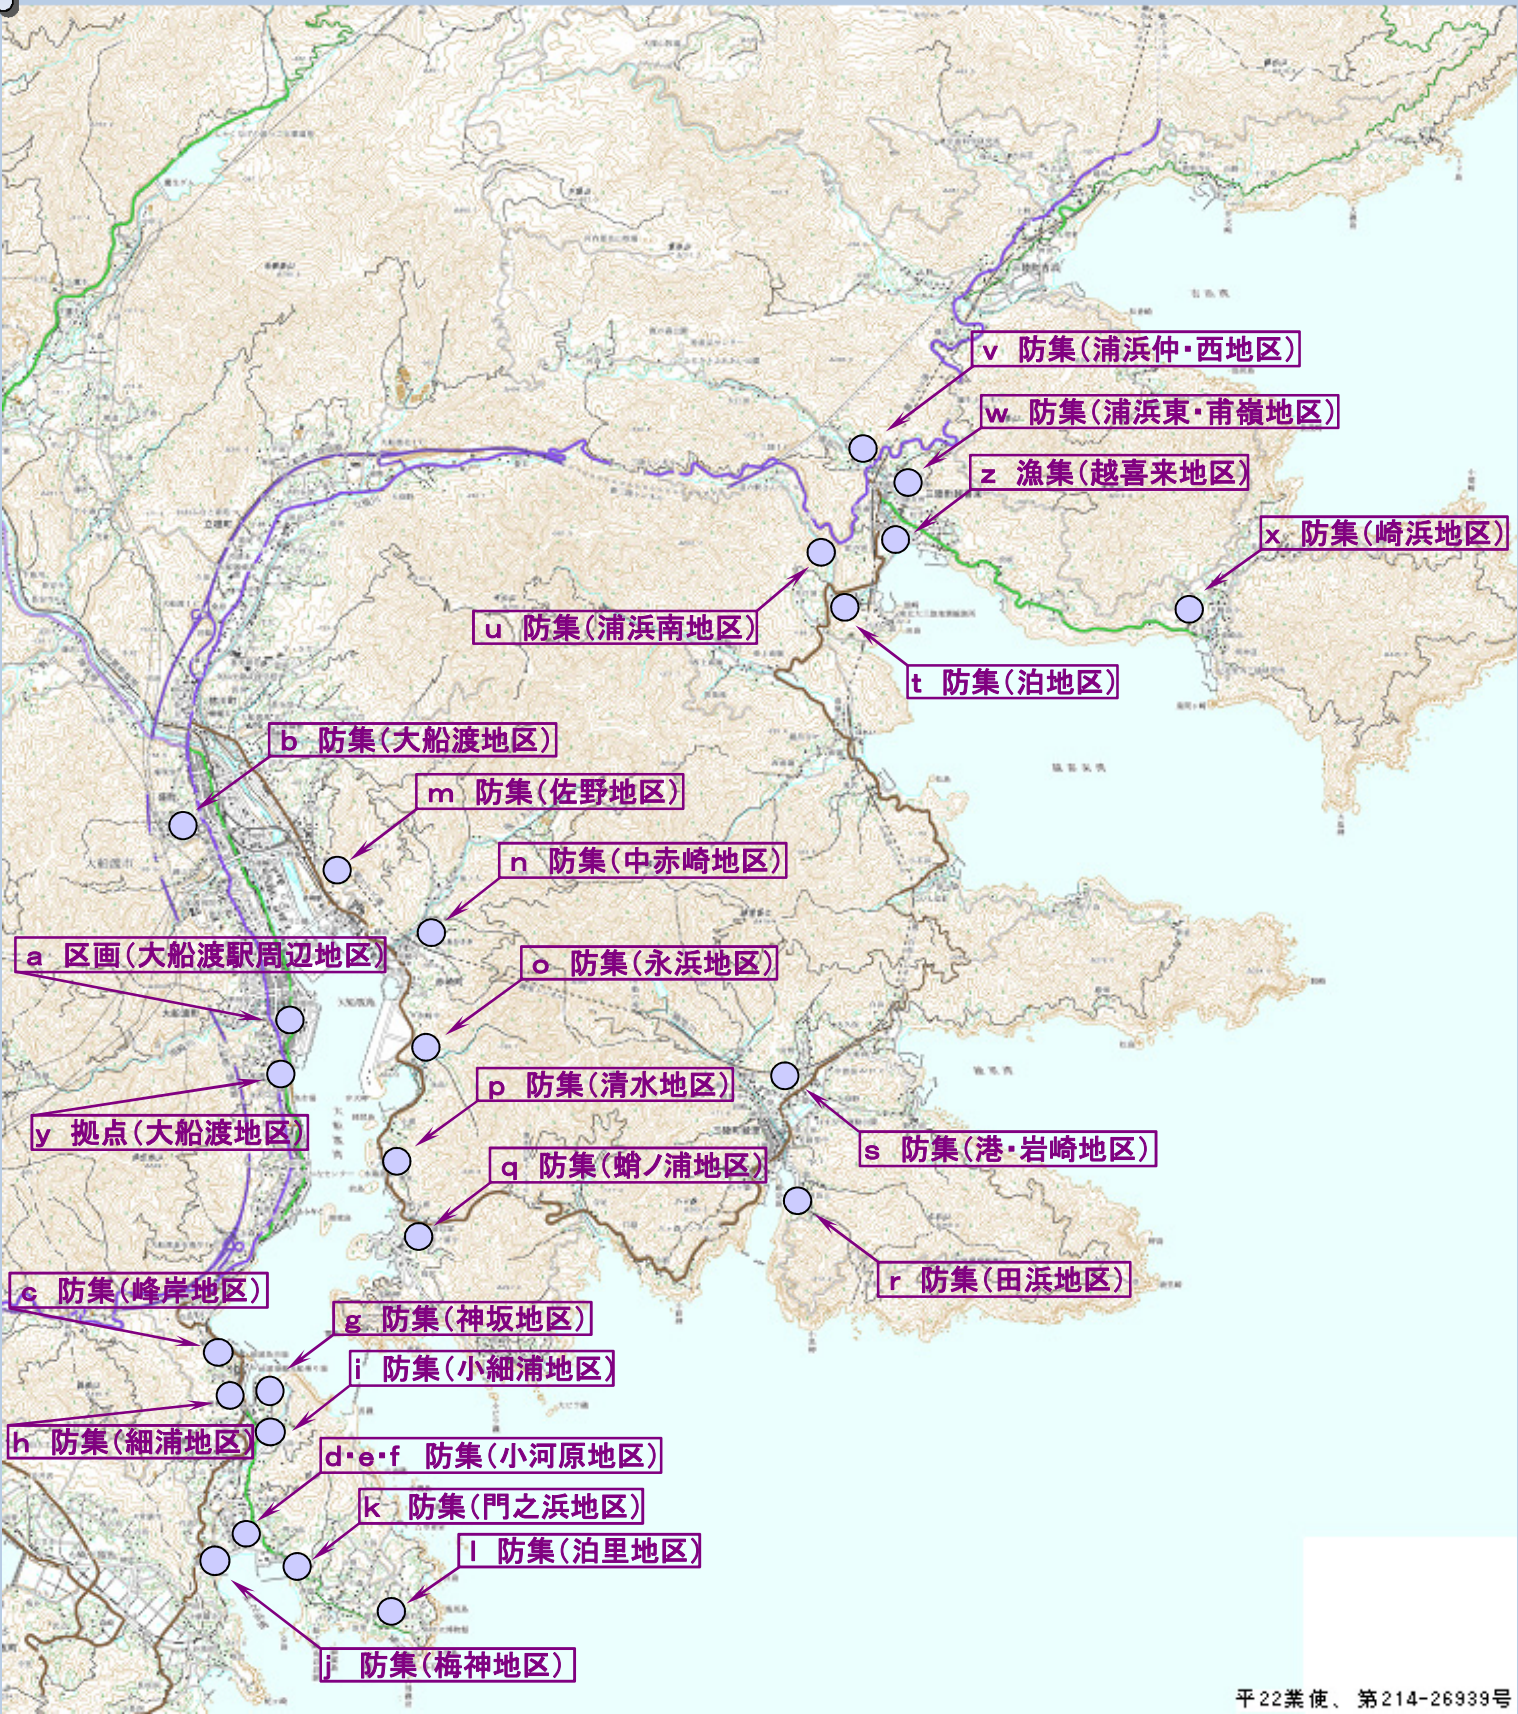

平 22 業 使、第 214-26939 号


| 分野区分           |        | 細分項目等 | 事業主体            | 路線・箇所名等                                  | 事業概要   | 年度別整備スケジュール     |           |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|----------------|--------|-------|-----------------|--|--------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|                |        |       |                 |  |        | 第1期<br>(基盤復興期間) |           |                               | 第2期<br>(本格復興期間) |                      |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     | 国復興期間 |  |  |  |  |  |
|                |        |       |                 |  |        | H23             | H24       | H25                           | H26             | H27                  | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32   |  |  |  |  |  |
| 復興<br>まちづくり    | 土地区画整理 | 市     | a 大船渡<br>駅周辺地区  | 区域面積：約33.8ha<br>対象戸数281戸<br>(民231戸・公50戸) | 用地、設計等 |                 |           | ★工事                           |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | b 大船渡地区         | 対象戸数：18戸<br>(民18戸)                       |        |                 |           | 民18戸<br>■H27.5完成              |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | c 峰岸地区          | 対象戸数：21戸<br>(民21戸)                       |        |                 |           | 民21戸<br>■H27.6完成              |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | d 小河原地区<br>(平林) | 対象戸数：29戸<br>(民29戸)                       |        |                 |           | 民29戸<br>■H27.6完成              |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | e 小河原地区<br>(上山) | 対象戸数：6戸<br>(民6戸)                         |        |                 |           | 民6戸<br>■H27.4完成               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | f 小河原地区<br>(鶴巻) | 対象戸数：6戸<br>(民6戸)                         |        |                 | ■H26.10完成 |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | g 神坂地区          | 対象戸数：9戸<br>(民9戸)                         |        |                 | ■H27.3完成  |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | h 細浦地区          | 対象戸数：13戸<br>(民13戸)                       |        |                 | ■H27.1完成  |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | i 小細浦地区         | 対象戸数：8戸<br>(民8戸)                         |        | ■H25.12完成       |           |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | j 梅神地区          | 対象戸数：13戸<br>(民13戸)                       |        |                 |           | 民3戸 民10戸<br>■H27.4完成          |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | k 門之浜地区         | 対象戸数：13戸<br>(民13戸)                       |        |                 | ■H26.3完成  |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | l 泊里地区          | 対象戸数：17戸<br>(民17戸)                       |        |                 |           | 民17戸<br>■H27.7完成              |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | m 佐野地区          | 対象戸数：5戸<br>(民5戸)                         |        |                 | ■H26.4完成  |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | n 中赤崎地区         | 対象戸数：59戸<br>(民59戸)                       |        |                 |           | 民5戸 民7戸 民10戸 民37戸<br>■H29.9完成 |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | o 永浜地区          | 対象戸数：28戸<br>(民28戸)                       |        |                 |           | 民1戸 民27戸<br>■H28.11完成         |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | p 清水地区          | 対象戸数：6戸<br>(民6戸)                         |        |                 | ■H26.8完成  |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | q 蛸ノ浦地区         | 対象戸数：16戸<br>(民16戸)                       |        |                 |           | 民2戸 民4戸 民16戸<br>■H27.10完成     |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | r 田浜地区          | 対象戸数：12戸<br>(民12戸)                       |        |                 |           | 民12戸<br>■H26.5完成              |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | s 港・岩崎地区        | 対象戸数：23戸<br>(民23戸)                       |        |                 |           | 民23戸<br>■H26.6完成              |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | t 泊地区           | 対象戸数：13戸<br>(民13戸)                       |        |                 | ■H26.1完成  |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | u 浦浜南地区         | 対象戸数：11戸<br>(民11戸)                       |        |                 |           | 民11戸<br>■H26.12完成             |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | v 浦浜仲・西地区       | 対象戸数：10戸<br>(民10戸)                       |        |                 |           | 民10戸<br>■H26.12完成             |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | w 浦浜東・<br>甫嶺地区  | 対象戸数：9戸<br>(民9戸)                         |        |                 |           | 民9戸<br>■H27.3完成               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       | x 崎浜地区          | 対象戸数：21戸<br>(民21戸)                       |        |                 |           | 民21戸<br>■H27.6完成              |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                | 津波復興拠点 |       | y 大船渡地区         | 区域面積：約2.3ha<br>(先行整備区域)                  |        |                 |           | ★工事                           |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|                |        |       |                 | 区域面積：約5.4ha<br>(第2段階整備区域)                |        | 用地、設計等          | ★工事       |                               |                 |                      |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
| 漁業集落防災<br>機能強化 |        | 市     | z 越喜来地区         | 対象戸数：30戸<br>(民30戸)                       |        |                 |           |                               |                 | 民8戸 民22戸<br>■H29.9完成 |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市3/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

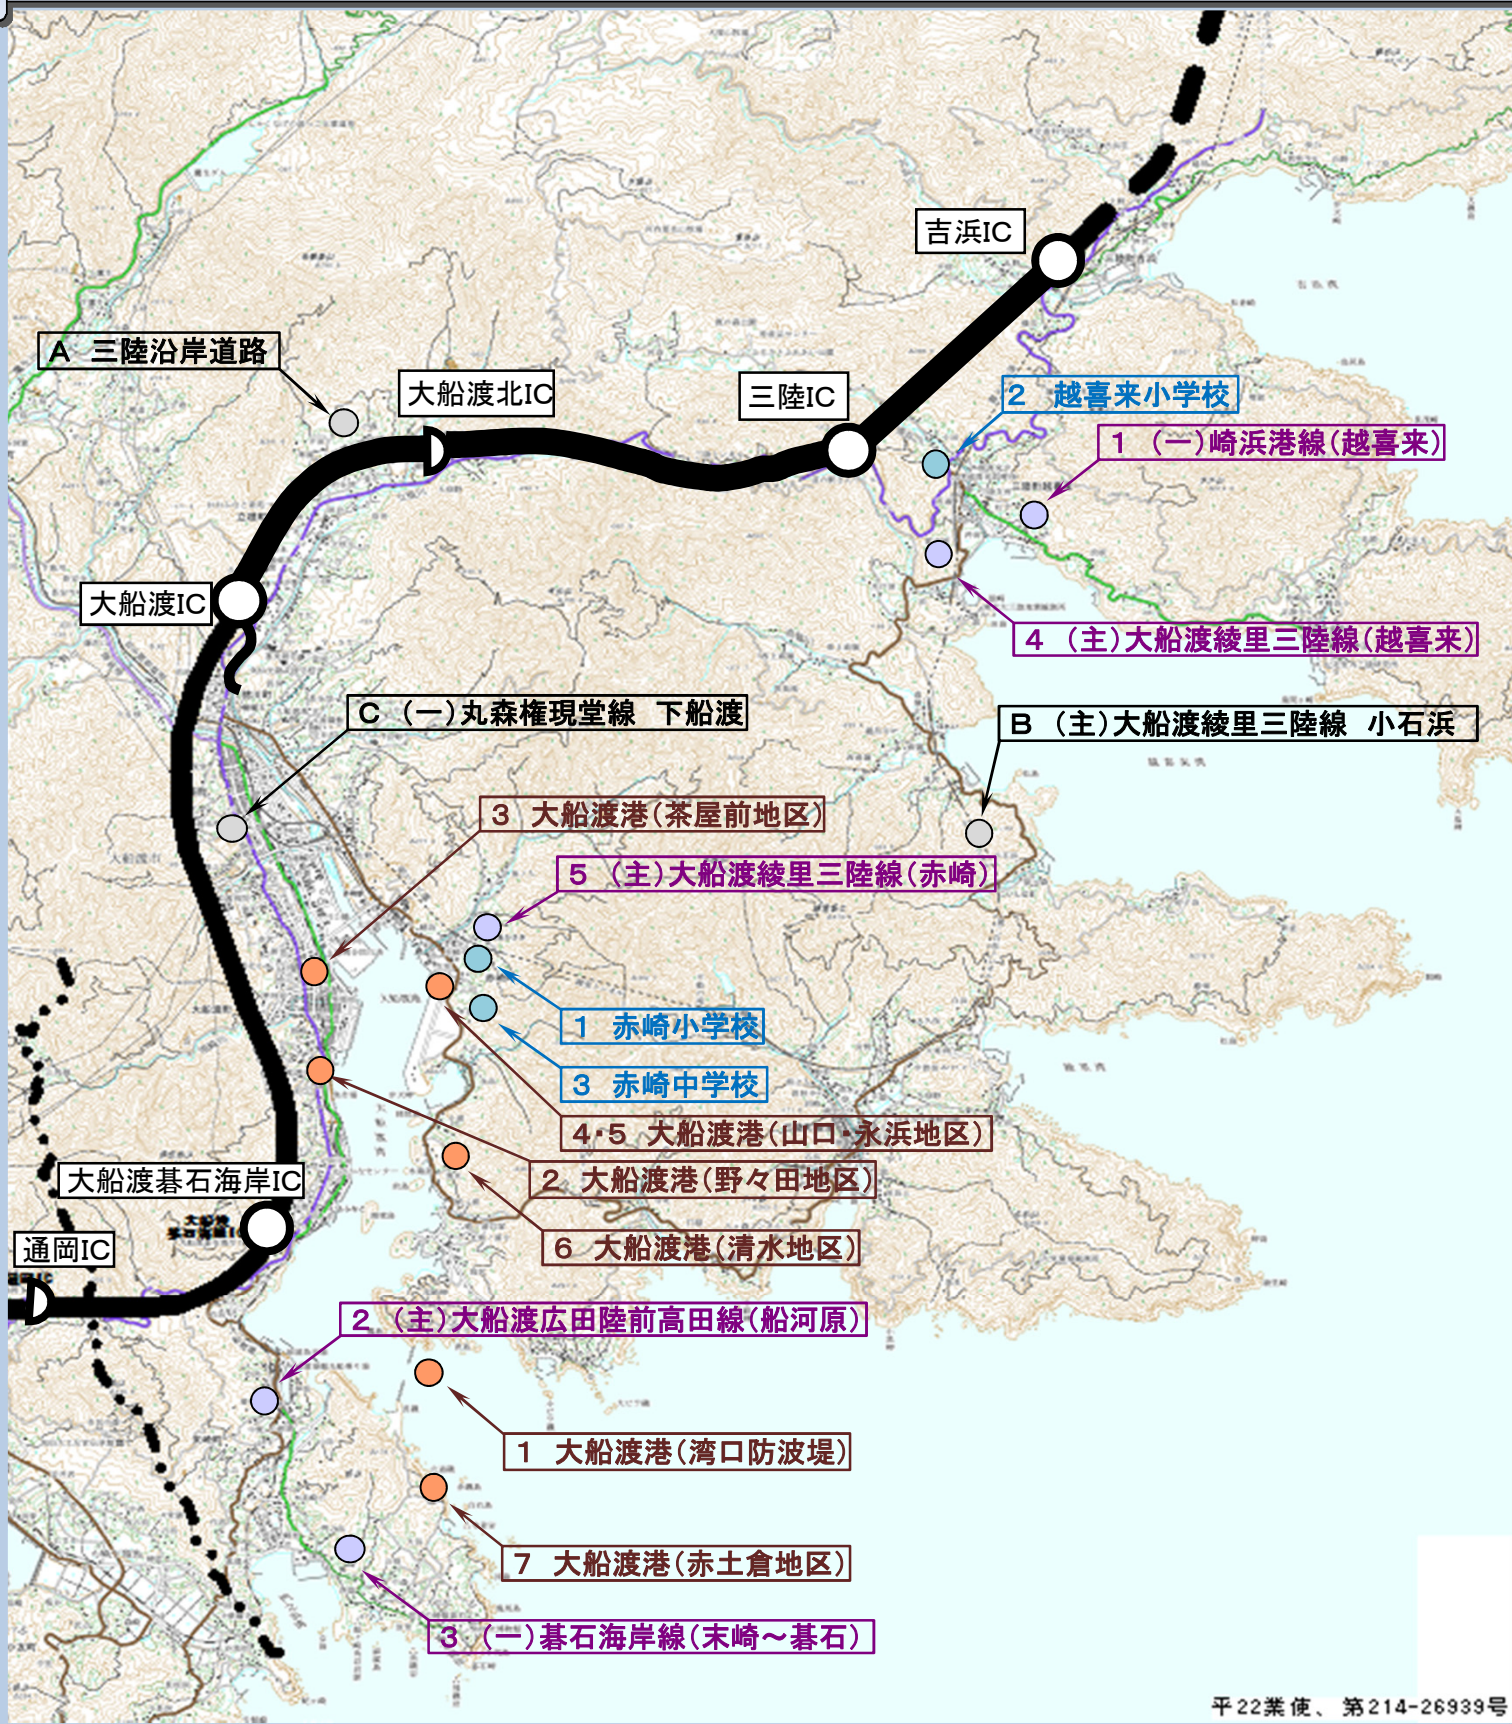

平22業使、第214-26939号


| 分野区分        | 細分項目等         | 事業主体 | 路線・箇所名等             | 事業概要   | 年度別整備スケジュール            |     |     |                                     |          |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
|-------------|---------------|------|---------------------|--|------------------------|-----|-----|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-------|--|--|--|
|             |               |      |                     |  | 第1期<br>(基盤復興期間)        |     |     | 第2期                                 |          |                                     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |               |     | 国復興期間 |  |  |  |
|             |               |      |                     |  | H23                    | H24 | H25 | H26                                 | H27      | H28                                 | H29                  | H30           | H31 | H32   |  |  |  |
| 復興<br>まちづくり | まちづくり<br>連携道路 | 県    | 1 (一)崎浜港線           | 越喜来  |                        |     |     |                                     |          |                                     |                      | ■H29.7.18供用開始 |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 2 (主)大船渡広田<br>陸前高田線 | 船河原  |                        |     |     | ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手<br>◆H29.3着工 |          |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 3 (一)碁石海岸線          | 末崎～碁石  |                        |     |     | ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手<br>◆H29.3着工 |          |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 4 (主)大船渡<br>綾里三陸線   | 越喜来  |                        |     |     |                                     |          | ■H29.7.10供用開始                       |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 5 (主)大船渡<br>綾里三陸線   | 赤崎   |                        |     |     | ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手<br>◆H28.8着工 |          |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
| 復興道路等       | 復興道路          | 国    | A 三陸沿岸道路            | 吉浜釜石道路<br>(吉浜～釜石)  | ◆H25.2.25起工式 ★用地買収、工事等 |     |     |                                     |          |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      |                     | 吉浜道路   |                        |     |     |                                     |          | ■H27.11.29供用開始                      |                      |               |     |       |  |  |  |
|             | 復興関連道路        | 県    | B (主) 大船渡<br>綾里三陸線  | 小石浜  |                        |     |     |                                     |          |                                     |                      | ■H29.3.25供用開始 |     |       |  |  |  |
|             |               |      | C (一)<br>丸森権現堂線     | 下船渡  |                        |     |     |                                     |          | ★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手<br>◆H29.3着工 |                      |               |     |       |  |  |  |
| 港 湾         | 大船渡港          | 県    | 1 湾口防波堤             | (直轄災害復旧)<br>防波堤L=535m  |                        |     |     |                                     |          |                                     | ■H29.3完成             |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 2 野々田地区             | (災害復旧)<br>防波堤L=170m、<br>須崎防波堤L=60m、<br>-4.5m岸壁L=150m、<br>-3.0m物揚場L=87m他          |                        |     |     |                                     | ■H28.3完成 |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 3 茶屋前地区             | (災害復旧)<br>-9.0m岸壁L=428m、<br>-6.0m岸壁L=105m、<br>-3.0m物揚場L=376m、<br>-4.0m物揚場L=197m他 |                        |     |     |                                     | ■H28.3完成 |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 4 山口地区              | (災害復旧)<br>防波堤L=64m、<br>さん橋(-2.0m)L=32m、<br>物揚場L=70m他                             |                        |     |     |                                     |          | ■H29.3完成                            |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 5 永浜地区              | (災害復旧)<br>防波堤L=192m、<br>-2.0m物揚場L=108m、<br>-2.0m2号物揚場138m                        |                        |     |     |                                     |          | ■H29.3完成                            |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 6 清水地区              | (災害復旧)<br>防波堤L=109m、<br>物揚場L=285m、<br>船揚場L=98m                                   |                        |     |     |                                     |          | ■H29.3完成                            |                      |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 7 赤土倉地区             | (災害復旧)<br>南防波堤L=79m、<br>北防波堤L=165m、<br>-2.0m2号物揚場<br>L=104m他                     |                        |     |     |                                     | ■H28.3完成 |                                     |                      |               |     |       |  |  |  |
| 教 育         | 小学校           | 市    | 1 赤崎小学校             | (災害復旧)<br>移転   |                        |     |     |                                     |          |                                     | ■H29.3完成             |               |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 2 越喜来小学校            | (災害復旧)<br>移転   |                        |     |     |                                     |          |                                     | ■H28.10完成            |               |     |       |  |  |  |
|             | 中学校           |      | 3 赤崎中学校             | (災害復旧)<br>移転   |                        |     |     |                                     |          |                                     | ■H29.3完成             |               |     |       |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市4/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

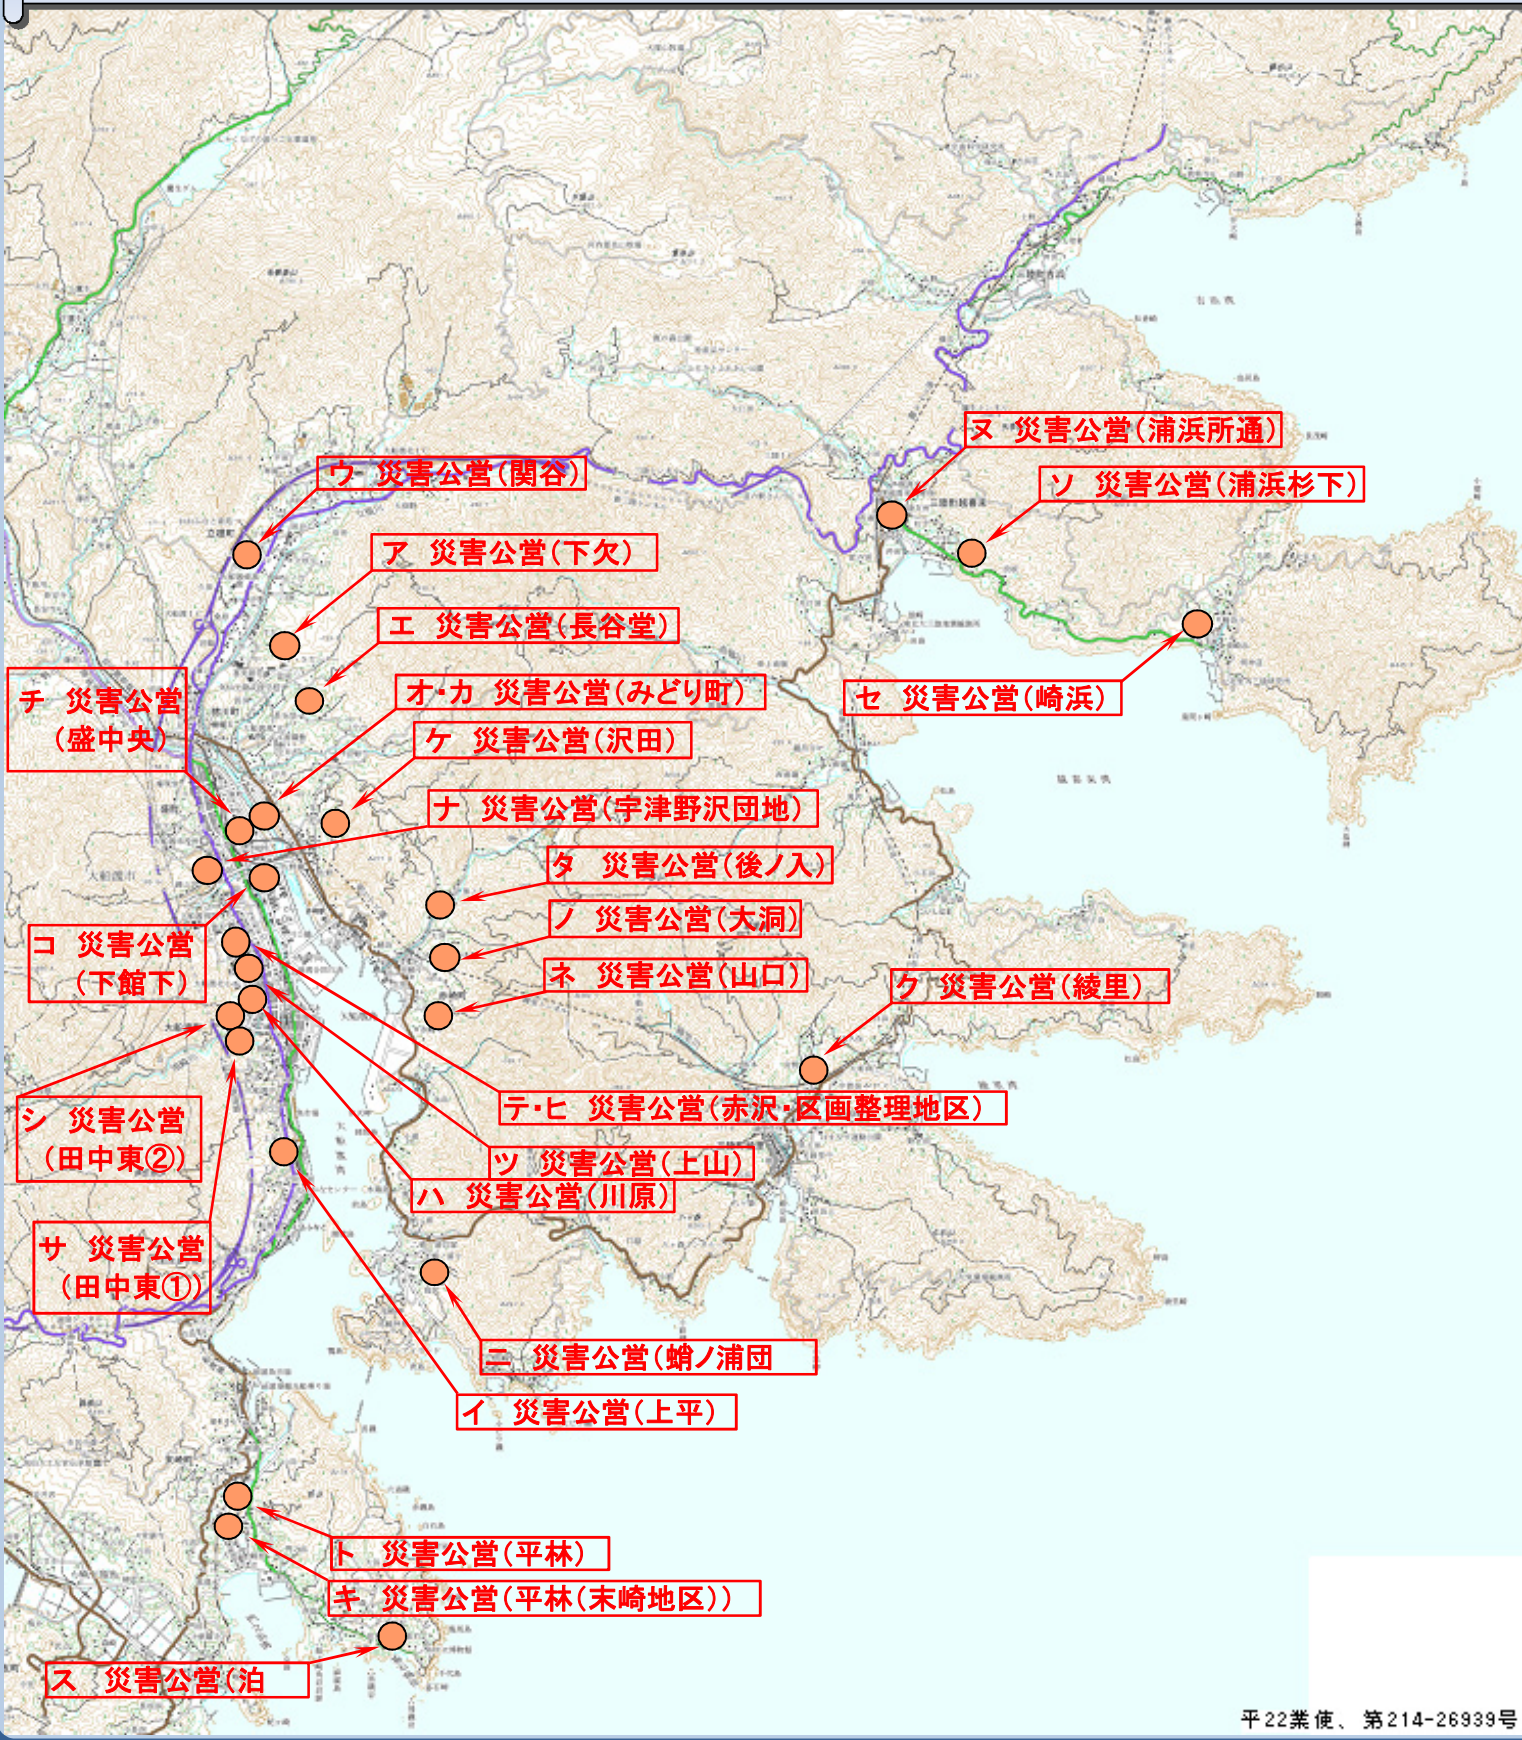

平22業使、第214-26939号


| 分野区分                     | 細分項目等           | 事業主体            | 路線・箇所名等                   | 事業概要            | 年度別整備スケジュール     |     |            |                 |            |            |                      |     |     |     | 国復興期間 |  |  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----|------------|-----------------|------------|------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|--|--|
|                          |                 |                 |                           |                 | 第1期<br>(基礎復興期間) |     |            | 第2期<br>(本格復興期間) |            |            | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 |                           |                 | H23             | H24 | H25        | H26             | H27        | H28        | H29                  | H30 | H31 | H32 |       |  |  |
| 災害公営住宅                   | 直接建設            | 県               | ア 下欠<br>(単独)              | RC造3階<br>戸数:33戸 |                 |     |            | ■ H27.1完成       |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | イ 上平<br>(単独)              | RC造7階<br>戸数:65戸 |                 |     |            |                 | ■ H27.6完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ウ 関谷<br>(単独)              | RC造5階<br>戸数:50戸 |                 |     |            |                 |            | ■ H28.4完成  |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | エ 長谷堂<br>(単独)             | RC造3階<br>戸数:53戸 |                 |     |            | ■ H27.3完成       |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | オ みどり町<br>(1・2工区)<br>(単独) | RC造6階<br>戸数:97戸 |                 |     |            |                 | ■ H27.11完成 |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | カ みどり町<br>(3工区)<br>(単独)   | RC造6階<br>戸数:50戸 |                 |     |            |                 | ■ H28.3完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | キ 平林<br>(単独)              | RC造4階<br>戸数:55戸 |                 |     |            |                 | ■ H28.3完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | 設計・施工<br>一括選定             | ク 綾里<br>(単独)    | RC造3階<br>戸数:30戸 |     |            |                 | ■ H27.2完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 |                           | ケ 沢田<br>(単独)    | RC造3階<br>戸数:20戸 |     |            |                 |            | ■ H27.12完成 |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          | コ 下館下<br>(単独)   | RC造7階<br>戸数:58戸 |                           |                 |                 |     |            |                 | ■ H28.9完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          | 直接建設            | 市               | サ 田中東団地①<br>(単独)          | 木造2階<br>戸数:12戸  |                 |     | ■ H25.3完成  |                 |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | シ 田中東団地②<br>(単独)          | 木造2階<br>戸数:7戸   |                 |     | ■ H26.3完成  |                 |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ス 泊里団地<br>(単独)            | 木造平屋<br>戸数:6戸   |                 |     |            |                 | ■ H28.3完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | セ 崎浜団地<br>(単独)            | 木造平屋<br>戸数:8戸   |                 |     |            |                 | ■ H28.3完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ソ 浦浜杉下団地<br>(単独)          | 木造平屋<br>戸数:9戸   |                 |     |            |                 | ■ H28.3完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | タ 中赤崎<br>後ノ入団地<br>(単独)    | 木造平屋<br>戸数:4戸   |                 |     |            |                 | ■ H28.3完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | チ 盛中央<br>(単独)             | RC造5階<br>戸数:44戸 |                 |     | ■ H24.12完成 |                 |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ツ 上山団地<br>(単独)            | RC造3階<br>戸数:11戸 |                 |     |            | ■ H26.4完成       |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | テ 赤沢団地<br>(単独)            | RC造5階<br>戸数:23戸 |                 |     |            | ■ H26.6完成       |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ト 平林団地<br>(単独)            | RC造3階<br>戸数:11戸 |                 |     |            | ■ H26.4完成       |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ナ 宇津野沢団地<br>(単独)          | RC造3階<br>戸数:20戸 |                 |     |            | ■ H26.5完成       |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ニ 蛸ノ浦団地<br>(単独)           | RC造3階<br>戸数:14戸 |                 |     |            |                 | ■ H27.5完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ヌ 浦浜所通団地<br>(単独)          | RC造3階<br>戸数:20戸 |                 |     |            |                 | ■ H27.11完成 |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ネ 中赤崎<br>山口団地<br>(単独)     | RC造3階<br>戸数:13戸 |                 |     |            |                 | ■ H28.4完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
|                          |                 |                 | ノ 中赤崎<br>大洞団地<br>(単独)     | 木造<br>戸数:9戸     |                 |     |            |                 | ■ H28.3完成  |            |                      |     |     |     |       |  |  |
| ハ 川原<br>(単独)             |                 |                 | RC造3階<br>戸数:29戸           |                 |                 |     |            | ■ H27.5完成       |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |
| ヒ 区画整理地区<br>(区:大船渡駅周辺地区) | RC造5階<br>戸数:50戸 |                 |                           |                 |                 |     | ■ H28.7完成  |                 |            |            |                      |     |     |     |       |  |  |







社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市5/5】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

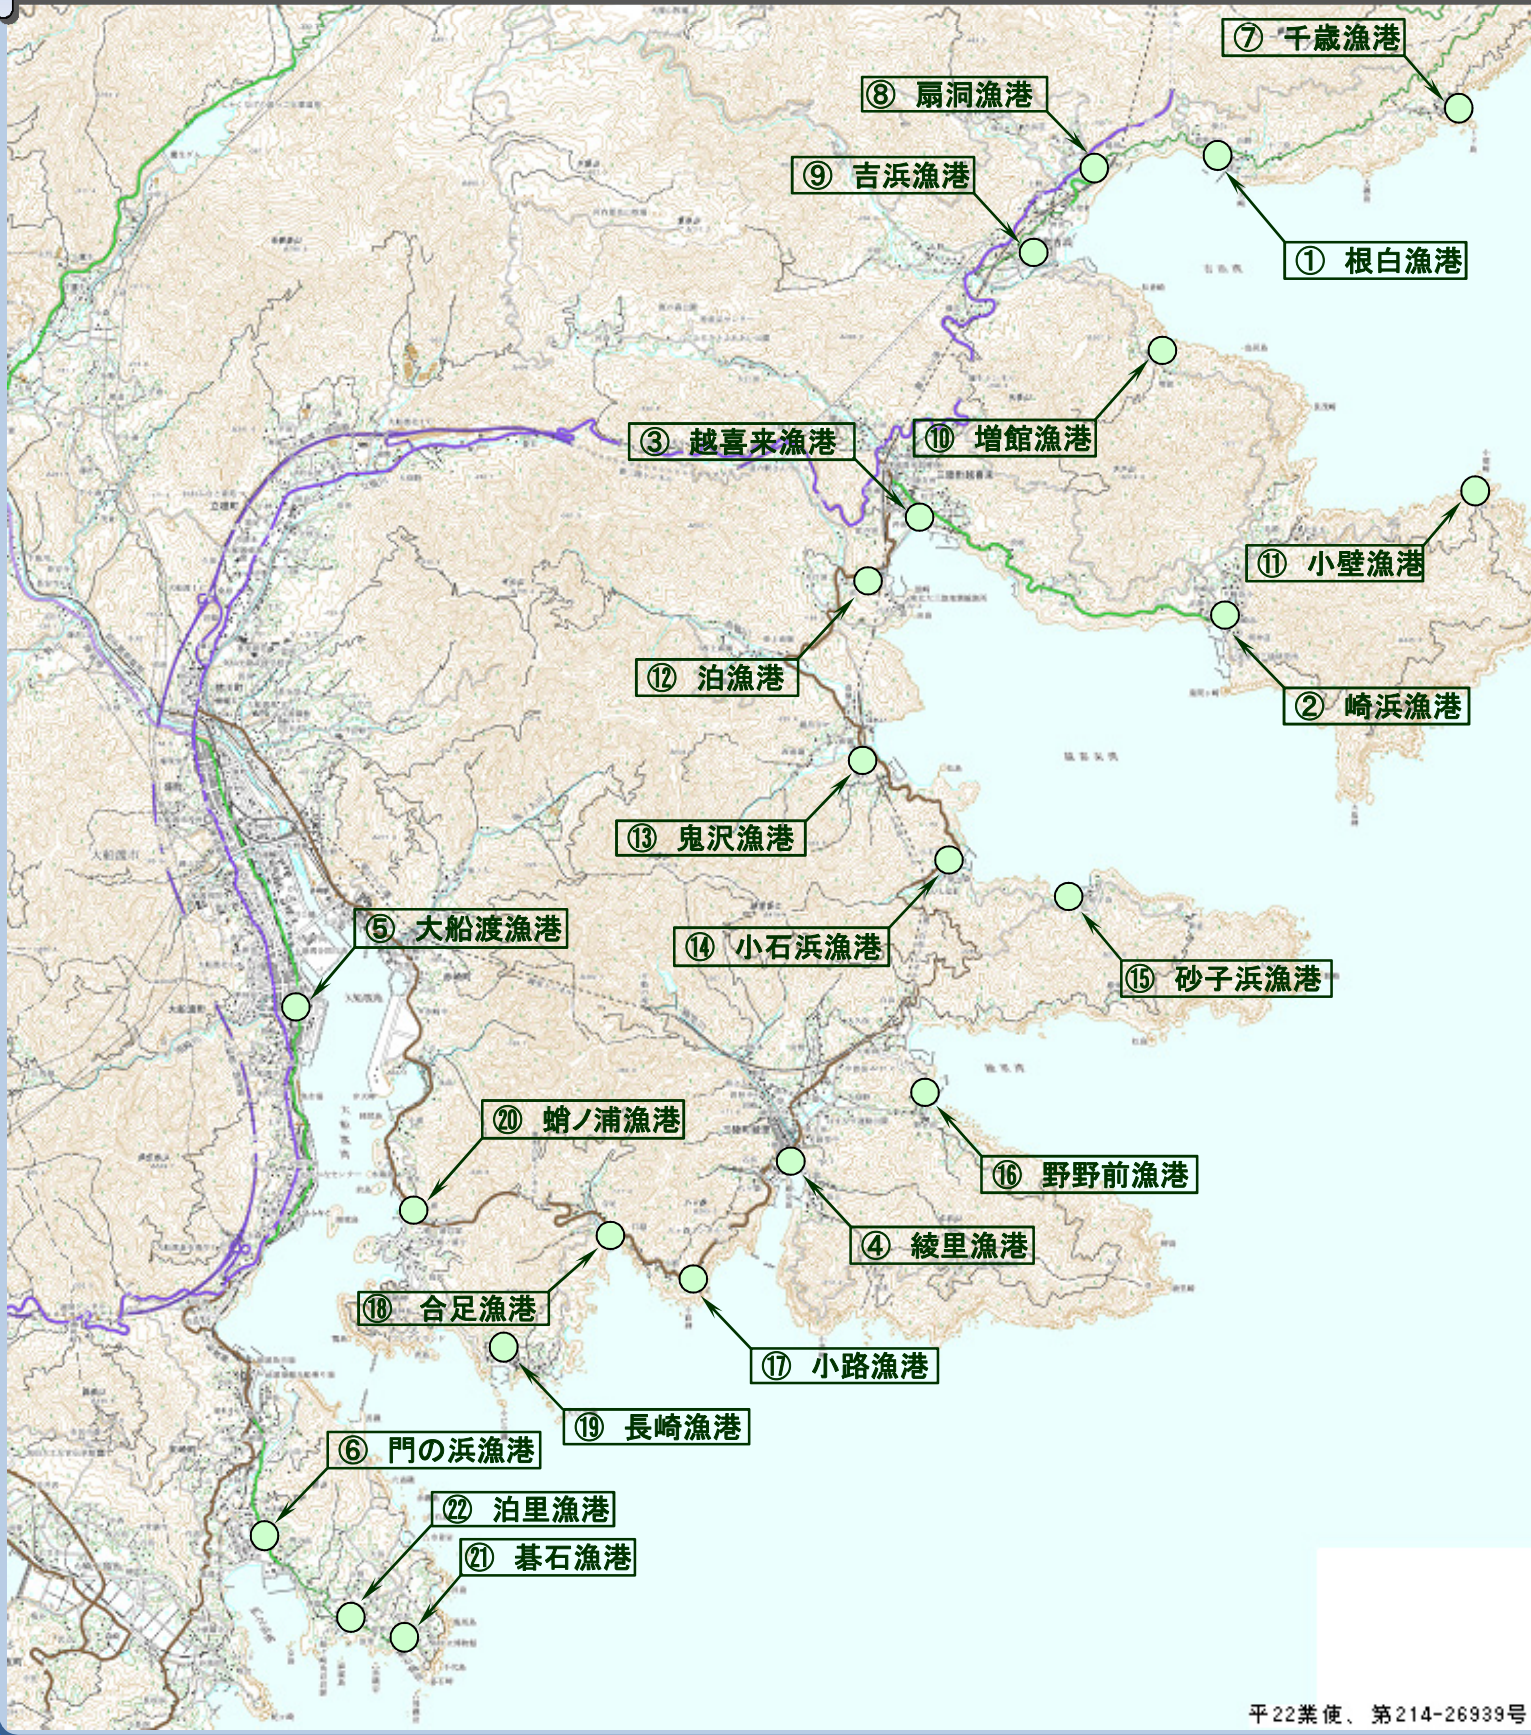


| 分野区分 | 細分項目等 | 事業主体 | 路線・箇所名等 | 事業概要                                   | 年度別整備スケジュール  |     |           |                 |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|------|-------|------|---------|--|--|-----|-----------|-----------------|----------|----------|----------------------|-----|-----|-----|-------|--|--|
|      |       |      |         |  | 第1期<br>(基盤復興期間)  |     |           | 第2期<br>(本格復興期間) |          |          | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |     | 国復興期間 |  |  |
|      |       |      |         |  | H23  | H24 | H25       | H26             | H27      | H28      | H29                  | H30 | H31 | H32 |       |  |  |
| 漁 港  | 漁 港   | 県    | ① 根白漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=748m、<br>岸壁L=638m 他     |  |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ② 崎浜漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=721m、<br>岸壁L=827m 他     |  |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ③ 越喜来漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=580m、<br>岸壁L=436m 他     |  |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ④ 綾里漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=402m、<br>岸壁L=1,102m 他   |  |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑤ 大船渡漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=1,263m、<br>岸壁L=3,512m 他 |  |     |           |                 | ■H29.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑥ 門の浜漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=907m、<br>岸壁L=575m 他     |  |     |           |                 | ■H28.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       | 市    | ⑦ 千歳漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=212m、<br>岸壁L=108m 他     | <br>     |     |           |                 |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑧ 扇洞漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=125m、<br>岸壁L=23m 他      | ■H26.3完成   |     |           |                 |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑨ 吉浜漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=223m、<br>岸壁L=185m 他     |  |     |           |                 | ■H28.5完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑩ 増館漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=137m、<br>岸壁L=15m 他      |  |     |           |                 |          | ■H29.8完成 |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑪ 小壁漁港  | (漁港災害)<br>岸壁L=44m 他                    |  |     | ■H27.3完成  |                 |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑫ 泊漁港   | (漁港災害)<br>防波堤L=283m、<br>岸壁L=202m 他     |  |     |           | ■H28.3完成        |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑬ 鬼沢漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=329m、<br>岸壁L=209m 他     |  |     | ■H26.12完成 |                 |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑭ 小石浜漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=422m、<br>岸壁L=239m 他     |  |     |           | ■H28.3完成        |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑮ 砂子浜漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=176m、<br>岸壁L=247m 他     |  |     |           |                 | ■H28.6完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑯ 野野前漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=781m、<br>岸壁L=484m 他     | <br> |     |           |                 |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑰ 小路漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=162m、<br>岸壁L=65m 他      |  |     |           | ■H27.9完成        |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑱ 合足漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=81m、<br>岸壁L=45m 他       |  |     |           | ■H27.10完成       |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑲ 長崎漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=482m、<br>岸壁L=475m 他     |  |     |           |                 | ■H29.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ⑳ 蛸ノ浦漁港 | (漁港災害)<br>防波堤L=239m、<br>岸壁L=972m 他     |  |     |           |                 | ■H29.3完成 |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ㉑ 碁石漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=123m、<br>岸壁L=104m 他     |  |     | ■H27.3完成  |                 |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |
|      |       |      | ㉒ 泊里漁港  | (漁港災害)<br>防波堤L=211m、<br>岸壁L=248m 他     |  |     |           | ■H28.3完成        |          |          |                      |     |     |     |       |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市1/4】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

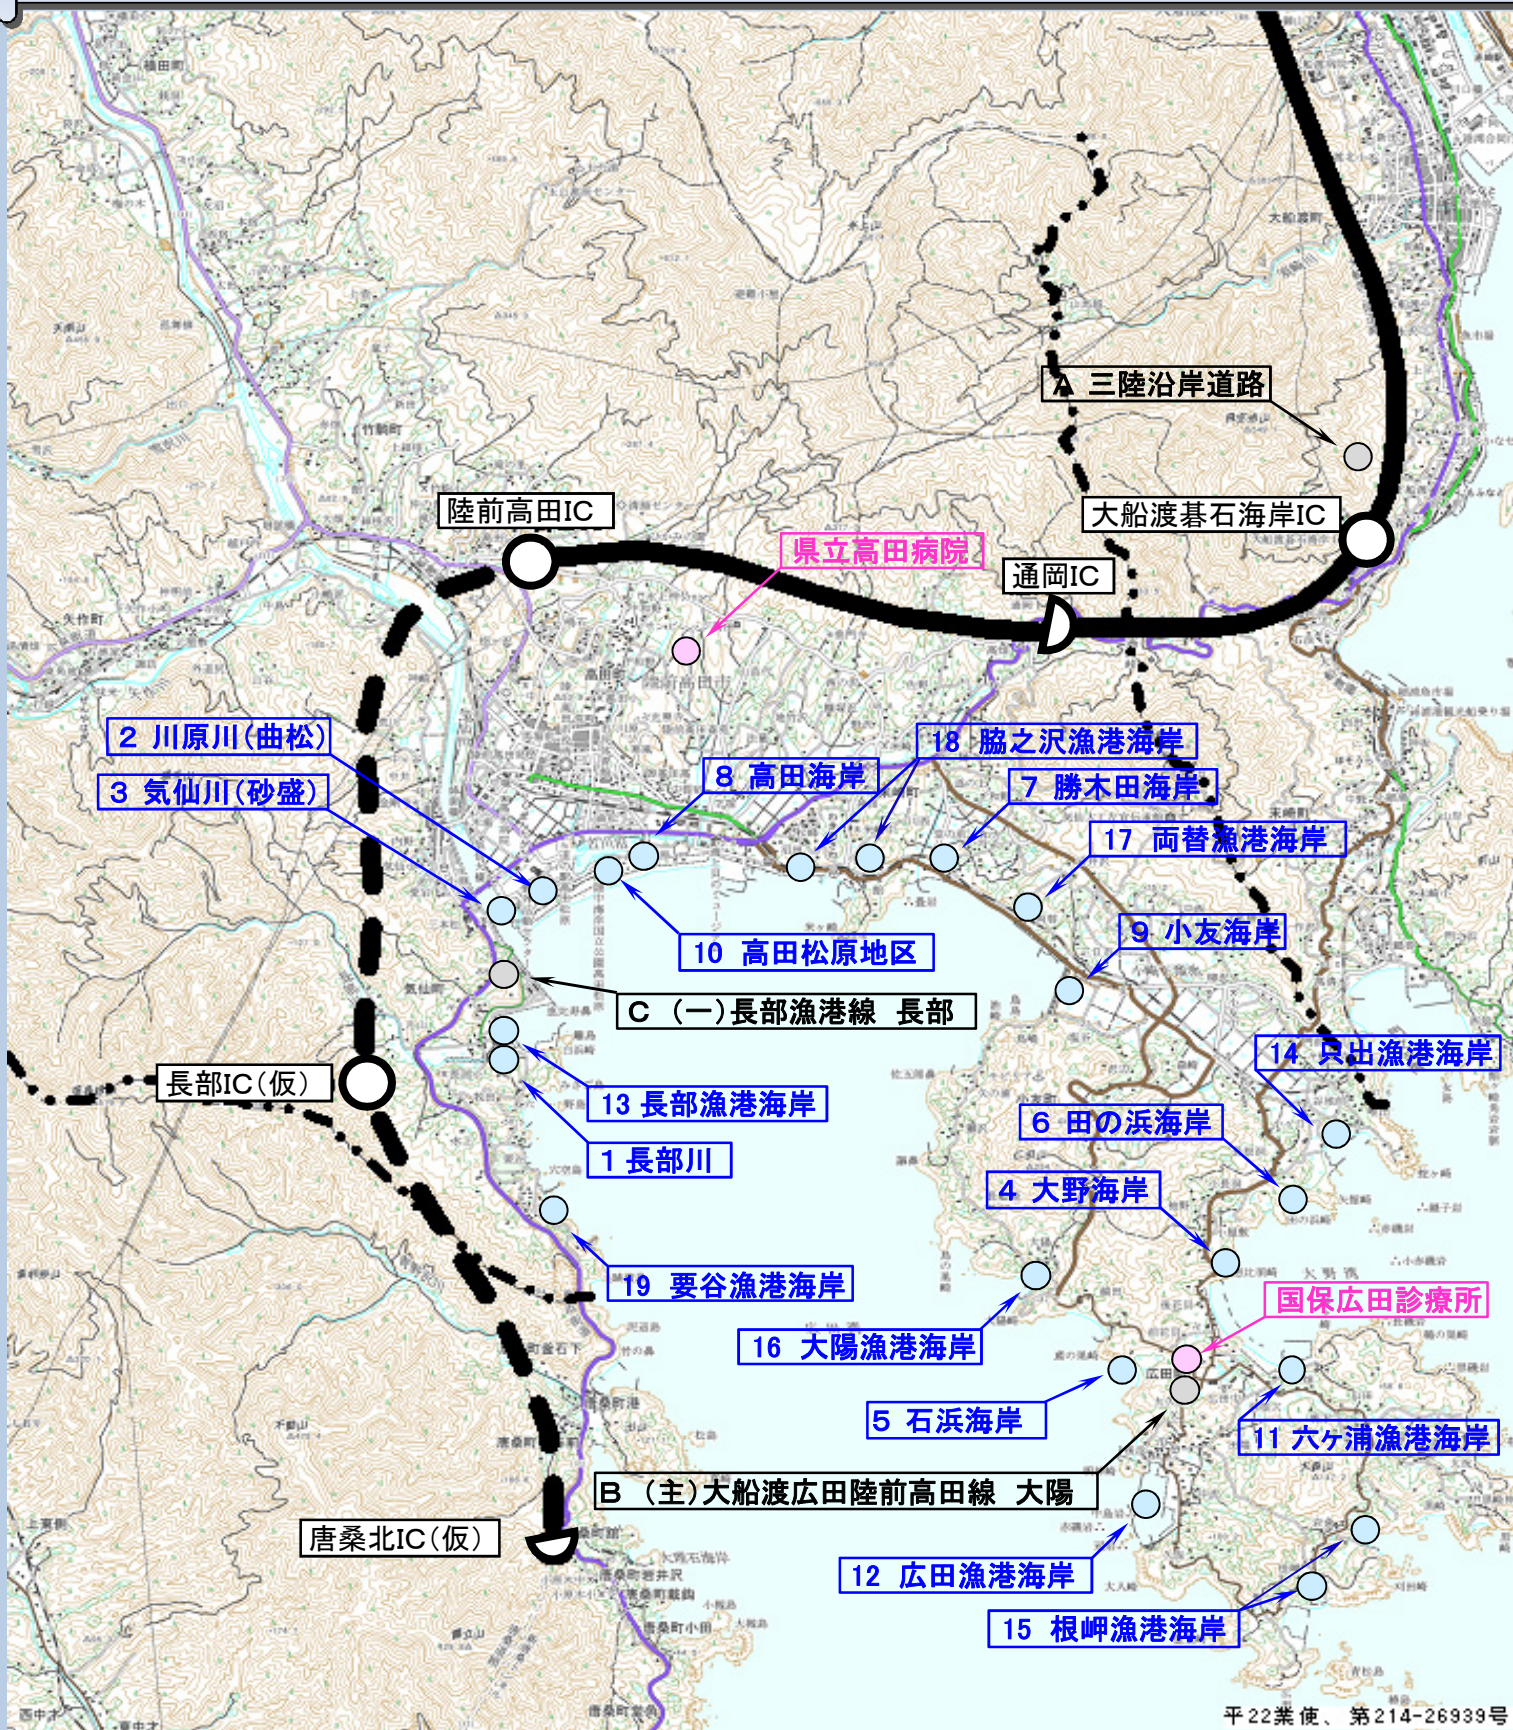


| 分野区分   |        | 細分項目等     |   | 事業主体  | 路線・箇所名等       | 事業概要                          | 年度別整備スケジュール     |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|--------|--------|-----------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------|--|
|        |        |           |   |   |               |                               | 第1期<br>（基盤復興期間） |          |           | 第2期<br>（本格復興期間） |     |     | 第3期<br>（更なる展開への連結期間） |     |     | 国復興期間 |  |
|        |        |           |   |   |               |                               | H23             | H24      | H25       | H26             | H27 | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32   |  |
| 海岸保全施設 | 一般海岸   | 県         | 1 長部川                                   | （三陸高潮）<br>水門N=1基他                             | 用地、設計等        | ★工事                           |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 2 川原川（曲松）                               | （災害復旧）<br>護岸工L=3.4km他                         |               |                               |                 |          |           | ■H29.3完成        |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 3 気仙川（砂盛）                               | （災害復旧）<br>水門N=1基                              |               | ★工事                           |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 4 大野海岸                                  | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.6km、<br>離岸堤L=0.3km他          | 用地、設計等        | ★工事                           |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 5 石浜海岸                                  | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.2km、<br>離岸堤L=0.12km他         | ■H26.3完成      |                               |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 6 田の浜海岸                                 | （災害復旧）<br>護岸工L=0.04km、<br>消波工L=0.02km他        | ■H25.1完成      |                               |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 7 勝木田海岸                                 | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.6km他                         |               |                               |                 | ■H28.3完成 |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 8 高田海岸                                  | （災害復旧）<br>防潮堤L=3.9km、<br>水門N=1基、人工リーフL=1.2km他 |               |                               |                 |          | ■H28.12完成 |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        | 農地海岸   | 9 小友海岸    | （海岸保全施設災害）<br>防潮堤L=0.6km<br>水門等N=3基     | 用地、設計等  | ★工事           |                               |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        | 林野海岸   | 10 高田松原地区 | （治山施設災害）<br>（防災林造成）<br>防潮林林帯（地盤）L=1.3km | 用地、設計等  | ★工事           |                               |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        | 漁港海岸   | 市         | 11－1 六ヶ浦漁港海岸                            | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.6km、<br>水門N=2基               | 用地、設計等        | ★工事                           |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 11－2 六ヶ浦（本港地区）                          | （海岸高潮）<br>防潮堤L=0.2km                          |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 12－1 広田漁港海岸                             | （災害復旧）<br>防潮堤L=1.1km、<br>水門N=10基              |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 12－2 広田（後浜地区）                           | （海岸高潮）<br>防潮堤L=0.2km                          |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 13 長部漁港海岸                               | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=3基               |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 14 只出漁港海岸                               | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.9km、<br>水門N=1基               |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 15 根岬漁港海岸                               | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.5km                          |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 16 大陽漁港海岸                               | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.2km、<br>水門N=1基               |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 17 両替漁港海岸                               | （災害復旧）<br>防潮堤L=0.7km、<br>水門N=2基               |               | 用地、設計等                        | ★工事             |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
| 復興道路等  | 復興関連道路 | 国         | A 三陸沿岸道路                                | 高田道路  | ■H26.3.23供用開始 | ★用地買収、工事等                     |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | 唐桑高田道路<br>（唐桑北～陸前高田）                    |   | ◆H25.2.6起工式   |                               |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
| 医療     | 病院     | 県         | B（主）大船渡広田陸前高田線                          | 大陽  |               | ★用地買収等を行い、順次工事に着手<br>◆H27.6着工 |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
|        |        |           | C（一）長部漁港線                               | 長部  | ■H24.8.24供用開始 |                               |                 |          |           |                 |     |     |                      |     |     |       |  |
| 医療     | 医科診療所  | 市         | 国保広田診療所                                 | 診療所施設整備                                       |               |                               |                 |          |           |                 |     |     | ■H29.6完成             |     |     |       |  |



**基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）**

| 分野区分                        | 細分項目等                        | 事業主体 | 路線・箇所名等                                  | 事業概要  | 年度別整備スケジュール     |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       | 国復興期間 |  |
|-----------------------------|------------------------------|------|--|---|-----------------|-----|-----|-----------------|------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                             |                              |      |  |   | 第1期<br>(基盤復興期間) |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |      |       | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  |   | H23             | H24 | H25 | H26             | H27  | H28   | H29                  | H30   | H31   | H32   |       |       |       |  |
| 復興<br>まちづくり                 | 土地区画整理                       | 市    | a 高田地区                                   | 区域面積:186.1ha<br>対象戸数1,106戸<br>(民986戸・公120戸) |                 |     |     | 公120戸           | 民86戸 | 民127戸 |                      |       | 民252戸 | 民449戸 | 民62戸  | 民10戸  |       |  |
|                             |                              |      |  |   | 用地、設計等          |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | b 今泉地区                       |      | 区域面積:112.4ha<br>対象戸数548戸<br>(民474戸・公74戸) |   |                 |     |     |                 | 公74戸 |       |                      | 民200戸 |       | 民52戸  | 民108戸 | 民109戸 |       |  |
|                             |                              |      |  | 用地、設計等                                      |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | c 高田北地区                      |      | (西区)<br>区域面積:9.6ha<br>(東区)<br>区域面積:9.1ha |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | d 高田南地区                      |      | 区域面積:19.9ha                              |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | e 長部地区<br>(月山)               |      | 対象戸数:50戸<br>(民50戸)                       |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | f 長部地区<br>(上長部)              |      | 対象戸数:17戸<br>(民17戸)                       |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | g 長部地区<br>(双六)               |      | 対象戸数:12戸<br>(民12戸)                       |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | h 長部地区<br>(要谷)               |      | 対象戸数:7戸<br>(民7戸)                         |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | i 長部地区<br>(福伏)               |      | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)                         |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | j 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(下矢作) |      | 対象戸数:6戸<br>(民6戸)                         |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | k 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(館)   |      | 対象戸数:8戸<br>(民8戸)                         |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             | l 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(下沢)  |      | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)                         |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              |      |  | ★工事   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| m 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(高田) | 対象戸数:66戸<br>(民66戸)           |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| n 矢作・竹駒・<br>高田・今泉地区<br>(今泉) | 対象戸数:65戸<br>(民65戸)           |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| o 米崎地区<br>(堂の前)             | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)             |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| p 米崎地区<br>(脇の沢)             | 対象戸数:69戸<br>(民69戸)           |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| q 小友地区<br>(両替)              | 対象戸数:14戸<br>(民14戸)           |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| r 小友地区<br>(三日市)             | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)             |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| s 小友地区<br>(柳沢)              | 対象戸数:9戸<br>(民9戸)             |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| t 小友地区<br>(茂里花)             | 対象戸数:5戸<br>(民5戸)             |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| u 小友地区<br>(新田)              | 対象戸数:7戸<br>(民7戸)             |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
| v 小友地区<br>(只出)              | 対象戸数:11戸<br>(民11戸)           |      |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |
|                             |                              | ★工事  |  |   |                 |     |     |                 |      |       |                      |       |       |       |       |       |       |  |

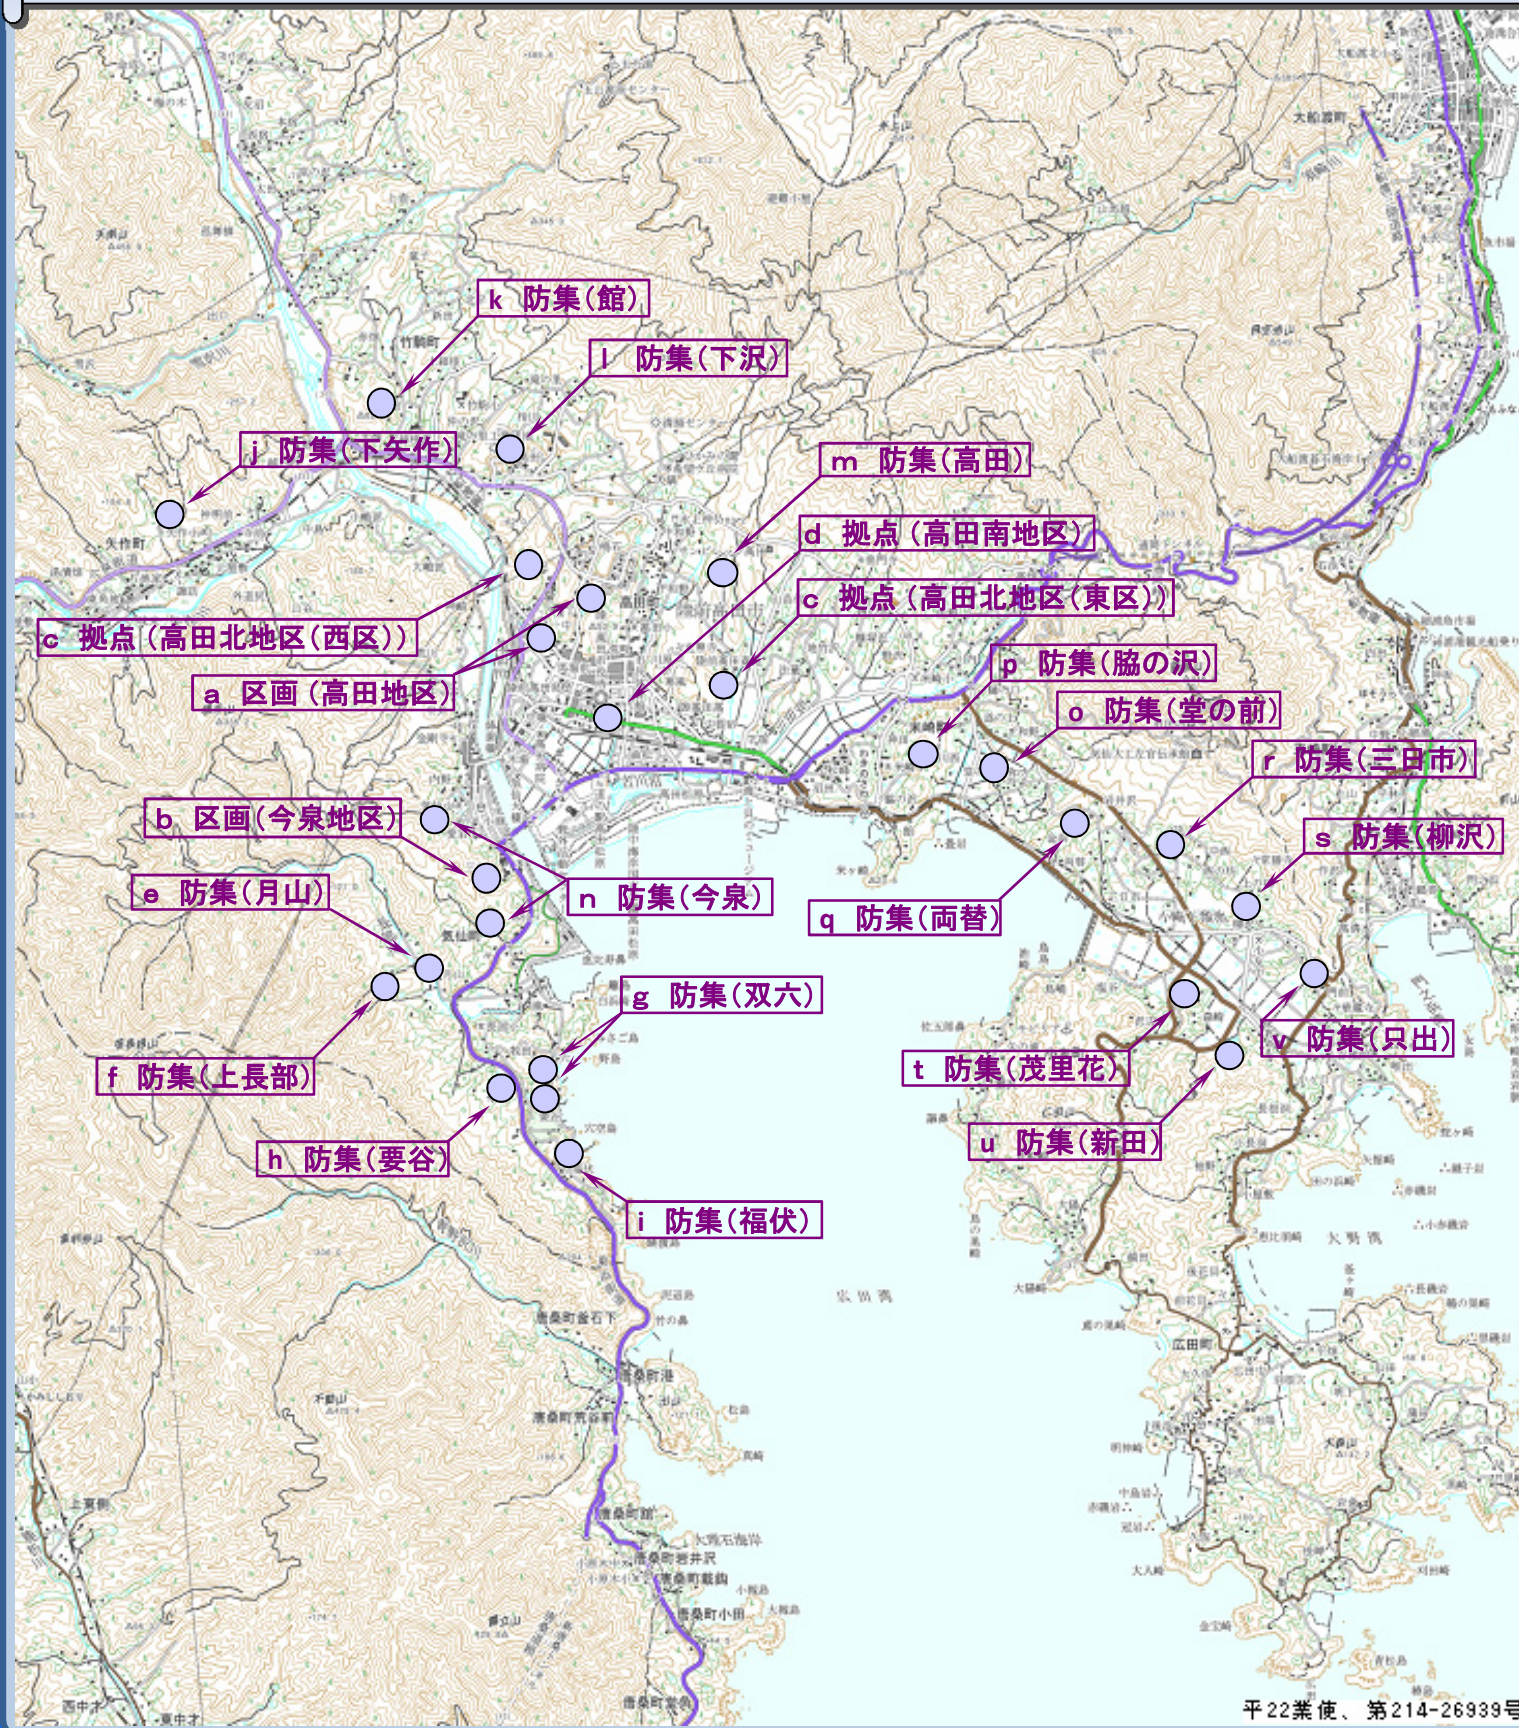




社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市3/4】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

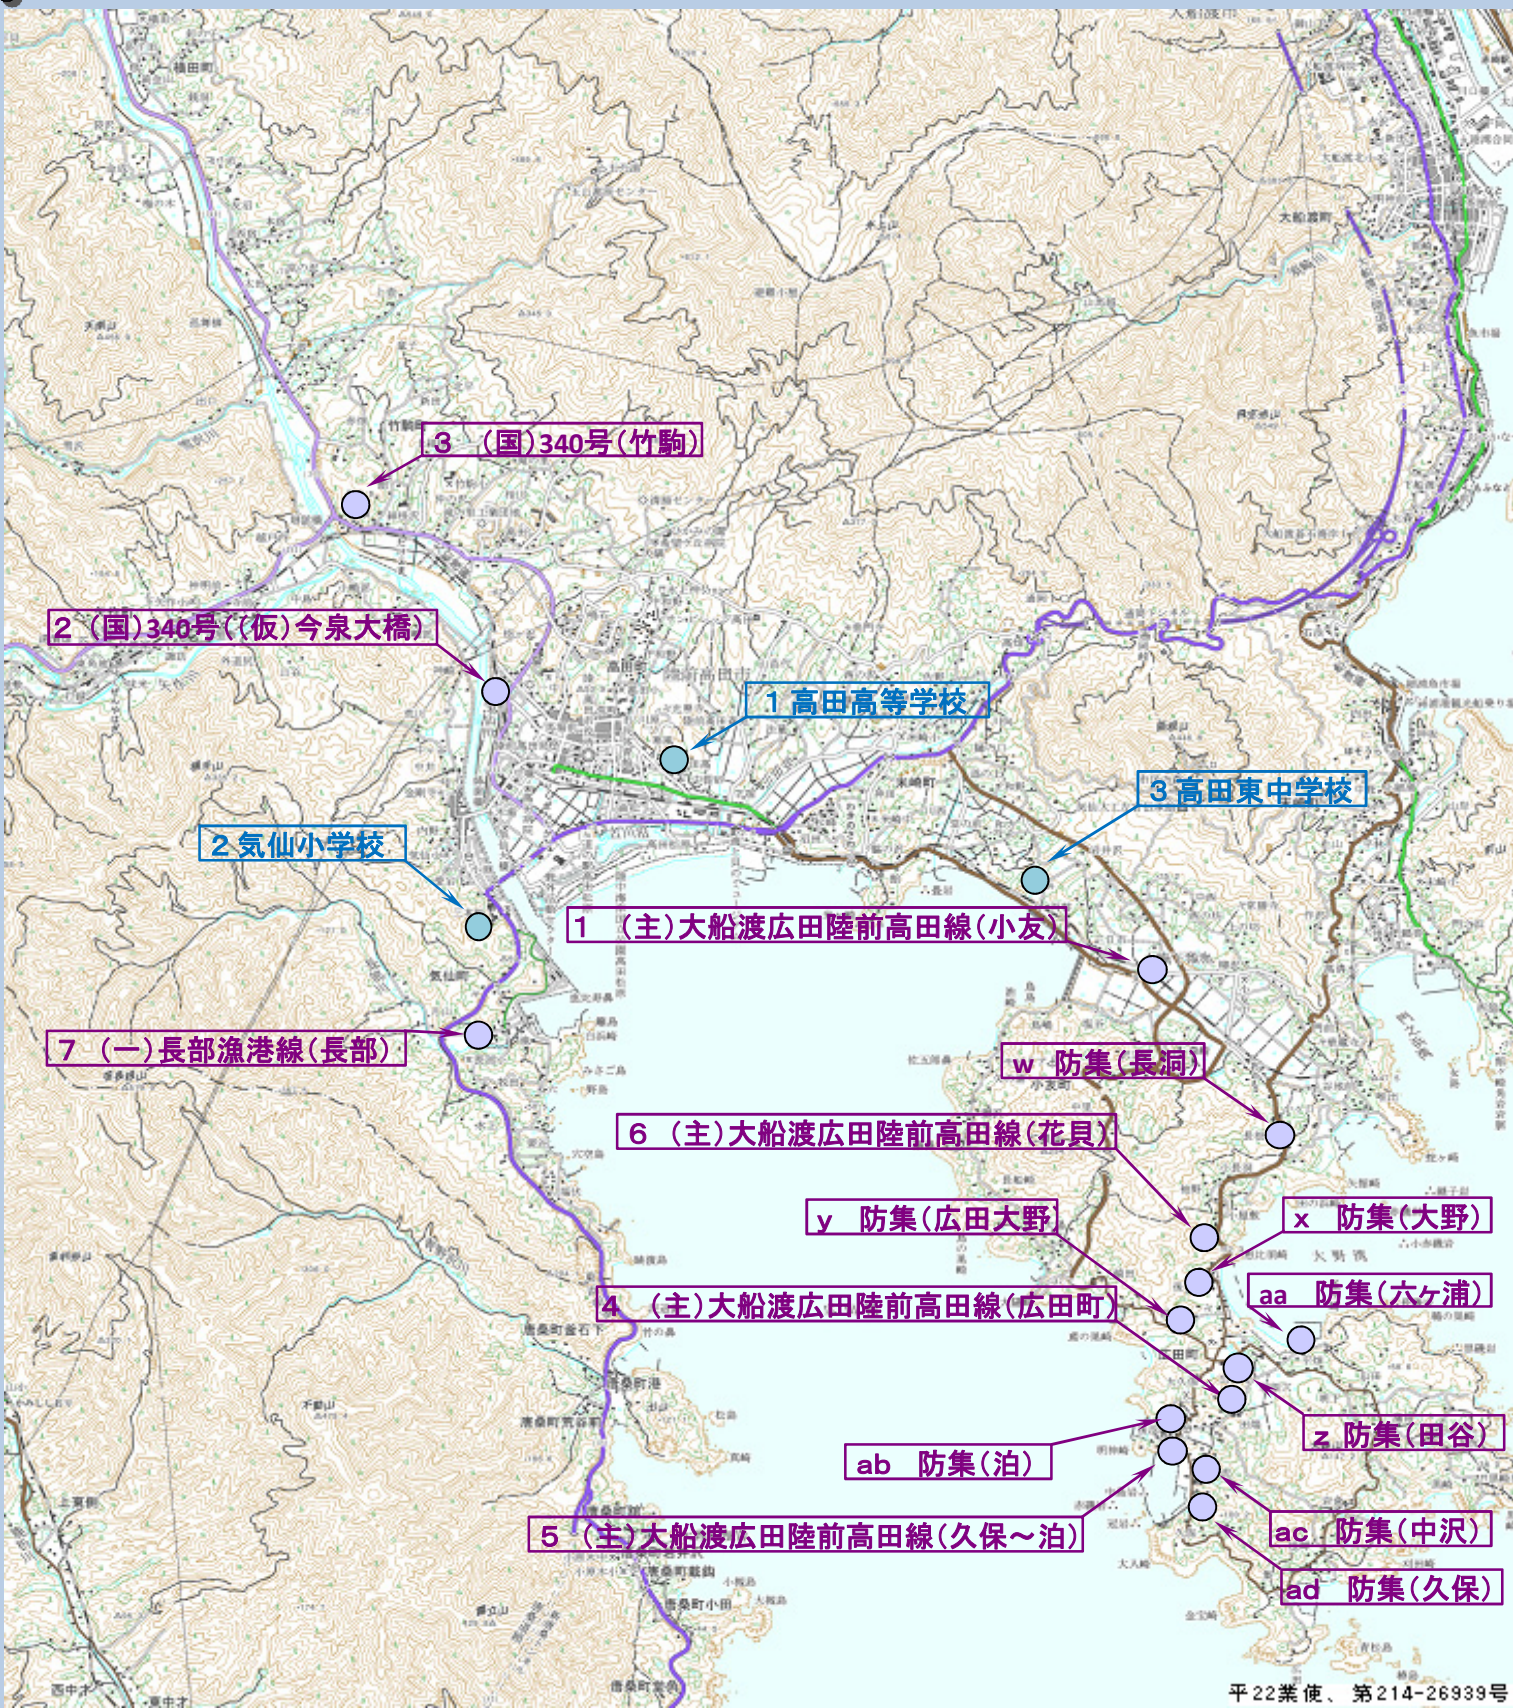


| 分野区分        | 細分項目等         | 事業主体 | 路線・箇所名等             | 事業概要                                     | 年度別整備スケジュール     |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|-------------|---------------|------|---------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------|--|--|--|
|             |               |      |                     |  | 第1期<br>(基盤復興期間) |                                     |                  | 第2期<br>(本格復興期間)       |     |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     | 国復興期間 |  |  |  |
|             |               |      |                     |  | H23             | H24                                 | H25              | H26                   | H27 | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32   |  |  |  |
| 復興<br>まちづくり | 防災集団移転        | 市    | w 広田地区<br>(長洞)      | 対象戸数: 14戸<br>(民14戸)                      |                 |                                     |                  | 民14戸<br>■H26.6完成      |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | x 広田地区<br>(大野)      | 対象戸数: 8戸<br>(民8戸)                        |                 |                                     |                  | 民8戸<br>■H27.2完成       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | y 広田地区<br>(広田大野)    | 対象戸数: 18戸<br>(民18戸)                      |                 |                                     |                  | 民18戸<br>■H27.1完成      |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | z 広田地区<br>(田谷)      | 対象戸数: 34戸<br>(民34戸)                      |                 |                                     |                  | 民34戸<br>■H27.3完成      |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | aa 広田地区<br>(六ヶ浦)    | 対象戸数: 9戸<br>(民9戸)                        |                 |                                     |                  | 民9戸<br>■H26.6完成       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | ab 広田地区<br>(泊)      | 対象戸数: 25戸<br>(民25戸)                      |                 |                                     |                  | 民11戸 民14戸<br>■H27.5完成 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | ac 広田地区<br>(中沢)     | 対象戸数: 9戸<br>(民9戸)                        |                 |                                     | 民9戸<br>■H25.12完成 |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | ad 広田地区<br>(久保)     | 対象戸数: 7戸<br>(民7戸)                        |                 |                                     |                  | 民7戸<br>■H26.7完成       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             | まちづくり<br>連携道路 | 県    | 1 (主)大船渡広田<br>陸前高田線 | 小友                                       |                 | <div>◆H27.3着工</div> <div>★工事</div>  |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 2 (国)340号           | (仮)今泉大橋                                  |                 | <div>◆H28.10着工</div> <div>★工事</div> |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 3 (国)340号           | 竹駒                                       |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 4 (主)大船渡広田<br>陸前高田線 | 広田町                                      |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 5 (主)大船渡広田<br>陸前高田線 | 久保～泊                                     |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 6 (主)大船渡広田<br>陸前高田線 | 花貝                                       |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             |               |      | 7 (一)長部漁港線          | 長部                                       |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
| 教育          | 高等学校          | 県    | 1 高田高等学校            | (災害復旧)<br>校舎、第一体育館、第二体育館・柔剣道場・<br>防災対応施設 |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             | 小学校           | 市    | 2 気仙小学校             | (災害復旧)<br>移転                             |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |
|             | 中学校           |      | 3 高田東中学校            | (災害復旧)<br>移転                             |                 |                                     |                  |                       |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市4/4】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

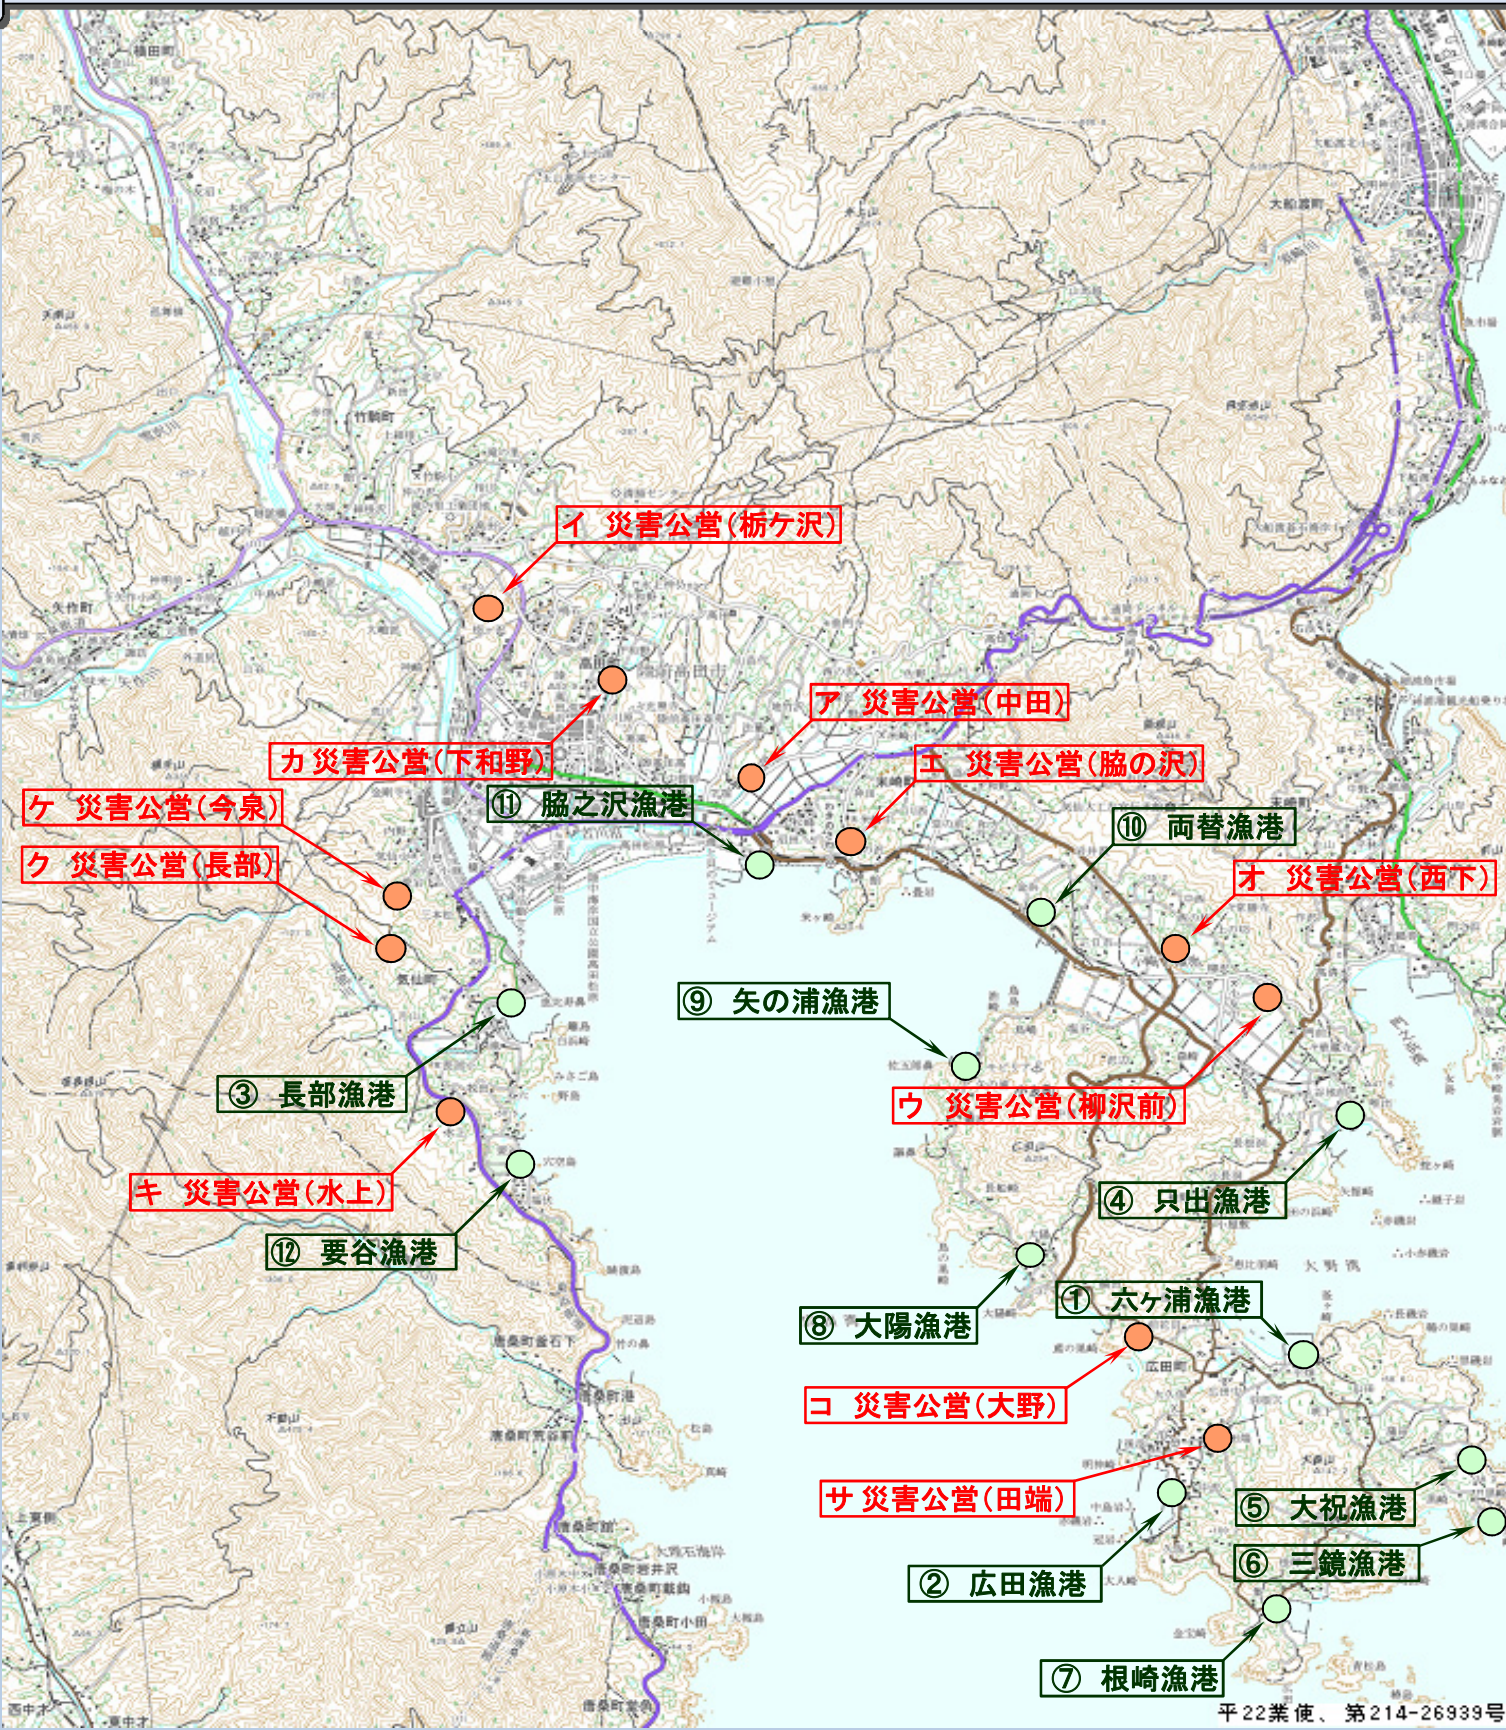


| 分野区分   | 細分項目等            | 事業主体            | 路線・箇所名等       | 事業概要                                 | 年度別整備スケジュール                        |                  |     |                  |                  |                  |                      |  |     |  | 国復興期間 |     |
|--------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|-----|--|-------|-----|
|        |                  |                 |               |                                      | 第1期<br>(基盤復興期間)                    |                  |     | 第2期<br>(本格復興期間)  |                  |                  | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 |               |                                      | H23                                | H24              | H25 | H26              | H27              | H28              | H29                  |  | H30 |  | H31   | H32 |
| 災害公営住宅 | 直接建設             | 県               | ア 中田<br>(単独)  | RC造8階<br>戸数:197戸                     |                                    |                  |     |                  | 197戸<br>■H27.9完成 |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | イ 柄ヶ沢<br>(単独) | RC造9階<br>戸数:301戸                     |                                    |                  |     |                  |                  | 301戸<br>■H28.6完成 |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ウ 柳沢前<br>(単独) | RC造3階<br>戸数:28戸                      |                                    |                  |     | 28戸<br>■H27.3完成  |                  |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | エ 脇の沢<br>(単独) | RC造3階<br>戸数:60戸                      |                                    |                  |     |                  |                  | 60戸<br>■H29.5完成  |                      |  |     |  |       |     |
|        | 設計・施工一括選定        |                 | オ 西下<br>(単独)  | RC造4階<br>戸数:40戸                      |                                    |                  |     | 40戸<br>■H26.12完成 |                  |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | 買取            | 市                                    | カ 下和野<br>(区:高田地区)                  | RC造7階<br>戸数:120戸 |     |                  |                  | 120戸<br>■H26.9完成 |                      |  |     |  |       |     |
|        | キ 水上<br>(単独)     | RC造3階<br>戸数:30戸 |               |                                      |                                    |                  |     | 30戸<br>■H26.12完成 |                  |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        | ク 長部<br>(区:今泉地区) | RC造3階<br>戸数:13戸 |               |                                      |                                    |                  |     |                  | 13戸<br>■H29.3完成  |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        | ケ 今泉<br>(区:今泉地区) | RC造3階<br>戸数:61戸 |               |                                      |                                    |                  |     |                  | 61戸<br>■H29.3完成  |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        | コ 大野<br>(単独)     | RC造3階<br>戸数:31戸 |               |                                      |                                    |                  |     | 31戸<br>■H28.3完成  |                  |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        | サ 田端<br>(単独)     | RC造3階<br>戸数:14戸 |               |                                      |                                    |                  |     | 14戸<br>■H28.3完成  |                  |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        | 漁 港              | 漁 港             | 県             | ① 六ヶ浦漁港                              | (漁港災害)<br>防波堤L=601m、<br>岸壁L=474m 他 |                  |     |                  |                  | ■H28.3完成         |                      |  |     |  |       |     |
| ② 広田漁港 |                  |                 |               | (漁港災害)<br>防波堤L=919m、<br>岸壁L=1,176m 他 |                                    |                  |     |                  | ■H28.3完成         |                  |                      |  |     |  |       |     |
| ③ 長部漁港 |                  |                 |               | (漁港災害)<br>防波堤L=408m、<br>岸壁L=1,180m 他 |                                    |                  |     |                  | ■H28.3完成         |                  |                      |  |     |  |       |     |
| 市      |                  |                 | ④ 只出漁港        | (漁港災害)<br>防波堤L=332m、<br>岸壁L=298m 他   |                                    |                  |     |                  | ■H28.3完成         |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑤ 大祝漁港        | (漁港災害)<br>防波堤L=99m、<br>岸壁L=43m 他     |                                    |                  |     |                  |                  | ■H28.9完成         |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑥ 三鏡漁港        | (漁港災害)<br>防波堤L=14m、<br>岸壁L=36m 他     |                                    |                  |     |                  |                  | ■H28.12完成        |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑦ 根岬漁港        | (漁港災害)<br>防波堤L=354m、<br>岸壁L=150m 他   |                                    |                  |     |                  | ■H28.3完成         |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑧ 大陽漁港        | (漁港災害)<br>防波堤L=332m、<br>岸壁L=79m 他    |                                    |                  |     |                  | ■H28.3完成         |                  |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑨ 矢の浦漁港       | (漁港災害)<br>防波堤L=136m、<br>岸壁L=183m 他   |                                    |                  |     |                  |                  | ■H28.9完成         |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑩ 両替漁港        | (漁港災害)<br>防波堤L=274m、<br>岸壁L=254m 他   |                                    |                  |     |                  |                  | ■H29.1完成         |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑪ 脇の沢漁港       | (漁港災害)<br>防波堤L=1,149m、<br>岸壁L=531m 他 |                                    |                  |     |                  |                  | ■H29.1完成         |                      |  |     |  |       |     |
|        |                  |                 | ⑫ 要谷漁港        | (漁港災害)<br>防波堤L=556m、<br>岸壁L=279m 他   |                                    |                  |     |                  | ■H28.3完成         |                  |                      |  |     |  |       |     |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【その他市町村1/2】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

沿岸12市町村以外の工程表【復興道路・復興支援道路】

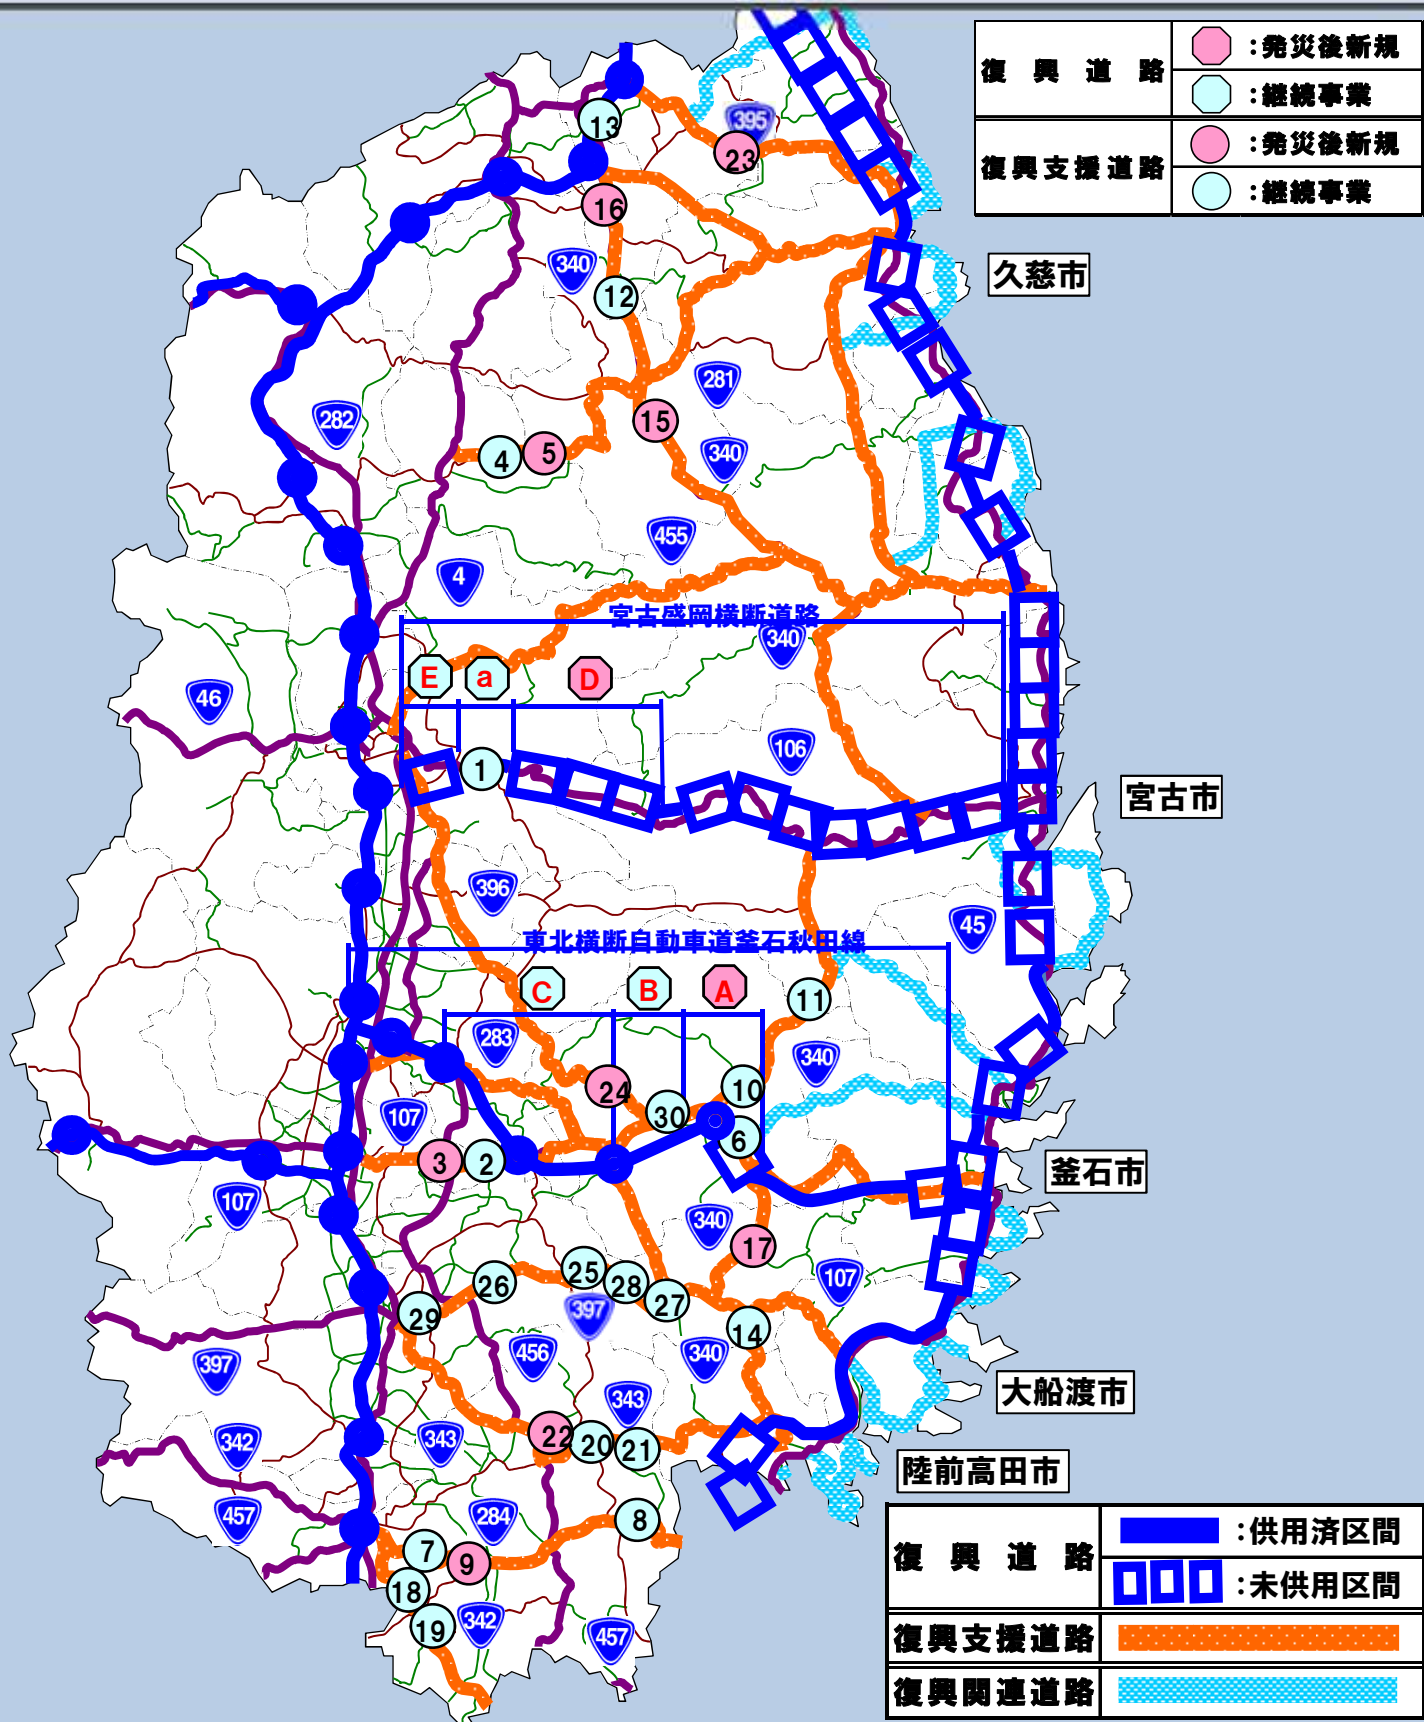


| 区分   | 種 別    | 路線名               | 番号 | 市町村名        | 箇所名               | 年度別整備スケジュール   |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     | 国復興期間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------|--------|-------------------|----|-------------|-------------------|---|-----|-----|-----------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|      |        |                   |    |             |                   | 第1期<br>(基盤復興期間)                                     |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |     |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |        |                   |    |             |                   | H23   | H24 | H25 | H26             | H27 | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 直轄事業 | 復興道路   | 東北横断自動車道<br>釜石秋田線 | A  | 遠野市         | 遠野道路<br>(遠野住田～遠野) | ◆H25.6.16起工式 ★工事                                    |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |        |                   | B  | 遠野市         | 遠野～宮守             |   |     |     | ■H27.12.5供用開始   |     |     |                      |     |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |        |                   | C  | 遠野市<br>～花巻市 | 宮守～東和             | ■H24.11.25供用開始                                      |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |        | 宮古盛岡横断道路          | D  | 宮古市<br>～盛岡市 | 区界道路<br>(区界～築川)   | ◆H26.8.24起工式 ★用地買収、工事等                              |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |        |                   | E  | 盛岡市         | 都南川目道路            | ★用地買収、工事等<br>※川目IC～田の沢IC H27供用済、田の沢IC～手代森IC H31供用予定 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 県事業  | 復興支援道路 | 宮古盛岡横断道路          | a  | 盛岡市         | 築川道路              | ■H25.3.10供用開始                                       |     |     |                 |     |     |                      |     |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



社会資本の復旧・復興ロードマップ【その他市町村2/2】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

沿岸12市町村以外の工程表【災害公営住宅】

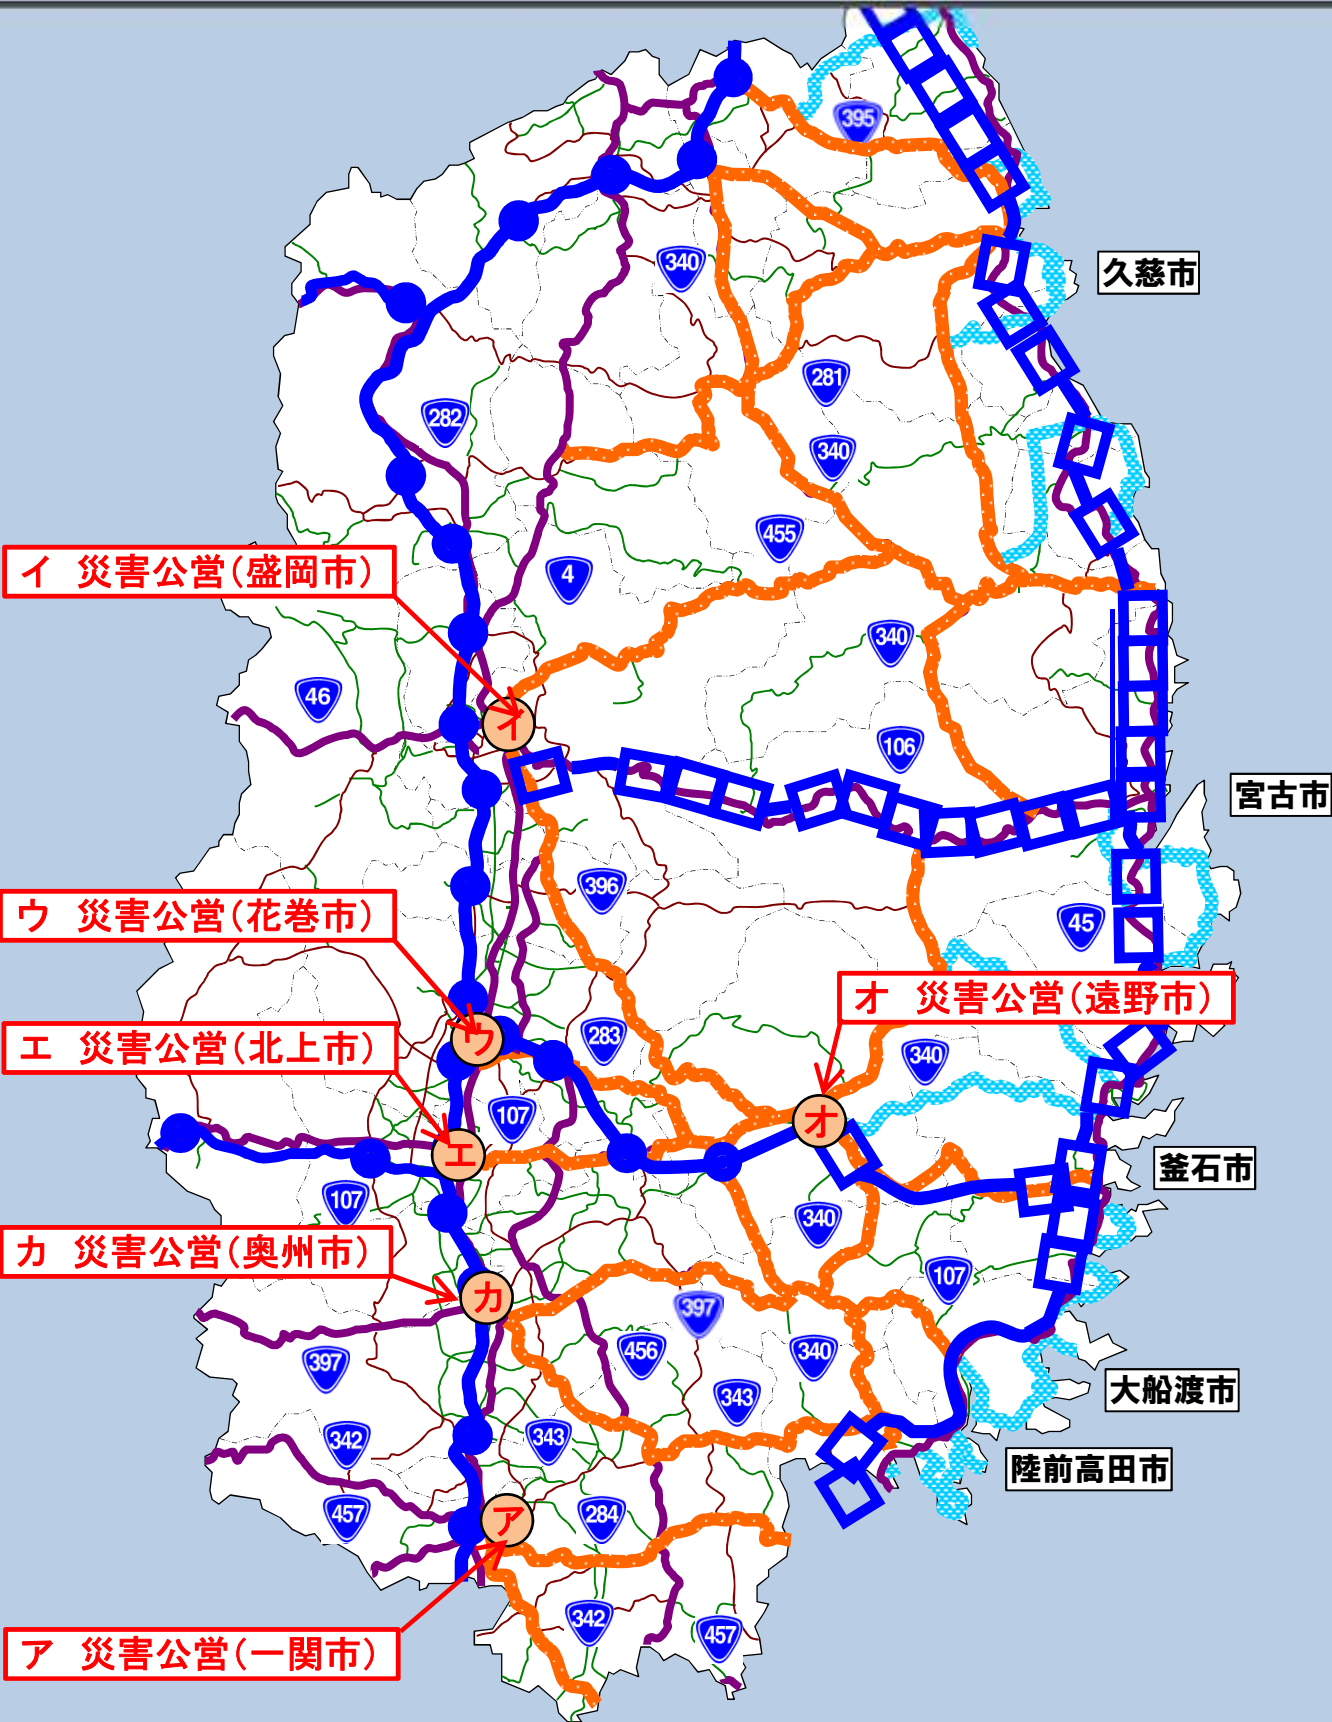

| 分野区分       | 市町村名          | 細分<br>項目等    | 事業<br>主体        | 路線・箇所名等         | 事業概要            | 年度別整備スケジュール     |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|            |               |              |                 |                 |                 | 第1期<br>(基盤復興期間) |     |     | 第2期<br>(本格復興期間) |     |     | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |     |     | 国復興期間 |  |  |  |  |  |
|            |               |              |                 |                 |                 | H23             | H24 | H25 | H26             | H27 | H28 | H29                  | H30 | H31 | H32   |  |  |  |  |  |
| 災害公営<br>住宅 | 一関市           | 直接建設         | 市               | ア 沢内<br>(単独)    | RC造3階<br>戸数:27戸 |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |                 |                 |                 |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              | 県               | ア 駒下<br>(単独)    | RC造<br>戸数:22戸   |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            | ア 構井田<br>(単独) | 木造<br>戸数:13戸 |                 |                 |                 |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            | 盛岡市           | 直接建設         | 県               | イ 備後第1①<br>(単独) | RC造<br>戸数:24戸   |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |                 | イ 備後第1②<br>(単独) | RC造<br>戸数:18戸   |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              | イ 備後第1③<br>(単独) | 木造<br>戸数:8戸     |                 |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            |               | 買取           | イ 南青山<br>(単独)   | 戸数:118戸         |                 |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            | 花巻市           | 直接建設         | 市               | ウ 花巻中央<br>(単独)  | RC造<br>戸数:30戸   |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            | 北上市           | 直接建設         | 県               | エ 黒沢尻<br>(単独)   | 戸数:34戸          |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            | 遠野市           | 直接建設         | 市               | オ 穀町<br>(単独)    | 木造<br>戸数:16戸    |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
|            |               |              |                 | オ 稲荷下<br>(単独)   | 木造<br>戸数:6戸     |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
| 奥州市        | 直接建設          | 県            | カ 桜屋敷<br>(単独)   | 戸数:14戸          |                 |                 |     |     |                 |     |     |                      |     |     |       |  |  |  |  |  |
